

特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘
大規模改修工事

アスベスト含有建材調査報告書

株式会社 平安設計

アスベスト分析結果報告書

特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘
大規模改修実施設計業務委託

2022年10月

栃木県宇都宮市問屋町 3172
株式会社環境公害分析セ
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836



1. 調査概要

1.1 工事件名

特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託

1.2 調査目的

対象建築物に使用されている建材（外壁吹付材など）に、アスベスト※が含有されているか否かを分析し、現状を把握することを目的とする。

※アスベスト・・・本調査で示すアスベストは、クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフイライト、トレモライト、アクチノライトの6種類である。

1.3 調査場所

特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘：東京都北区中十条4-16-32

1.4 調査期間

試料採取日 令和4年9月27日

1.5 調査数量

調査数量は下表のとおりとする。

表1 調査数量

項目	試料採取数	分析検体数
アスベスト含有調査	1検体1箇所又は 1検体3箇所	19検体

1.6 受注者


株式会社 平安設計 代表取締役 伊藤 敦史
東京都北区滝野川 7-2-14 TEL 03-3949-7781

1.7 調査・分析機関

株式会社 環境公害分析センター
栃木県宇都宮市問屋町 3172-85 TEL 028-601-8835
(環境計量(濃度)事業登録：栃木県第26021号)
(作業環境環境測定機関 第9-18号)

アスベスト測定結果一覧


工事名： 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託					
検体番号	発行番号	試料名	採取場所	判定結果	分析結果(含有率%)
1	YI30055	アスファルトシングル	勾配屋根	含有せず	---
2	NS114031-01Z-1-001	吹付タイル	外壁	含有	クリソタイル
3	YI30056	ポリサルファイドコーキング	外壁目地	含有せず	---
4	YI30057	アスファルト防水	バルコニー 床(5階)	含有せず	---
5	YI30058	耐水岩綿吸音板t12	バルコニー 軒天井	含有せず	---
6	YI30059	ケイ酸カルシウム板	バルコニー 軒天井	含有せず	---
7	NS114031-01Z-1-002	ビニル床シート	地下1階 廊下 床	含有	クリソタイル
8	YI30060	無石綿 ケイ酸カルシウム板t6	地下1階 食品庫 天井	含有せず	---
9	YI30061	バスリブ	地下1階 浴室(女) 天井	含有せず	---
10	YI30062	岩綿吸音板t9	地下1階 会議室 天井	含有せず	---
11	YI30063	木練付無 石綿ケイ酸カルシウム板t4	1階 エントランスホール 壁	含有せず	---
12	NS114031-01Z-1-003	長尺リノリウム	1階 痴呆性デイホーム 床	含有せず	---
13	NS114031-01Z-1-004	多彩吹き付け	階段室 西側 壁	含有	クリソタイル
14	YI30064	保温材	地下1階 機械室 配管	含有せず	---
15	YI30065	フランジパッキン	地下1階 機械室 ダクト	含有せず	---
16	YI30066	配管パッキン	地下1階 機械室 配管	含有せず	---
17	NS114031-01Z-1-005	クッションシート	地下1階 洗面所 床	含有せず	---
18	YI30067	タイル下地材	地下1階 浴室(男) 壁	含有せず	---
19	YI30068	石こうボード	地下1階 会議室 天井	含有せず	---
20					

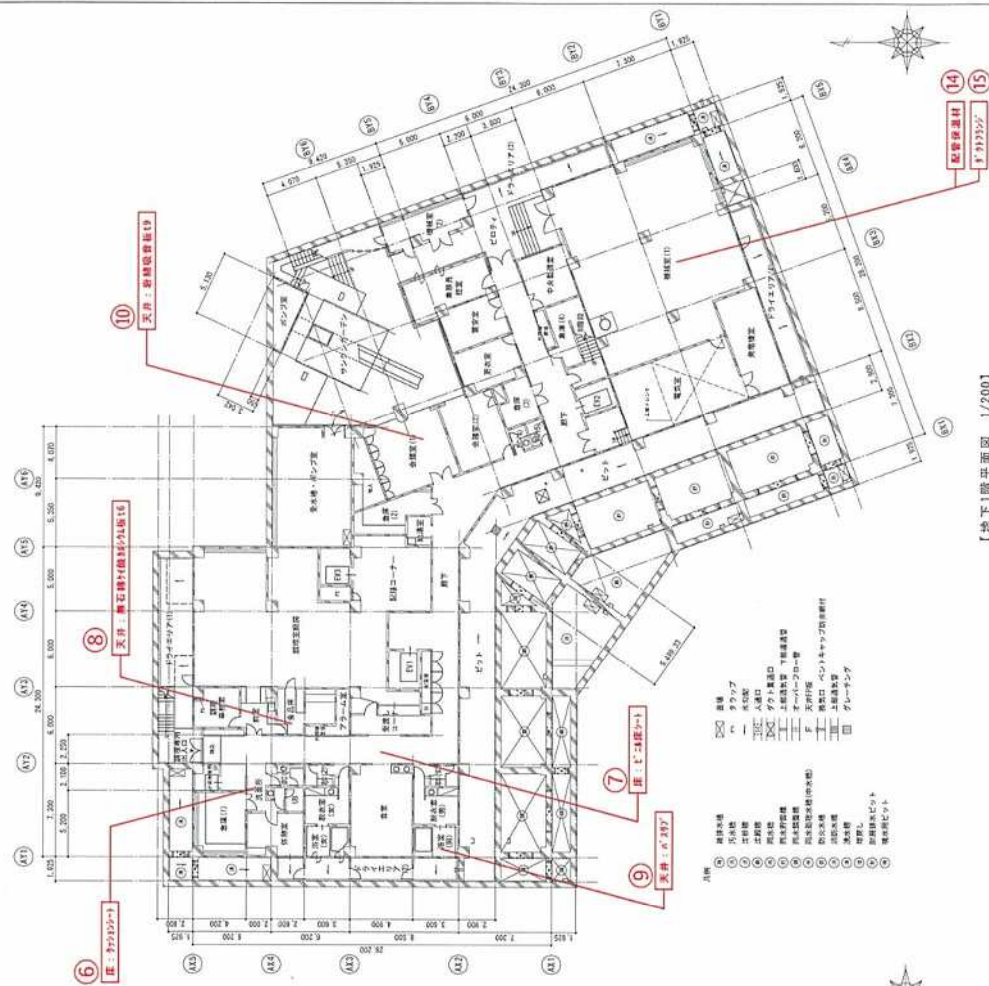[illegible]

13 壁・段差：多彩吹き付け

11 壁・本漆付無垢石目・(樹脂貼付)石目


北

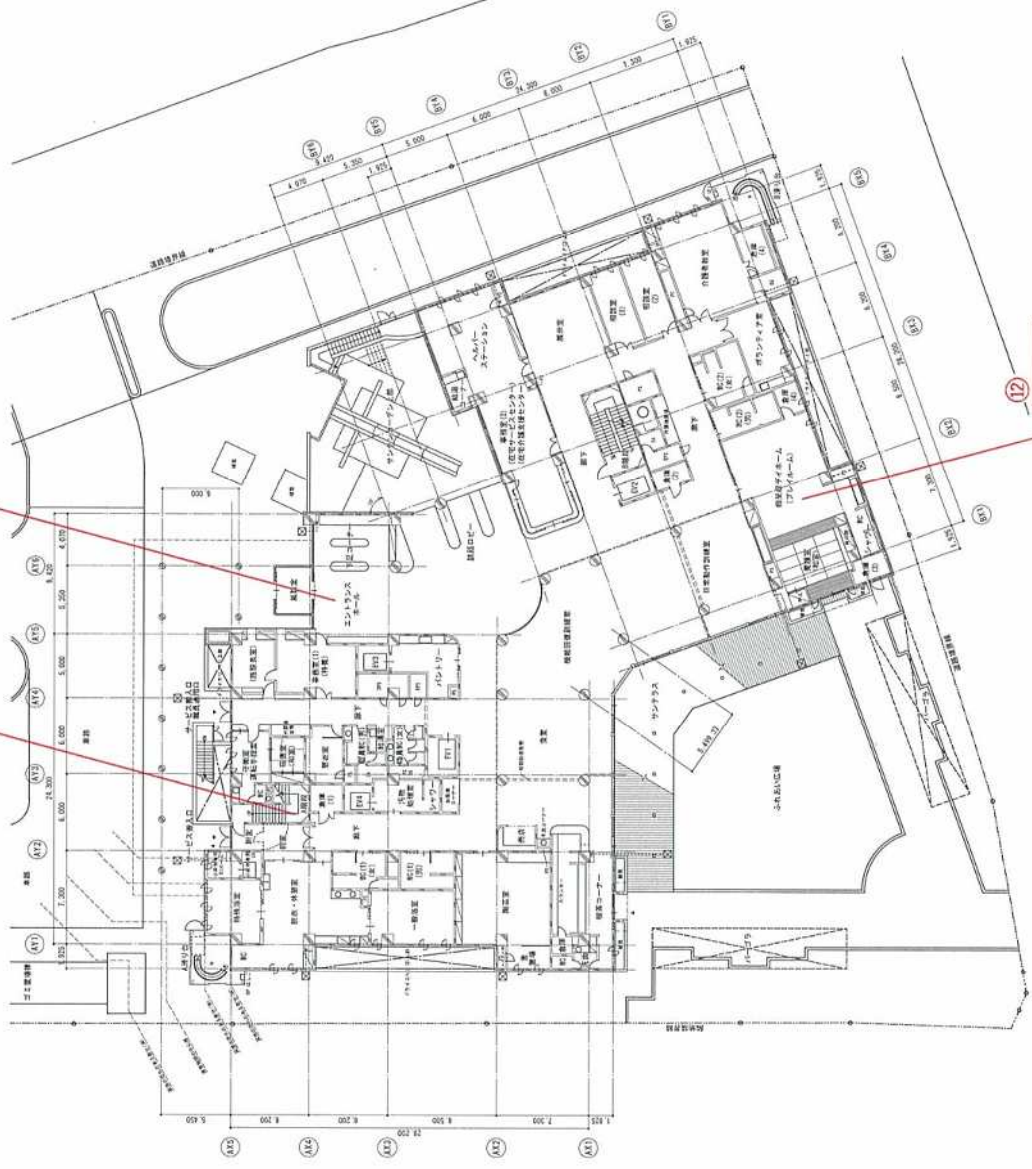

12 床：無垢/竹材

【1階平面図 1/200】

図名	工種名	図番	縮尺	単位	枚数	備考
005	特別鑑別所小一・二階水廻り工事 あじさい社大規模改修工事					
1 階平面図						
図番	縮尺	単位	枚数	備考		
011/200	1/200	A-00				
株式会社 平安設計 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 千代田ビル10F TEL:03-5561-1111 FAX:03-5561-1112 E-MAIL:info@heiankeiki.co.jp						

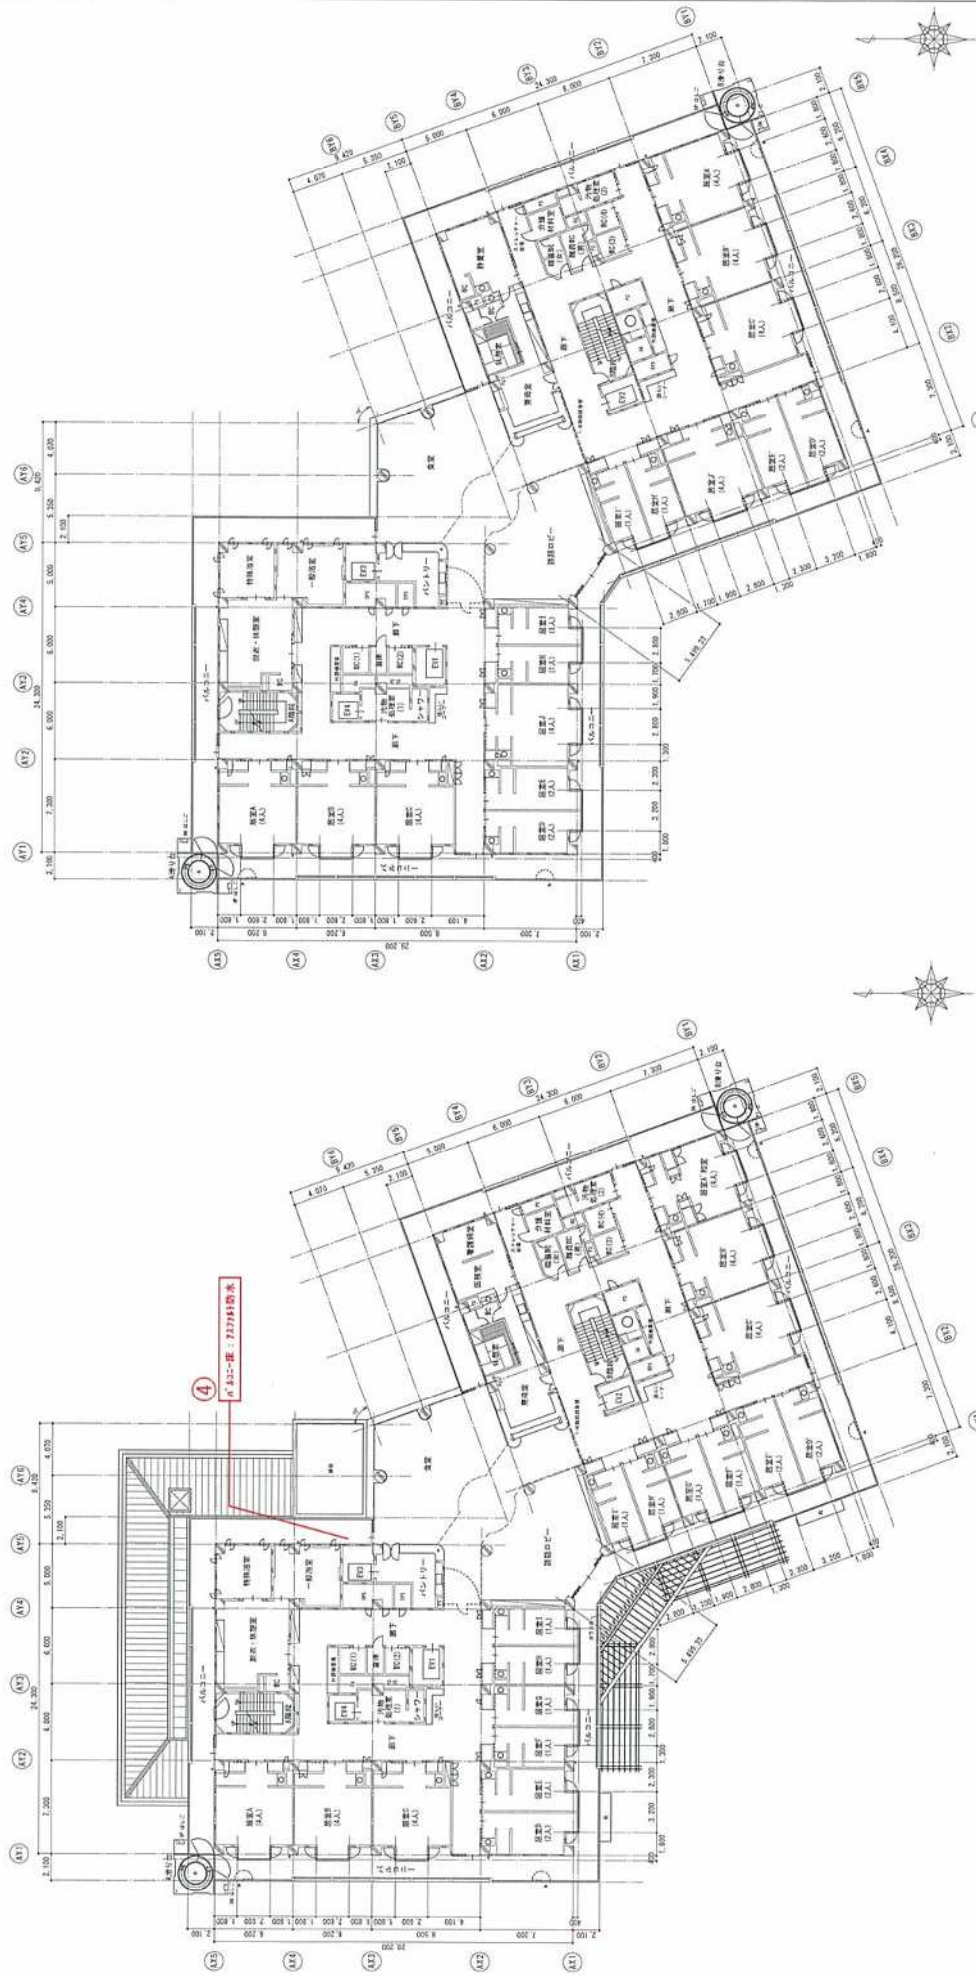

【2階平面図 1/200】

【3階平面図 1/200】

尺例
・ 1000mm

尺例
・ 1000mm

図名	図番	図尺	図式	図注	図号
2階・3階平面図	0011700	AD3/400	1000mm	1000mm	1000mm
2階・3階平面図	0011700	AD3/400	1000mm	1000mm	1000mm
2階・3階平面図	0011700	AD3/400	1000mm	1000mm	1000mm
2階・3階平面図	0011700	AD3/400	1000mm	1000mm	1000mm
2階・3階平面図	0011700	AD3/400	1000mm	1000mm	1000mm
2階・3階平面図	0011700	AD3/400	1000mm	1000mm	1000mm
2階・3階平面図	0011700	AD3/400	1000mm	1000mm	1000mm
2階・3階平面図	0011700	AD3/400	1000mm	1000mm	1000mm
2階・3階平面図	0011700	AD3/400	1000mm	1000mm	1000mm
2階・3階平面図	0011700	AD3/400	1000mm	1000mm	1000mm

005	特別警備本部入ホ一ム用ホ一ム	特別警備本部入ホ一ム用ホ一ム	特別警備本部入ホ一ム用ホ一ム	特別警備本部入ホ一ム用ホ一ム	特別警備本部入ホ一ム用ホ一ム
006	あじさい社大規模改修工事	あじさい社大規模改修工事	あじさい社大規模改修工事	あじさい社大規模改修工事	あじさい社大規模改修工事
007	2階・3階平面図	2階・3階平面図	2階・3階平面図	2階・3階平面図	2階・3階平面図
008	株式会社 平安設計	株式会社 平安設計	株式会社 平安設計	株式会社 平安設計	株式会社 平安設計
009	0011700 AD3/400	0011700 AD3/400	0011700 AD3/400	0011700 AD3/400	0011700 AD3/400
010	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm	1000mm

偏光顕微鏡写真

[備考]

伸長の符号

直交ポーラー+530nm. 鋭敏色検板を挿入して観察したとき、アスベスト繊維を北西～南東方向に向けた状態で以下の符号及び色を示す。

正の符号：オレンジ

負の符号：青

分散色

単ポーラー+分散染色用対物レンズで観察したとき、アスベスト繊維を垂直方向（⊥）に向けた状態で表中の色を示す。

アスベストの光学的性質

	伸長の符号	分散色
クリソタイル	正の符号	屈折率1.550 青（⊥）
アモサイト	正の符号	屈折率1.680 青（⊥）
クロシドライト	負の符号	屈折率1.700 青（⊥）
アンソフィライト	正の符号	屈折率1.605 青（⊥）
トレモライト	正の符号	屈折率1.605 青（⊥）
アクチノライト	正の符号	屈折率1.630 青（⊥）

分析結果報告書

No. YI30055

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県 18号)
栃木県宇都宮市問屋町31-2番地85
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工 事 名 : 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託
採 取 住 所 : 東京都北区中十条4-16-32
採 取 場 所 : 勾配屋根
試 料 名 (種 類) : アスファルトシングル
試 料 採 取 日 : 2022年9月27日
採 取 区 分 : 株式会社 環境公害分析センター

分析実施者

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
アスファルトシングル	アスベスト含有せず

分析方法

方 法 種 類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-2 「試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
---------	---

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
アスファルトシングル	クリソタイル	無	---
	アモサイト	無	---
	クロシドライト	無	---
	アンソフィライト	無	---
	トレモライト/ アクチノライト	無	---

判定基準:0.1%を超えてアスベストを含まないこと

管理番号: 66319

分析内容:試料名(種類): アスファルトシングル

アスベストの種類	ア ス ベ ス ト の 有 無			アスベスト含有の有無の判定	アスベスト含有率
	A. 位相差顕微鏡による分散染色法(※1)		B. X線回折分析法による回折線のアスベストピークの有無(※2)		
クリソタイル	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
アモサイト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
クロシドライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
アンソフィライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
トレモライト/ アクチノライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			

☐ : 選択マーク

※1 別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法参照。


※2 別紙B. X線回折分析法参照。

※3 「4/3000」とは、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストが4繊維状粒子の意味。

別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法 顕微鏡写真(①～③)

No.YI30055

試料名: アスファルトシングル




顕微鏡写真①

・屈折率 : 1.550

(クリソタイル用)

・倍率 : $\times 100$

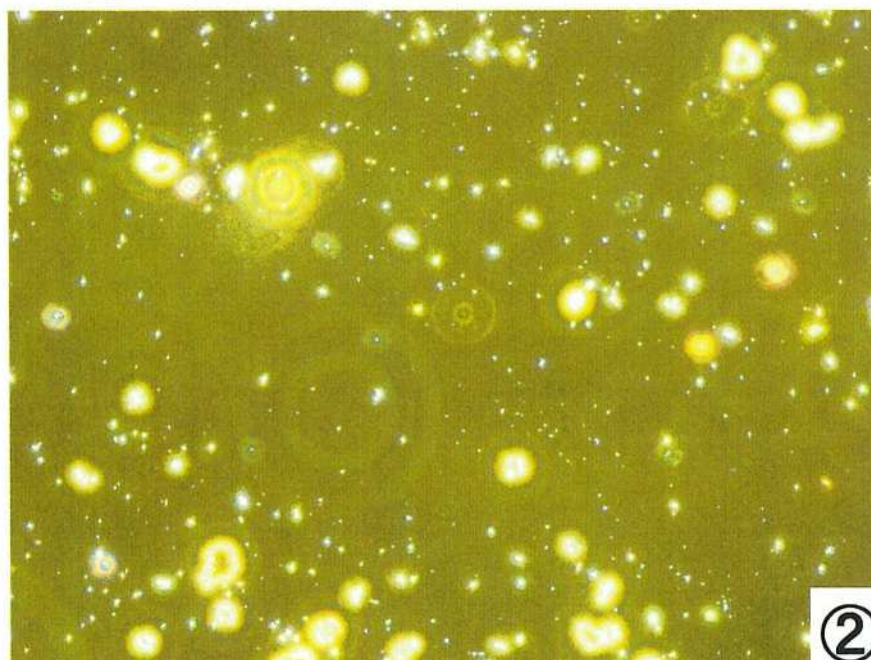


顕微鏡写真②

・屈折率 : 1.680

(アモサイト用)

・倍率 : $\times 100$

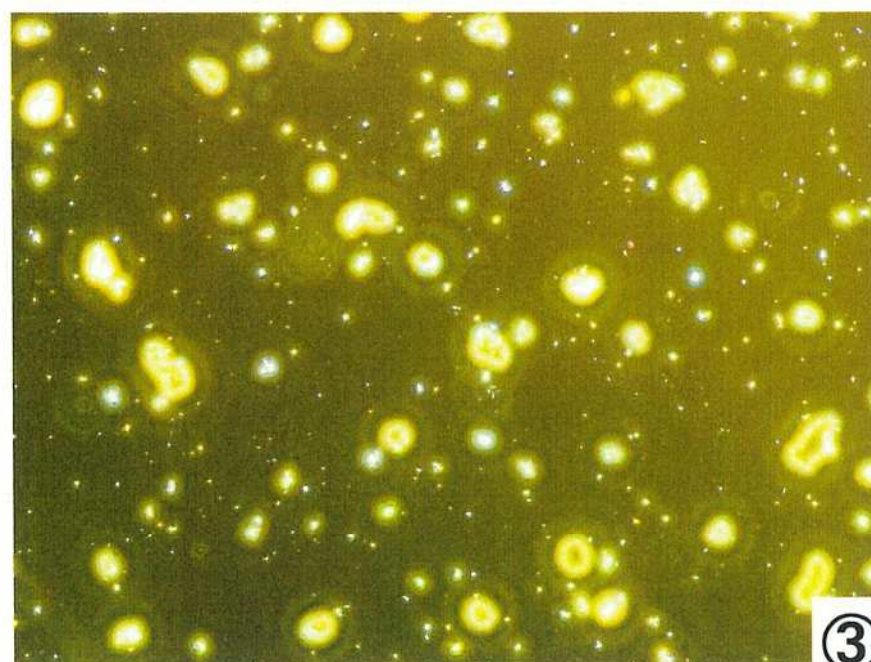

顕微鏡写真③

・屈折率 : 1.690


(クロシドライト用)

・倍率 : $\times 100$

別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法 顕微鏡写真(④, ⑤)

No.YI30055

試料名: アスファルトシングル

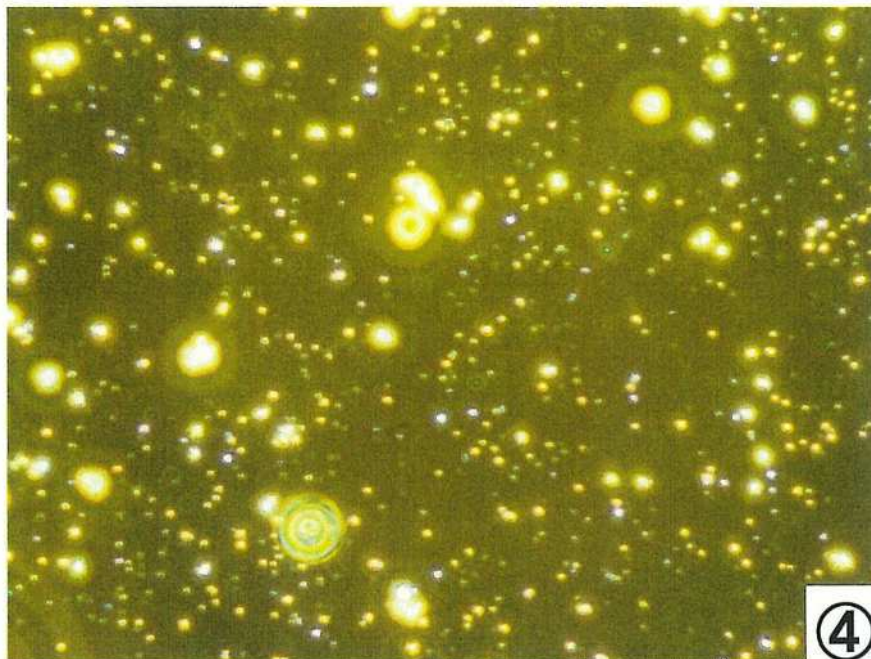


④

顕微鏡写真④

・屈折率: 1.618

(アンソフィライト用)

・倍率: ×100

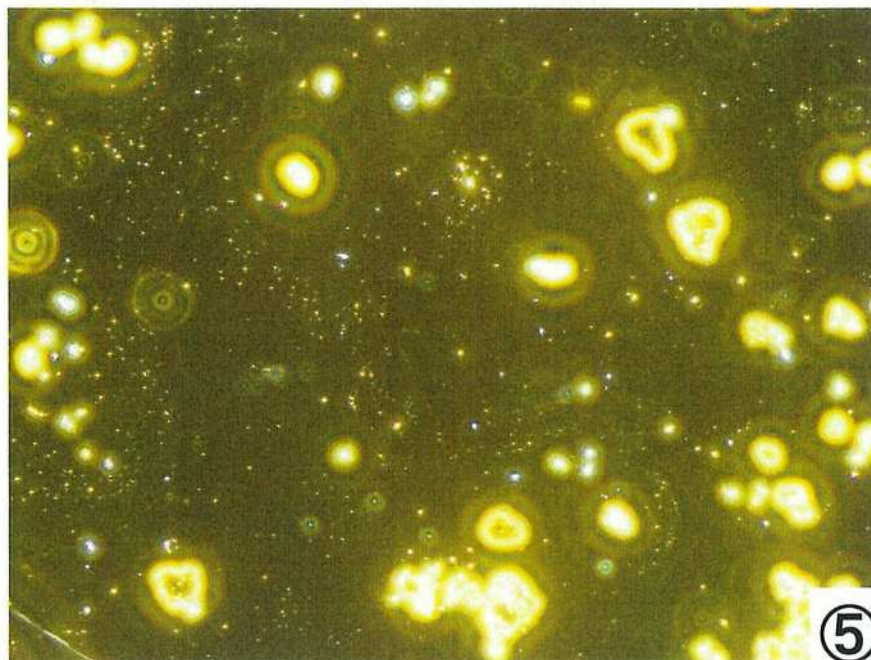

⑤

顕微鏡写真⑤

・屈折率: 1.620

(トレモライト/アクチノライト用)

・倍率: ×100

表 位相差顕微鏡による分散染色法におけるアスベストの分散色

アスベストの種類	屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$	分散色
クリソタイル	1.550	赤紫色～青色
アモサイト	1.680	桃色
クロシドライト	1.690	桃色
アンソフィライト	1.618	赤紫色
トレモライト/アクチノライト	1.620	赤紫色

位相差顕微鏡による分散染色法により、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストは、4繊維状粒子未満であった。

別紙B. X線回折分析法

表(1) 分析データシート(X線回折)

機 器 の 名 称	X' Pert ³ Powder (PANalytical社製)			
分 析 条 件		定性分析	定量分析	
	Target	Cu	Cu	
	Filter	Ni	Ni	
	Voltage	40	40	KV
	Current	40	40	mA
	ステップサイズ*	0.033	0.033	deg(2 θ)
	スキャンステップ時間	20	240	s
	スキャンの種類	連続	連続	
	発散スリットタイプ°	固定	固定	
	発散スリットサイズ*	0.5	0.5	deg
	試料幅	10.00	10.00	mm
分 析 結 果	別紙結果表(2)及び(3)に示すとおり			
備 考				


表(2) X線回折法によるアスベスト定性分析結果

試 料 名 (種 類)	分 析 対 象 名	判 定
アスファルトシングル	クリソタイル	無
	アモサイト	無
	クロシドライト	無
	アンソフィライト	無
	トレモライト/アクチノライト	無
備 考		

表(3) X線回折法によるアスベスト定量分析結果

試 料 名 (種 類)	分 析 対 象 名	含 有 率
アスファルトシングル	クリソタイル	—
	アモサイト	—
	クロシドライト	—
	アンソフィライト	—
	トレモライト/アクチノライト	—
備 考		

アスベストのピークは確認されませんでした。



<ピークリスト>

試験名：アスファルトシンゲル	↑	ピークリスト
クリンタイル(標準)	↑	Chrysotile
アモサイト(標準)	↑	Amosite
クロシドライト(標準)	↑	Crocidolite
アンソファイト(標準)	↑	Anthophyllite
トレモライト(標準)	↑	Tremolite
アクチノライト(標準)	↑	Actinolite
基板(珪鉛)	↑	Zinc

・ ピークリストにより、アスベスト標準のX線回折パターンを比較する。

分析結果報告書

No NS114031-01Z-1-001

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県第9-18号)
栃木県宇都宮市問屋町3172番地85
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工 事 名	特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託	
採 取 住 所	東京都北区中十条4-16-32	
採 取 場 所	外壁	
試 料 名 (種 類)	吹付タイル	
試 料 採 取 日	2022年9月27日	
採 取 区 分	株式会社 環境公害分析センター	分析実施者

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
吹付タイル	アスベスト含有

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
吹付タイル	クリソタイル	有	----
	アモサイト	無	----
	クロシドライト	無	----
	アンソフィライト	無	----
	トリモライト	無	----
	アクチノライト	無	----

判定基準:0.1%を超えてアスベストを含まないこと

層別推定含有率

層	外観色	層割合(%)	アスベスト種類	アスベスト推定含有率
1(表層側)	ベージュ	10	----	不検出
2	ライトグレー	90	クリソタイル	0.1%-5%
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----
----	----	----	----	----

※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました
※複数の層が見られた場合は、表層側から内側へ1層、2層と表しています

分析方法


方 法 種 類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-1 「市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法」
---------	---

管理番号: 66319

偏光顕微鏡写真

試料名: 吹付タイル

伸長の符号



正の符号

分散色



屈折率1.550 青(⊥)
クリソタイル検出

分析結果報告書

No. YI30056

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県) 第18号
栃木県宇都宮市問屋町3172番地85
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工 事 名 : 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託

採 取 住 所 : 東京都北区中十条4-16-32

採 取 場 所 : 外壁目地

試 料 名 (種 類) : ポリサルファイドコーキング

試 料 採 取 日 : 2022年9月27日

採 取 区 分 : 株式会社 環境公害分析センター

分析実施者

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
ポリサルファイド コーキング	アスベスト含有せず

分析方法

方 法 種 類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-2 「試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
---------	---

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
ポリサルファイド コーキング	クリソタイル	無	---
	アモサイト	無	---
	クロシドライト	無	---
	アンソフィライト	無	---
	トレモライト/ アクチノライト	無	---

判定基準:0.1%を超えてアスベストを含まないこと

管理番号: 66319

分析内容:試料名(種類): ポリサルファイド コーキング


アスベストの種類	アスベストの有無			アスベスト含有の有無の判定	アスベスト含有率
	A. 位相差顕微鏡による分散染色法(※1)		B. X線回折分析法による回折線のアスベストピークの有無(※2)		
クリソタイル	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
アモサイト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
クロシドライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
アンソフィライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
トレモライト/ アクチノライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			

☐ :選択マーク

※1 別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法参照。

※2 別紙B. X線回折分析法参照。

※3 「4/3000」とは、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストが4繊維状粒子の意味。

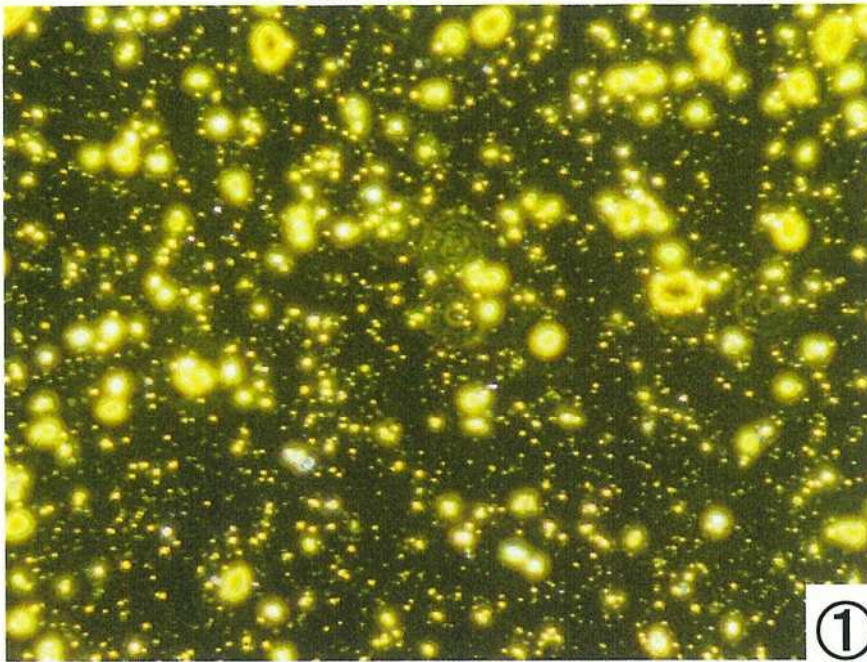


顕微鏡写真①

・屈折率 : 1.550

(クリソタイル用)

・倍率 : $\times 100$

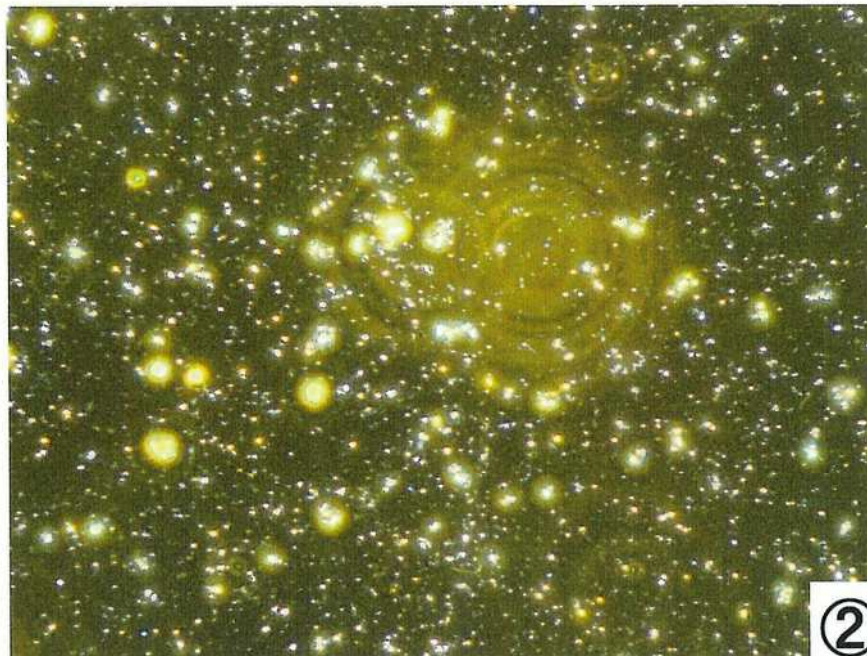


顕微鏡写真②

・屈折率 : 1.680

(アモサイト用)

・倍率 : $\times 100$

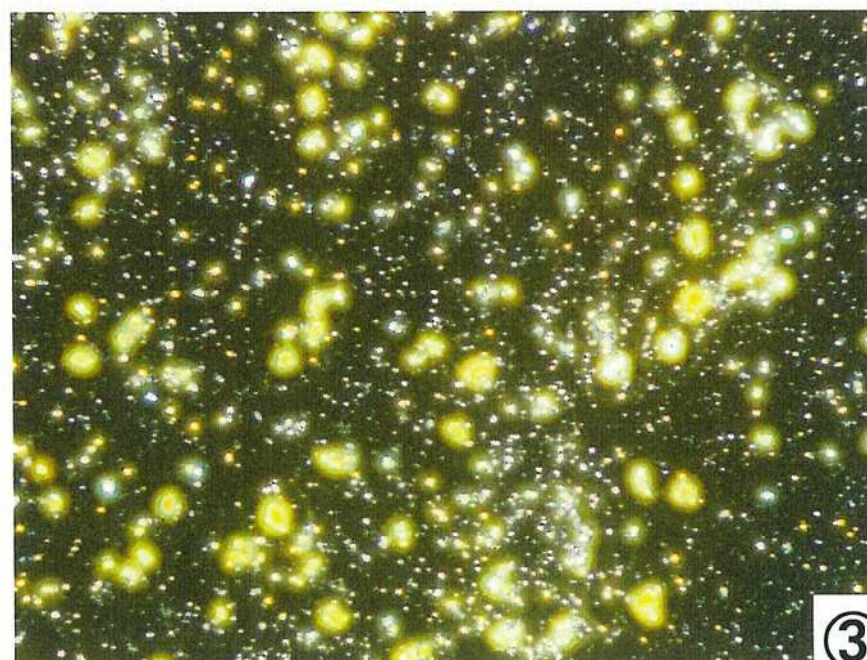


顕微鏡写真③

・屈折率 : 1.690

(クロシドライト用)

・倍率 : $\times 100$

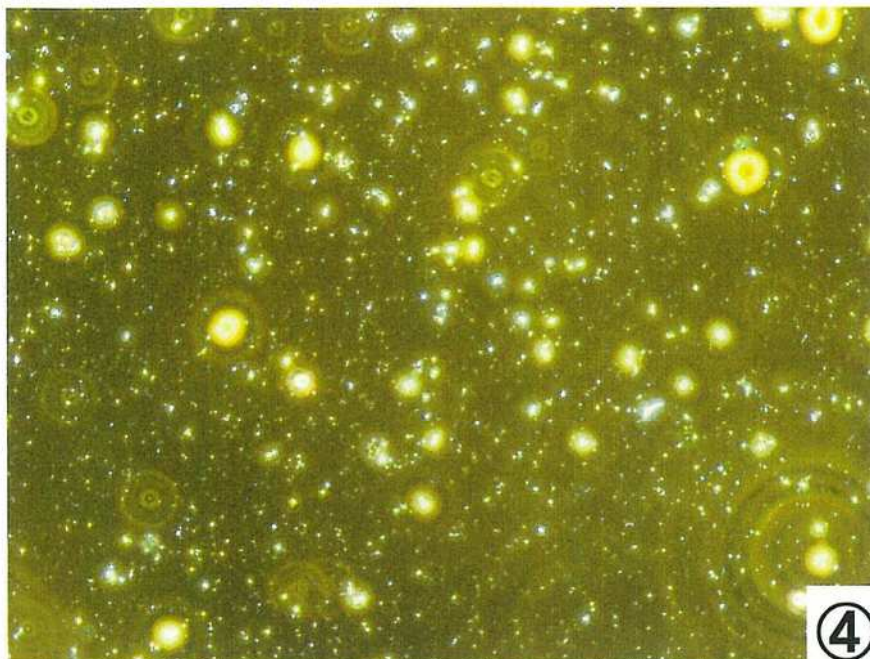


④

顕微鏡写真④

・屈折率：1.618

(アンソフィライト用)

・倍率：×100

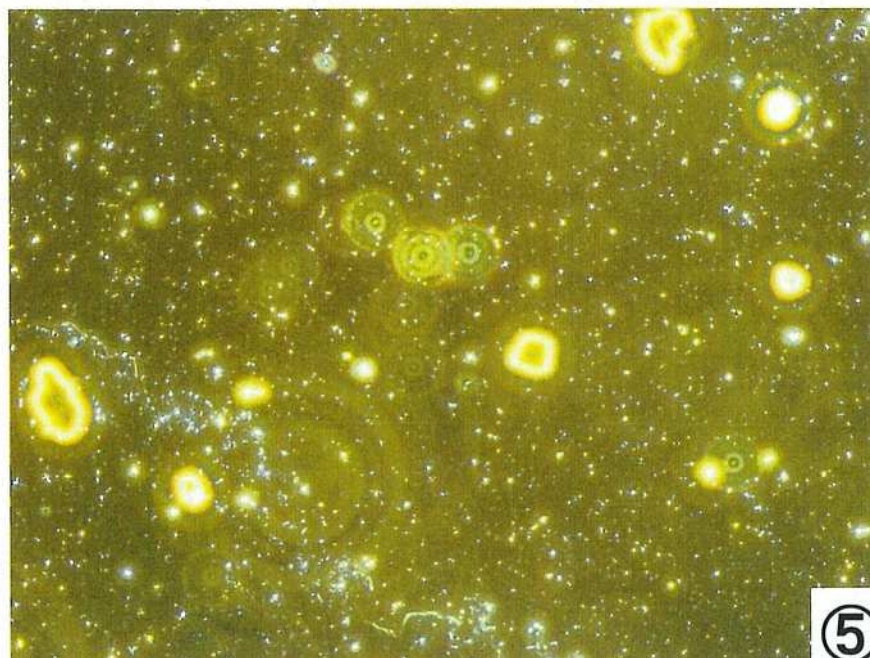

⑤

顕微鏡写真⑤

・屈折率：1.620

(トレモライト/アクチノライト用)

・倍率：×100

表 位相差顕微鏡による分散染色法におけるアスベストの分散色

アスベストの種類	屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$	分散色
クリソタイル	1.550	赤紫色～青色
アモサイト	1.680	桃色
クロシドライト	1.690	桃色
アンソフィライト	1.618	赤紫色
トレモライト/アクチノライト	1.620	赤紫色

位相差顕微鏡による分散染色法により、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストは、4繊維状粒子未満であった。

別紙B. X線回折分析法

表(1) 分析データシート(X線回折)

機 器 の 名 称	X'Pert ³ Powder (PANalytical社製)			
分 析 条 件		定性分析	定量分析	
	Target	Cu	Cu	
	Filter	Ni	Ni	
	Voltage	40	40	KV
	Current	40	40	mA
	ステップサイズ*	0.033	0.033	deg(2 θ)
	スキャンステップ時間	20	240	s
	スキャンの種類	連続	連続	
	発散スリットタイプ*	固定	固定	
	発散スリットサイズ*	0.5	0.5	deg
	試料幅	10.00	10.00	mm
分 析 結 果	別紙結果表(2)及び(3)に示すとおり			
備 考				


表(2) X線回折法によるアスベスト定性分析結果

試料名(種類)	分析対象名	判定
ポリサルファイド コーキング	クリソタイル	無
	アモサイト	無
	クロシドライト	無
	アンソフィライト	無
	トレモライト/アクチノライト	無
備考		

表(3) X線回折法によるアスベスト定量分析結果

試料名(種類)	分析対象名	含有率
ポリサルファイド コーキング	クリソタイル	—
	アモサイト	—
	クロシドライト	—
	アンソフィライト	—
	トレモライト/アクチノライト	—
備考		

アスベストのピークは確認されませんでした。



<ピークリスト>

↑	ピークリスト
↑	試料名：ポリサルファイドコーキング
↑	クリンタイル(標準)
↑	アモサイト(標準)
↑	クロシドライト(標準)
↑	アンソファイト(標準)
↑	トレモライト(標準)
↑	アクチノライト(標準)
↑	基板(珪鉛)

・ ピークリストにより、アスベスト標準のX線回折パターンを比較する。

分析結果報告書

No. YI30057

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県) 第18号
栃木県宇都宮市問屋町3172番地85
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工 事 名 : 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託
採 取 住 所 : 東京都北区中十条4-16-32
採 取 場 所 : バルコニー 床(5階)
試 料 名 (種 類) : アスファルト防水
試 料 採 取 日 : 2022年9月27日
採 取 区 分 : 株式会社 環境公害分析センター

分析実施者

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
アスファルト防水	アスベスト含有せず

分析方法

方 法 種 類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-2 「試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
---------	---

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
アスファルト防水	クリソタイル	無	----
	アモサイト	無	----
	クロシドライト	無	----
	アンソフィライト	無	----
	トレモライト/ アクチノライト	無	----

判定基準:0.1%を超えてアスベストを含まないこと

管理番号: 66319

分析内容:試料名(種類): アスファルト防水


アスベストの種類	アスベストの有無			アスベスト含有率	
	A. 位相差顕微鏡による分散染色法(※1)		B. X線回折分析法による回折線のアスベストピークの有無(※2)		
クリソタイル	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
アモサイト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
クロシドライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
アンソフィライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
トレモライト/ アクチノライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			

☐ : 選択マーク

※1 別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法参照。

※2 別紙B. X線回折分析法参照。

※3 「4/3000」とは、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストが4繊維状粒子の意味。

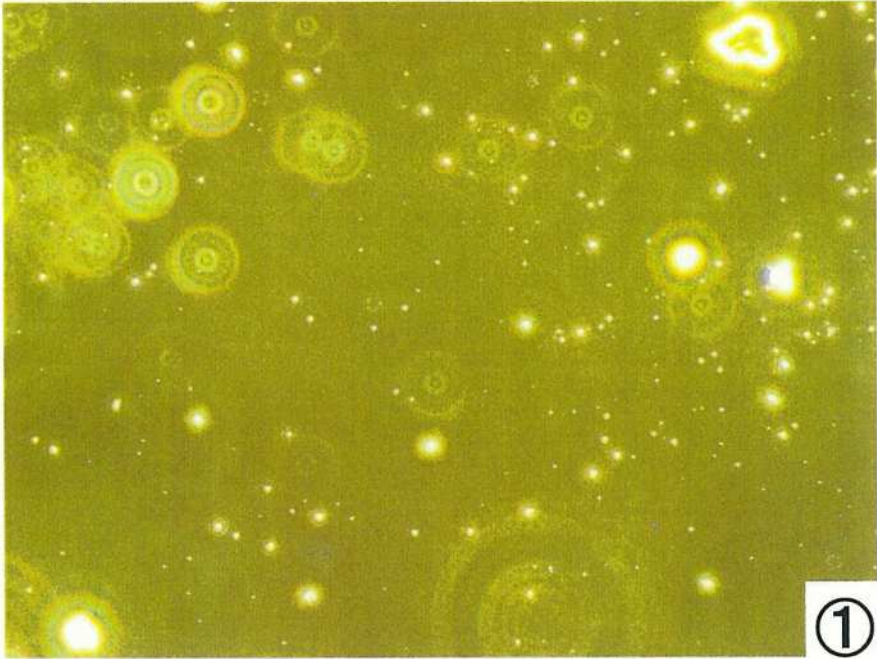


顕微鏡写真①

・屈折率：1.550

(クリソタイル用)

・倍率：×100

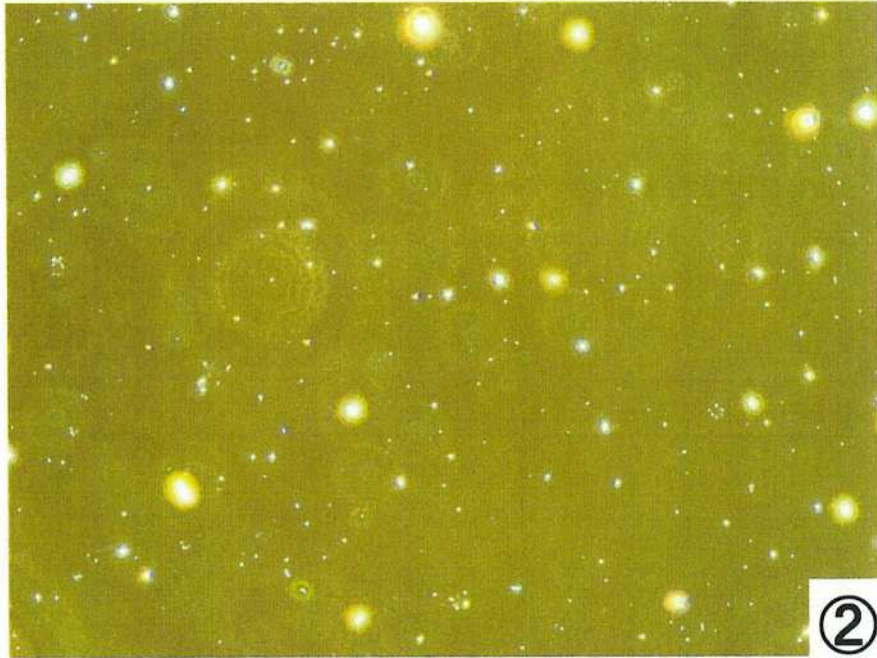


顕微鏡写真②

・屈折率：1.680

(アモサイト用)

・倍率：×100

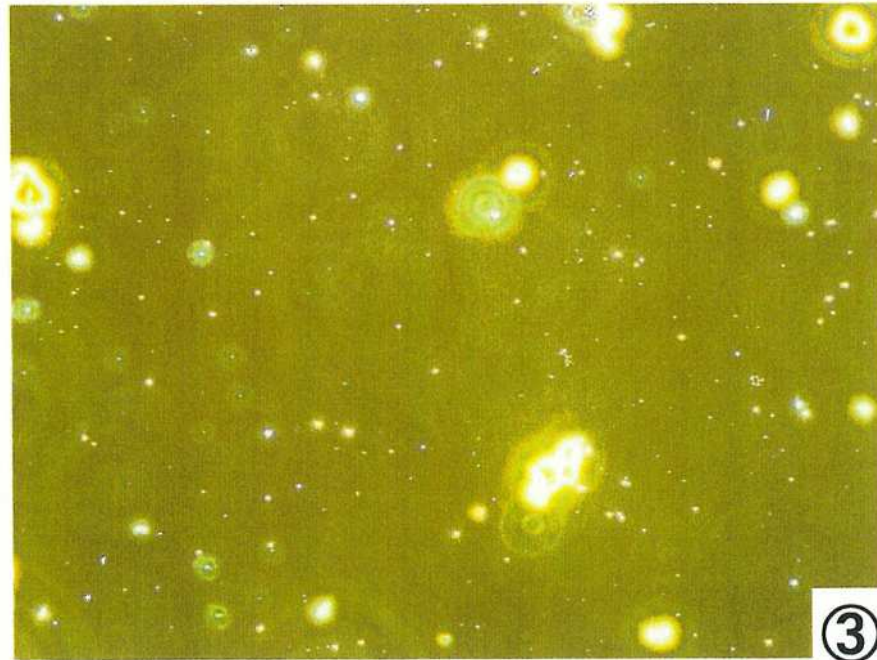


顕微鏡写真③

・屈折率：1.690

(クロシドライト用)

・倍率：×100

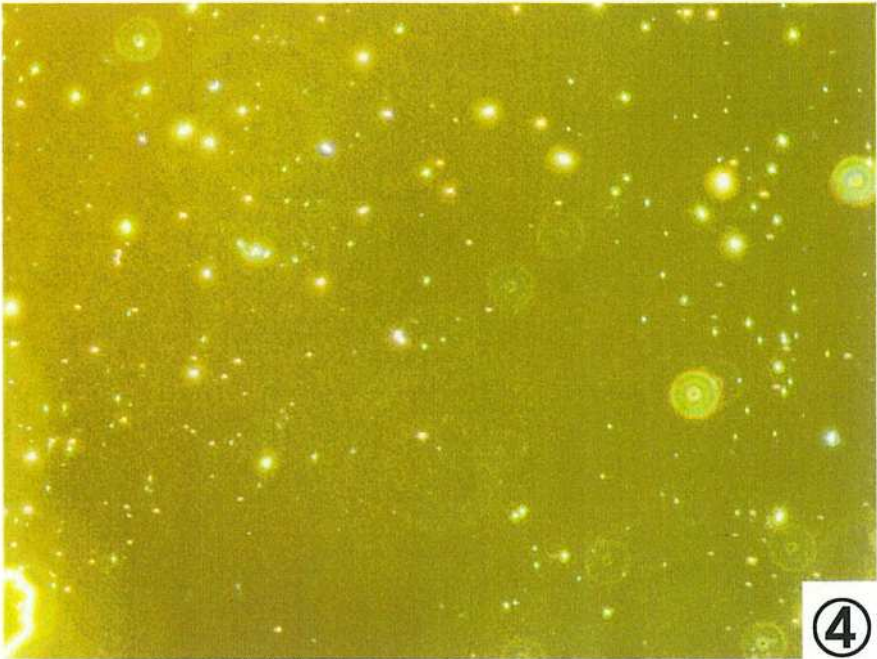


顕微鏡写真④

・屈折率：1.618

(アンソフィライト用)

・倍率：×100

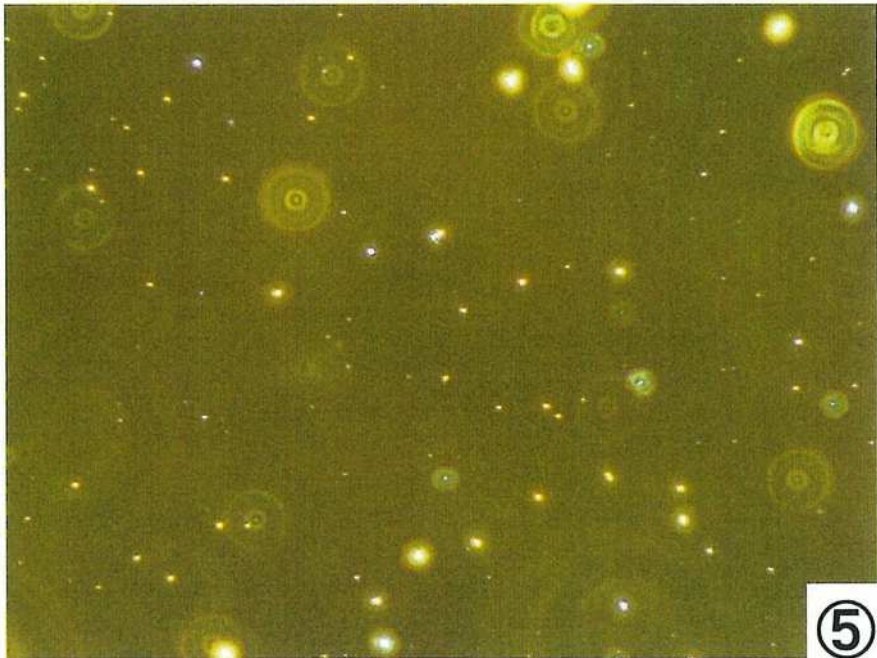

顕微鏡写真⑤

・屈折率：1.620

(トレモライト/アクチノライト用)

・倍率：×100

表 位相差顕微鏡による分散染色法におけるアスベストの分散色

アスベストの種類	屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$	分散色
クリソタイル	1.550	赤紫色～青色
アモサイト	1.680	桃色
クロシドライト	1.690	桃色
アンソフィライト	1.618	赤紫色
トレモライト/アクチノライト	1.620	赤紫色

位相差顕微鏡による分散染色法により、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストは、4繊維状粒子未満であった。

別紙B. X線回折分析法

表(1) 分析データシート(X線回折)

機 器 の 名 称	X' Pert ³ Powder (PANalytical社製)			
分 析 条 件		定性分析	定量分析	
	Target	Cu	Cu	
	Filter	Ni	Ni	
	Voltage	40	40	KV
	Current	40	40	mA
	ステップサイズ*	0.033	0.033	deg(2 θ)
	スキャンステップ時間	20	240	s
	スキャンの種類	連続	連続	
	発散スリットタイプ*	固定	固定	
	発散スリットサイズ*	0.5	0.5	deg
	試料幅	10.00	10.00	mm
分 析 結 果	別紙結果表(2)及び(3)に示すとおり			
備 考				


表(2) X線回折法によるアスベスト定性分析結果

試 料 名 (種 類)	分 析 対 象 名	判 定
アスファルト防水	クリソタイル	無
	アモサイト	無
	クロシドライト	無
	アンソフィライト	無
	トレモライト/アクチノライト	無
備 考		

表(3) X線回折法によるアスベスト定量分析結果

試 料 名 (種 類)	分 析 対 象 名	含 有 率
アスファルト防水	クリソタイル	—
	アモサイト	—
	クロシドライト	—
	アンソフィライト	—
	トレモライト/アクチノライト	—
備 考		

アスベストのピークは確認されませんでした。



<ピークリスト>

試料名：アスファルト防水	↑	ピークリスト
クリンタイル(標準)	↑	Chrysotile
アモサイト(標準)	↑	Amosite
クロシドライト(標準)	↑	Crocidolite
アンソファイト(標準)	↑	Anthophyllite
トリモライト(標準)	↑	Tremolite
アクチノライト(標準)	↑	Actinolite
基板板(亜鉛)	↑	Zinc

・ ピークリストにより、アスベスト標準のX線回折パターンを比較する。

分析結果報告書

No. YI30058

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県 第18号)
栃木県宇都宮市問屋町3-72番地8号
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工 事 名 : 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託
採 取 住 所 : 東京都北区中十条4-16-32
採 取 場 所 : バルコニー 軒天井
試 料 名 (種 類) : 耐水岩綿吸音板t12
試 料 採 取 日 : 2022年9月27日
採 取 区 分 : 株式会社 環境公害分析センター

分析実施者

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
耐水岩綿吸音板t12	アスベスト含有せず

分析方法

方 法 種 類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-2 「試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
---------	---

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
耐水岩綿吸音板t12	クリソタイル	無	---
	アモサイト	無	---
	クロシドライト	無	---
	アンソフィライト	無	---
	トレモライト/ アクチノライト	無	---

判定基準:0.1%を超えてアスベストを含まないこと

管理番号: 66319

分析内容:試料名(種類): 耐水岩綿吸音板t12


アスベストの種類	アスベストの有無			アスベスト含有の有無の判定	アスベスト含有率
	A. 位相差顕微鏡による分散染色法(※1)		B. X線回折分析法による回折線のアスベストピークの有無(※2)		
クリソタイル	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
アモサイト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
クロシドライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
アンソフィライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
トレモライト/ アクチノライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			

☐ : 選択マーク

※1 別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法参照。

※2 別紙B. X線回折分析法参照。

※3 「4/3000」とは、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストが4繊維状粒子の意味。

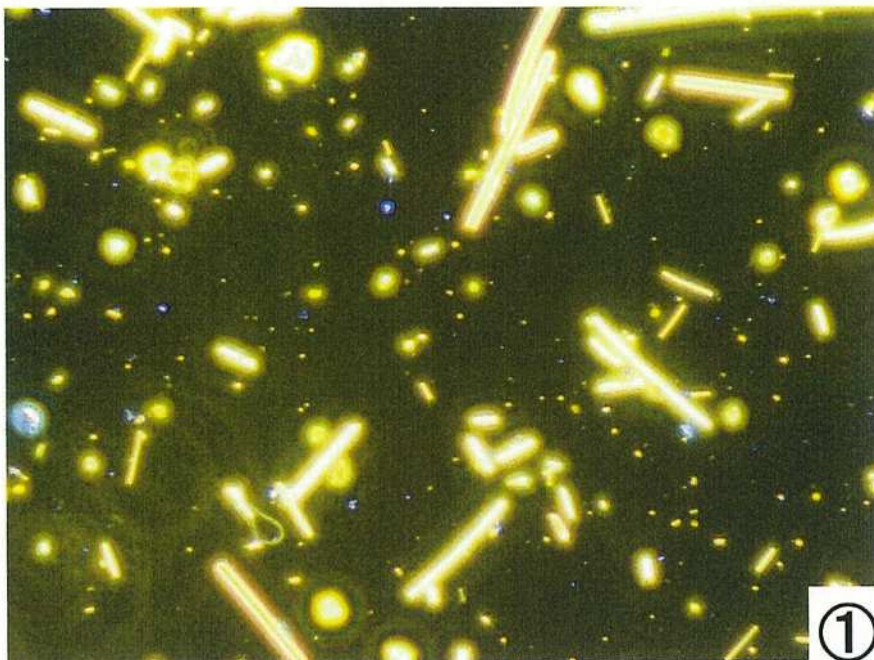


顕微鏡写真①

・屈折率：1.550

(クリソタイル用)

・倍率：×100

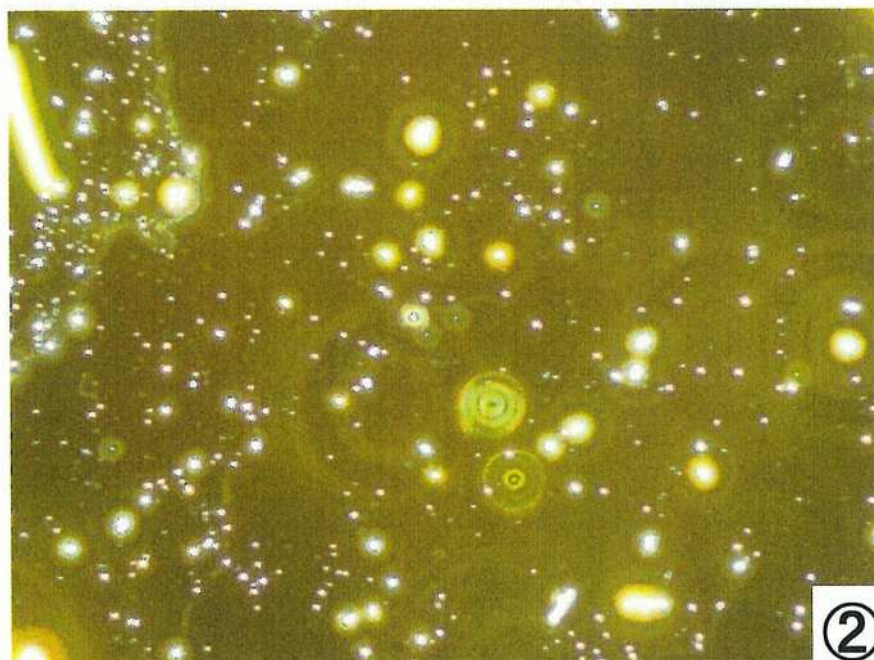


顕微鏡写真②

・屈折率：1.680

(アモサイト用)

・倍率：×100

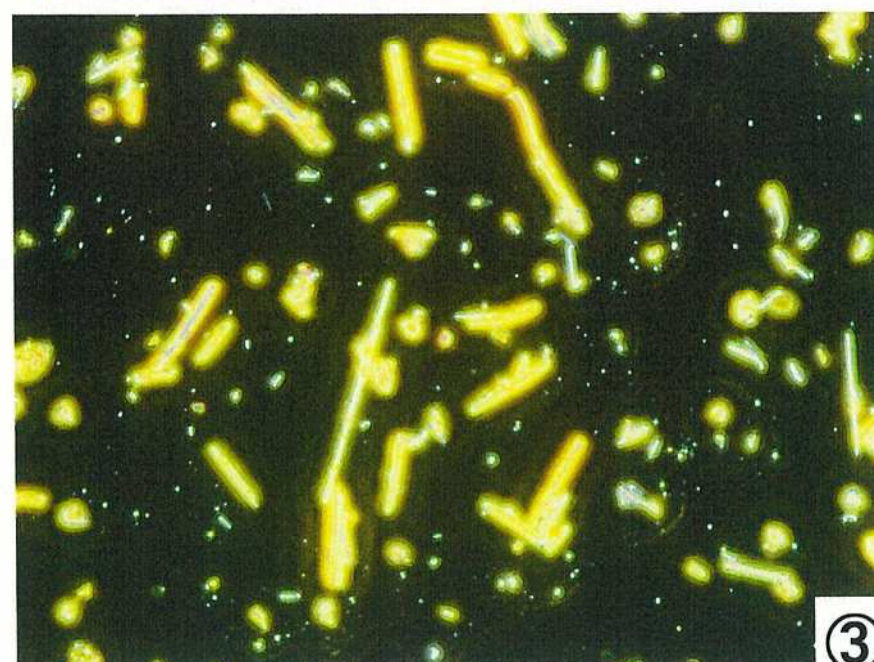


顕微鏡写真③

・屈折率：1.690

(クロシドライト用)

・倍率：×100

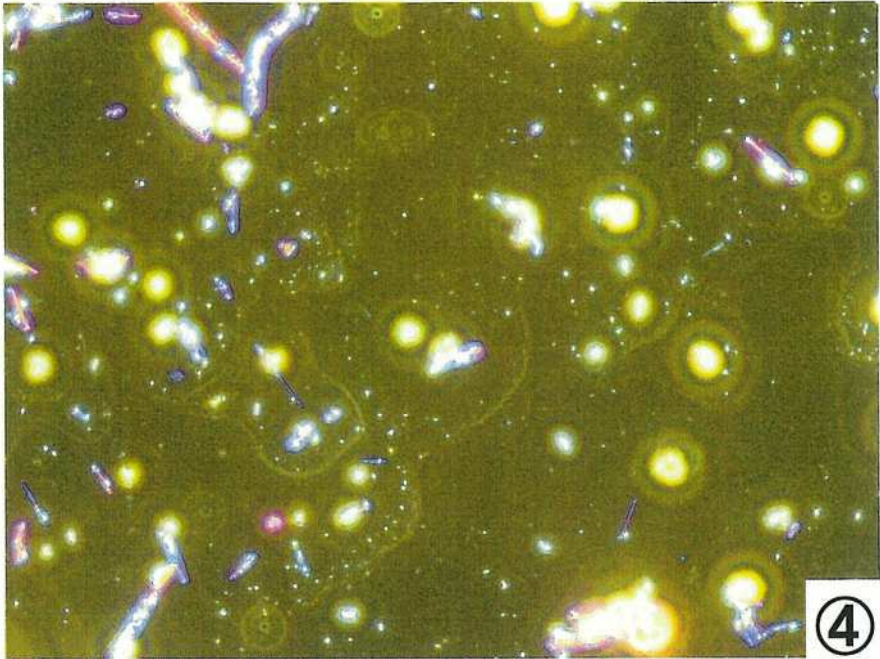


顕微鏡写真④

・屈折率：1.618

(アンソフィライト用)

・倍率：×100

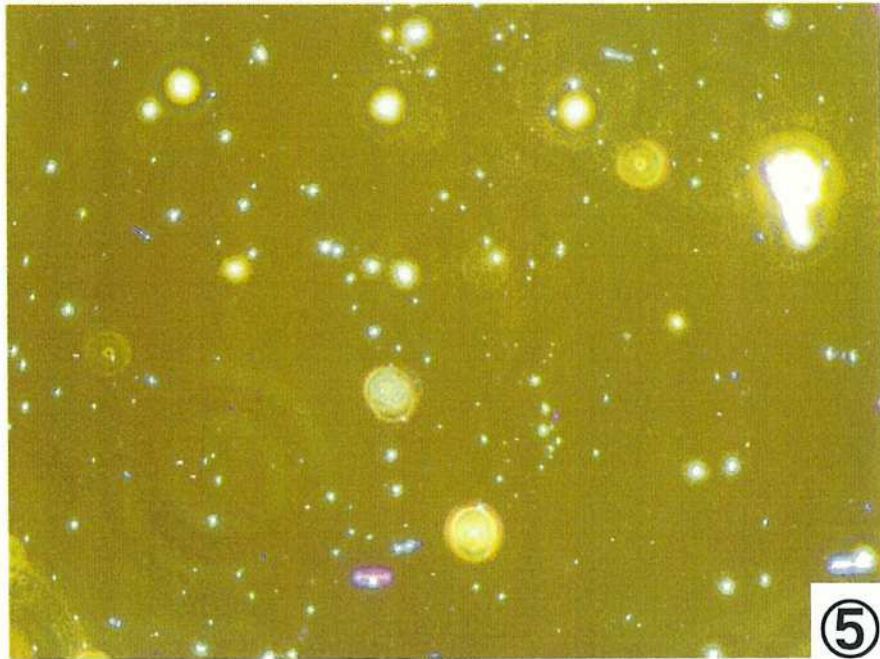

顕微鏡写真⑤

・屈折率：1.620

(トレモライト/アクチノライト用)

・倍率：×100

表 位相差顕微鏡による分散染色法におけるアスベストの分散色

アスベストの種類	屈折率 $n_D^{25^\circ C}$	分散色
クリソタイル	1.550	赤紫色～青色
アモサイト	1.680	桃色
クロシドライト	1.690	桃色
アンソフィライト	1.618	赤紫色
トレモライト/アクチノライト	1.620	赤紫色

位相差顕微鏡による分散染色法により、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストは、4繊維状粒子未満であった。

別紙B. X線回折分析法

表(1) 分析データシート(X線回折)

機 器 の 名 称	X' Pert ³ Powder (PANalytical社製)			
分 析 条 件		定性分析	定量分析	
	Target	Cu	Cu	
	Filter	Ni	Ni	
	Voltage	40	40	KV
	Current	40	40	mA
	ステップサイズ*	0.033	0.033	deg(2 θ)
	スキャンステップ時間	20	240	s
	スキャンの種類	連続	連続	
	発散スリットタイプ*	固定	固定	
	発散スリットサイズ*	0.5	0.5	deg
	試料幅	10.00	10.00	mm
分 析 結 果	別紙結果表(2)及び(3)に示すとおり			
備 考				


表(2) X線回折法によるアスベスト定性分析結果

試 料 名 (種 類)	分 析 対 象 名	判 定
耐水岩綿吸音板t12	クリソタイル	無
	アモサイト	無
	クロシドライト	無
	アンソフィライト	無
	トレモライト/アクチノライト	無
備 考		

表(3) X線回折法によるアスベスト定量分析結果

試 料 名 (種 類)	分 析 対 象 名	含 有 率
耐水岩綿吸音板t12	クリソタイル	—
	アモサイト	—
	クロシドライト	—
	アンソフィライト	—
	トレモライト/アクチノライト	—
備 考		

アスベストのピークは確認されませんでした。



<ピークリスト>

↑	ピークリスト
↑	Chrysotile
↑	Amosite
↑	Crocidolite
↑	Anthophyllite
↑	Tremolite
↑	Actinolite
↑	Zinc
↑	基板(亜鉛)

・ ピークリストにより、アスベスト標準のX線回折パターンを比較する。

分析結果報告書

No. YI30059

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県) 第18号
栃木県宇都宮市問屋町3-72番地8号
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工 事 名 : 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託
採 取 住 所 : 東京都北区中十条4-16-32
採 取 場 所 : パルコニー 軒天井
試 料 名 (種 類) : ケイ酸カルシウム板
試 料 採 取 日 : 2022年9月27日
採 取 区 分 : 株式会社 環境公害分析センター 分析実施者

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
ケイ酸カルシウム板	アスベスト含有せず

分析方法

方 法 種 類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-2 「試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
---------	---

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
ケイ酸カルシウム板	クリソタイル	無	---
	アモサイト	無	---
	クロシドライト	無	---
	アンソフィライト	無	---
	トレモライト/ アクチノライト	無	---

判定基準:0.1%を超えてアスベストを含まないこと

管理番号: 66319

分析内容:試料名(種類): ケイ酸カルシウム板


アスベストの種類	アスベストの有無			アスベスト含有の有無の判定	アスベスト含有率
	A. 位相差顕微鏡による分散染色法(※1)		B. X線回折分析法による回折線のアスベストピークの有無(※2)		
クリソタイル	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
アモサイト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
クロソドライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
アンソフィライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
トレモライト/ アクチノライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			

○ : 選択マーク

※1 別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法参照。

※2 別紙B. X線回折分析法参照。

※3 「4/3000」とは、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストが4繊維状粒子の意味。

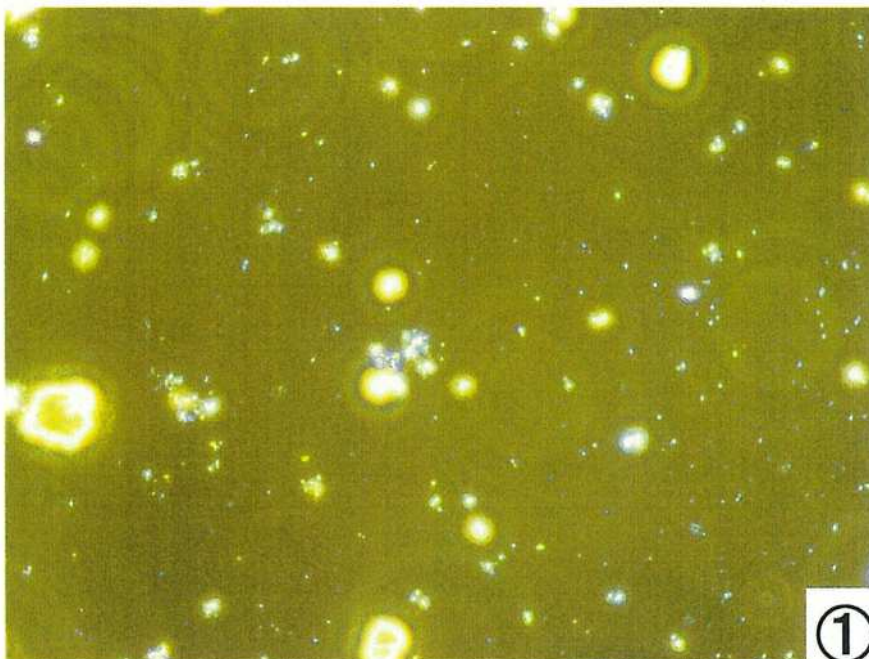


顕微鏡写真①

・屈折率：1.550

(クリソタイル用)

・倍率：×100

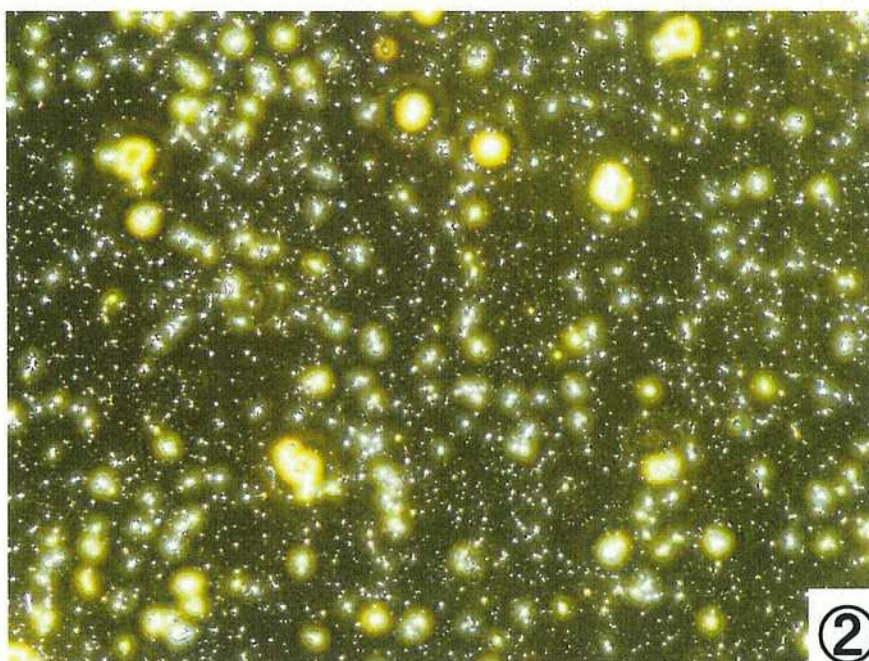


顕微鏡写真②

・屈折率：1.680

(アモサイト用)

・倍率：×100

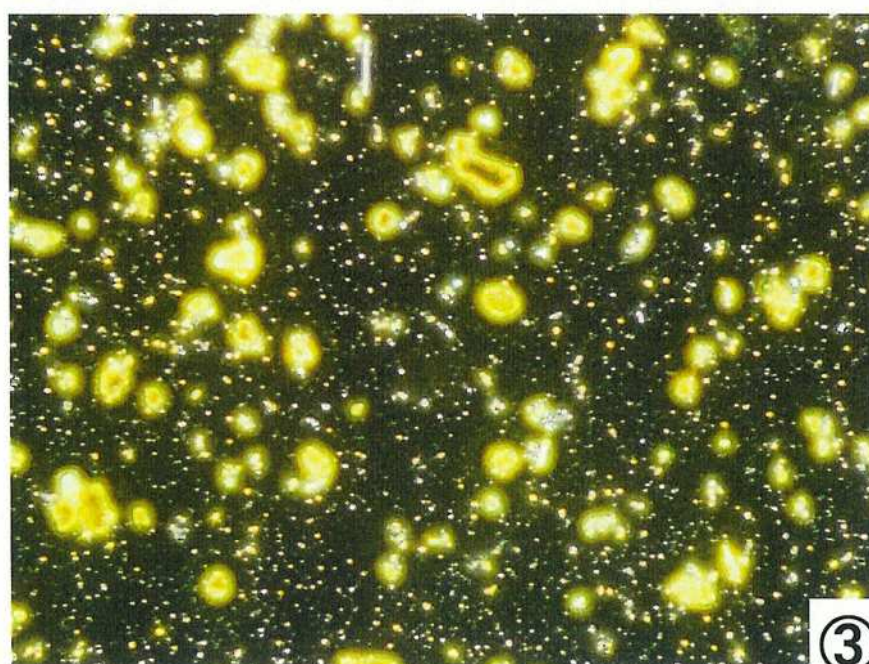


顕微鏡写真③

・屈折率：1.690

(クロシドライト用)

・倍率：×100

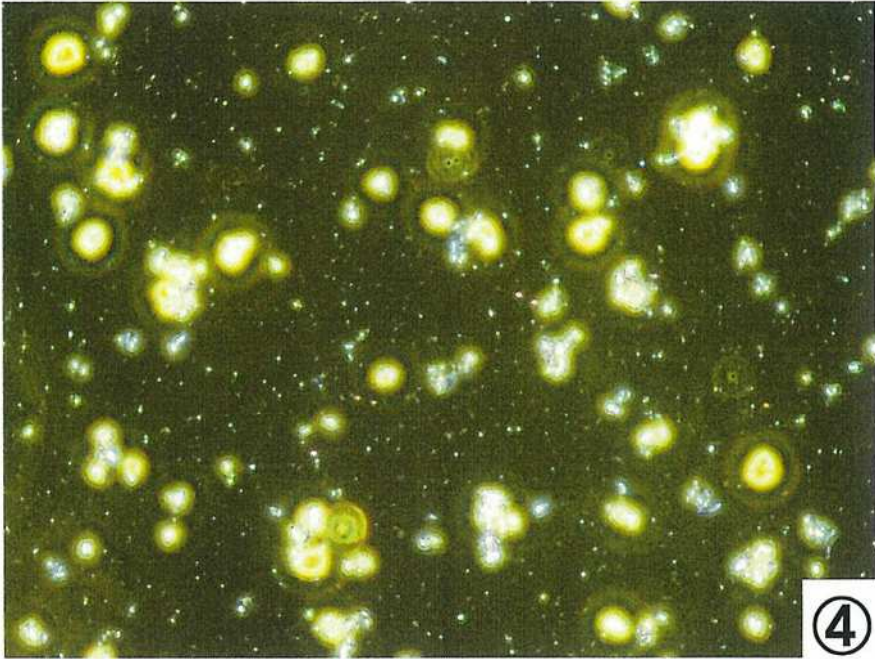


顕微鏡写真④

・屈折率：1.618

(アンソフィライト用)

・倍率：×100

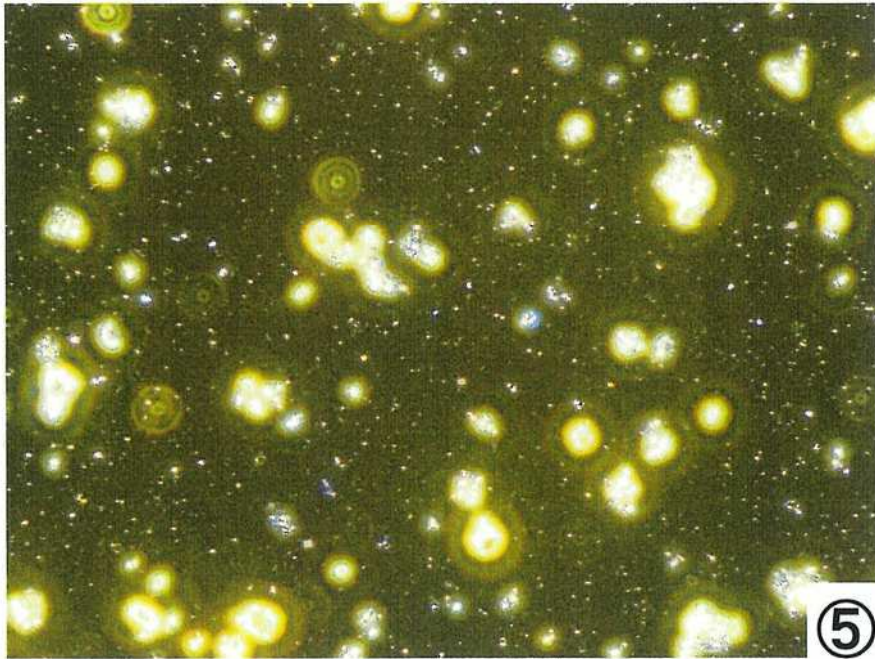

顕微鏡写真⑤

・屈折率：1.620

(トレモライト/アクチノライト用)

・倍率：×100

表 位相差顕微鏡による分散染色法におけるアスベストの分散色

アスベストの種類	屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$	分散色
クリソタイル	1.550	赤紫色～青色
アモサイト	1.680	桃色
クロシドライト	1.690	桃色
アンソフィライト	1.618	赤紫色
トレモライト/アクチノライト	1.620	赤紫色

位相差顕微鏡による分散染色法により、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストは、4繊維状粒子未満であった。

別紙B. X線回折分析法

表(1) 分析データシート(X線回折)

機 器 の 名 称	X' Pert ³ Powder (PANalytical社製)			
分 析 条 件		定性分析	定量分析	
	Target	Cu	Cu	
	Filter	Ni	Ni	
	Voltage	40	40	KV
	Current	40	40	mA
	ステップサイズ*	0.033	0.033	deg(2 θ)
	スキャンステップ時間	20	240	s
	スキャンの種類	連続	連続	
	発散スリットタイプ*	固定	固定	
	発散スリットサイズ*	0.5	0.5	deg
	試料幅	10.00	10.00	mm
分 析 結 果	別紙結果表(2)及び(3)に示すとおり			
備 考				


表(2) X線回折法によるアスベスト定性分析結果

試 料 名 (種 類)	分 析 対 象 名	判 定
ケイ酸カルシウム板	クリソタイル	無
	アモサイト	無
	クロシドライト	無
	アンソフィライト	無
	トレモライト/アクチノライト	無
備 考		

表(3) X線回折法によるアスベスト定量分析結果

試 料 名 (種 類)	分 析 対 象 名	含 有 率
ケイ酸カルシウム板	クリソタイル	—
	アモサイト	—
	クロシドライト	—
	アンソフィライト	—
	トレモライト/アクチノライト	—
備 考		

アスベストのピークは確認されませんでした。



<ピークリスト>

試料名：ケイ酸カルシウム板	↑	ピークリスト
クリンタイル(標準)	↑	Chrysotile
アモサイト(標準)	↑	Amosite
クロシドライト(標準)	↑	Crocidolite
アンソファイト(標準)	↑	Anthophyllite
トレモライト(標準)	↑	Tremolite
アクチノライト(標準)	↑	Actinolite
基板板(珪鉛)	↑	Zinc

・ ピークリストにより、アスベスト標準のX線回折パターンを比較する。

分析結果報告書

№ NS114031-01Z-1-002

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県第18号)
栃木県宇都宮市問屋町3122番地85
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工 事 名	特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託		
採 取 住 所	東京都北区中十条4-16-32		
採 取 場 所	地下1階 廊下 床		
試 料 名 (種 類)	ビニル床シート		
試 料 採 取 日	2022年9月27日		
採 取 区 分	株式会社 環境公害分析センター	分析実施者	

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
ビニル床シート	アスベスト含有

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
ビニル床シート	クリソタイル	有	---
	アモサイト	無	---
	クロシドライト	無	---
	アンソフィライト	無	---
	トレモライト	無	---
	アクチノライト	無	---

判定基準: 0.1%を超えてアスベストを含まないこと

層別推定含有率

層	外観色	層割合(%)	アスベスト種類	アスベスト推定含有率
1(表層側)	灰	10	---	不検出
2	ライトグレー	20	---	不検出
3	白	30	---	不検出
4	ベージュ	10	---	不検出
5	ライトグレー	30	クリソタイル	0.1%-5%

※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました
※複数の層が見られた場合は、表層側から内側へ1層、2層と表しています

分析方法

方 法 種 類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-1 「市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法」
---------	---

管理番号: 66319

偏光顕微鏡写真


試料名: ビニル床シート

伸長の符号



正の符号

分散色



屈折率1.550 青(⊥)

クリソタイル検出

分析結果報告書

No. YI30060

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県) 第18号
栃木県宇都宮市問屋町3172番地8号
株式会社 環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工 事 名	特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託		
採 取 住 所	東京都北区中十条4-16-32		
採 取 場 所	地下1階 食品庫 天井		
試 料 名 (種 類)	無石綿ケイ酸カルシウム板t6		
試 料 採 取 日	2022年9月27日		
採 取 区 分	株式会社 環境公害分析センター	分析実施者	

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
無石綿 ケイ酸カルシウム板t6	アスベスト含有せず

分析方法

方 法 種 類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-2 「試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
---------	---

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
無石綿 ケイ酸カルシウム板t6	クリソタイル	無	---
	アモサイト	無	---
	クロシドライト	無	---
	アンソフィライト	無	---
	トレモライト/ アクチノライト	無	---

判定基準:0.1%を超えてアスベストを含まないこと

管理番号: 66319

分析内容:試料名(種類): 無石綿 ケイ酸カルシウム板t6

アスベストの種類	アスベストの有無			アスベスト含有の有無の判定	アスベスト含有率
	A. 位相差顕微鏡による分散染色法(※1)		B. X線回折分析法による回折線のアスベストピークの有無(※2)		
クリソタイル	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
アモサイト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
クロシドライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
アンソフィライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
トレモライト/ アクチノライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			

○ : 選択マーク

※1 別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法参照。


※2 別紙B. X線回折分析法参照。

※3 「4/3000」とは、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストが4繊維状粒子の意味。

別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法 顕微鏡写真(①～③)

No.YI30060

試料名：無石糖 ケイ酸カルシウム板t6

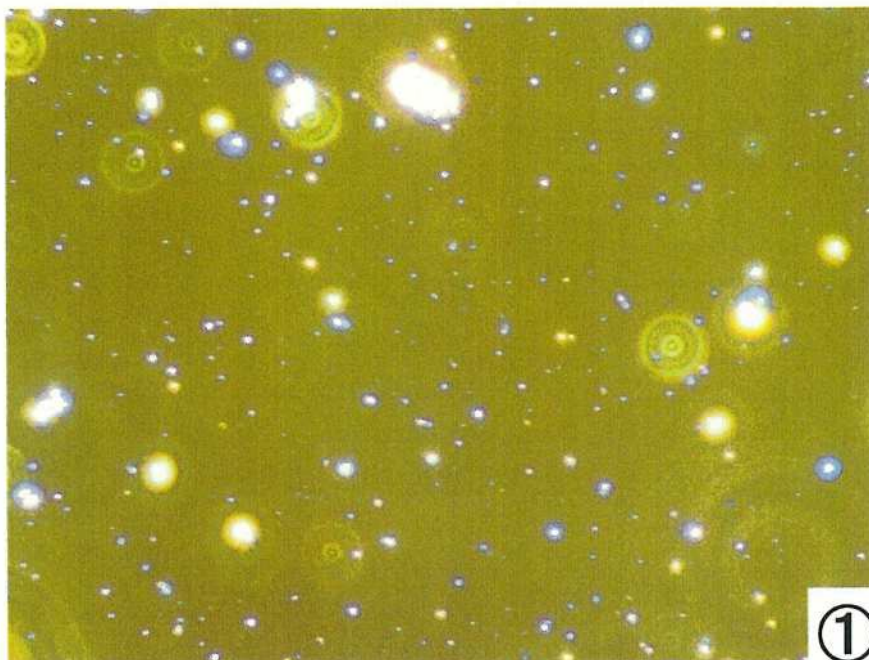


顕微鏡写真①

・屈折率 : 1.550

(クリソタイル用)

・倍率 : $\times 100$

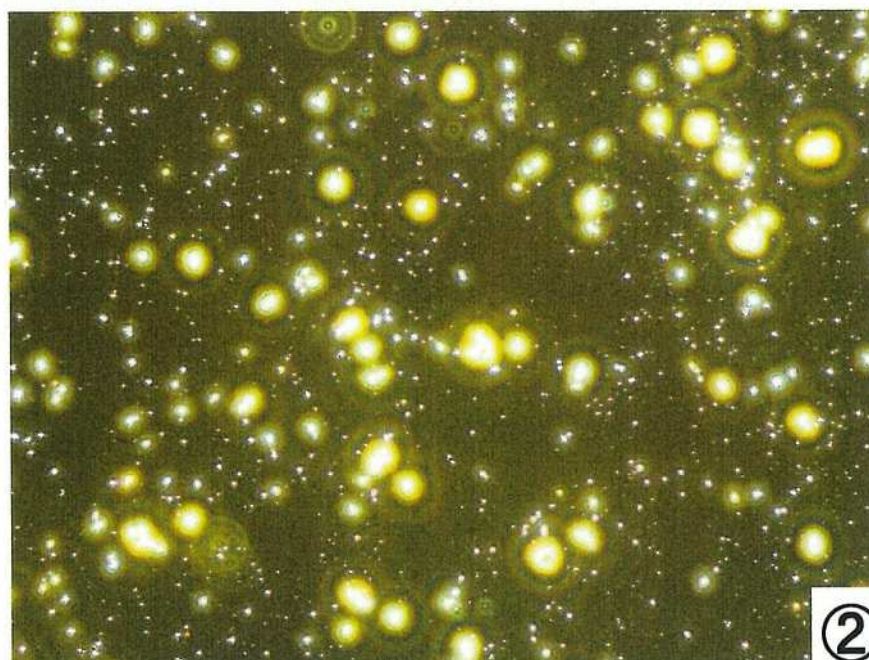

顕微鏡写真②

・屈折率 : 1.680

(アモサイト用)

・倍率 : $\times 100$



顕微鏡写真③

・屈折率 : 1.690


(クロシドライト用)

・倍率 : $\times 100$

別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法 顕微鏡写真(④, ⑤)

No.YI30060

試料名：無石棉 ケイ酸カルシウム板t6

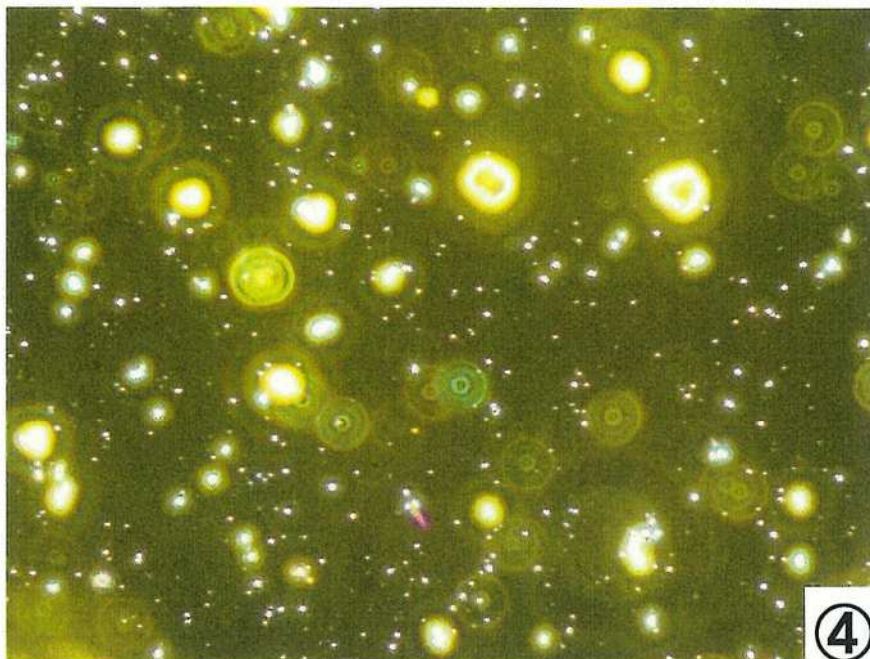


④

顕微鏡写真④

・屈折率：1.618

(アンソフィライト用)

・倍率：×100

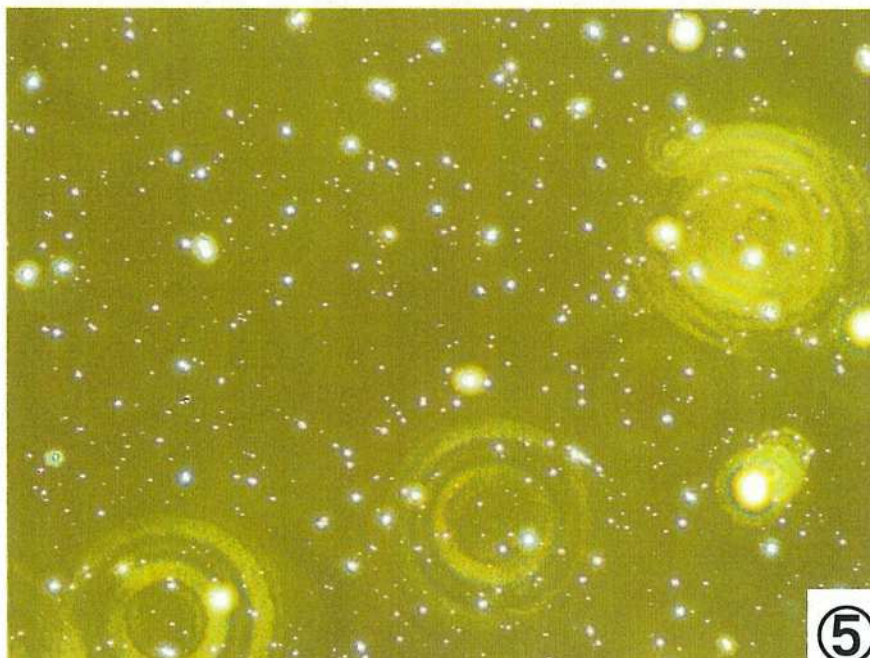

⑤

顕微鏡写真⑤

・屈折率：1.620

(トレモライト/アクチノライト用)

・倍率：×100

表 位相差顕微鏡による分散染色法におけるアスベストの分散色

アスベストの種類	屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$	分散色
クリソタイル	1.550	赤紫色～青色
アモサイト	1.680	桃色
クロシドライト	1.690	桃色
アンソフィライト	1.618	赤紫色
トレモライト/アクチノライト	1.620	赤紫色

位相差顕微鏡による分散染色法により、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストは、4繊維状粒子未満であった。

別紙B. X線回折分析法

表(1) 分析データシート(X線回折)

機 器 の 名 称	X' Pert ³ Powder (PANalytical社製)			
分 析 条 件		定性分析	定量分析	
	Target	Cu	Cu	
	Filter	Ni	Ni	
	Voltage	40	40	KV
	Current	40	40	mA
	ステップサイズ*	0.033	0.033	deg(2 θ)
	スキャンステップ時間	20	240	s
	スキャンの種類	連続	連続	
	発散スリットタイプ*	固定	固定	
	発散スリットサイズ*	0.5	0.5	deg
	試料幅	10.00	10.00	mm
分 析 結 果	別紙結果表(2)及び(3)に示すとおり			
備 考				


表(2) X線回折法によるアスベスト定性分析結果

試料名(種類)	分析対象名	判定
無石綿 ケイ酸カルシウム板t6	クリソタイル	無
	アモサイト	無
	クロシドライト	無
	アンソフィライト	無
	トレモライト/アクチノライト	無
備考		

表(3) X線回折法によるアスベスト定量分析結果


試料名(種類)	分析対象名	含有率
無石綿 ケイ酸カルシウム板t6	クリソタイル	—
	アモサイト	—
	クロシドライト	—
	アンソフィライト	—
	トレモライト/アクチノライト	—
備考		

アスベストのピークは確認されませんでした。

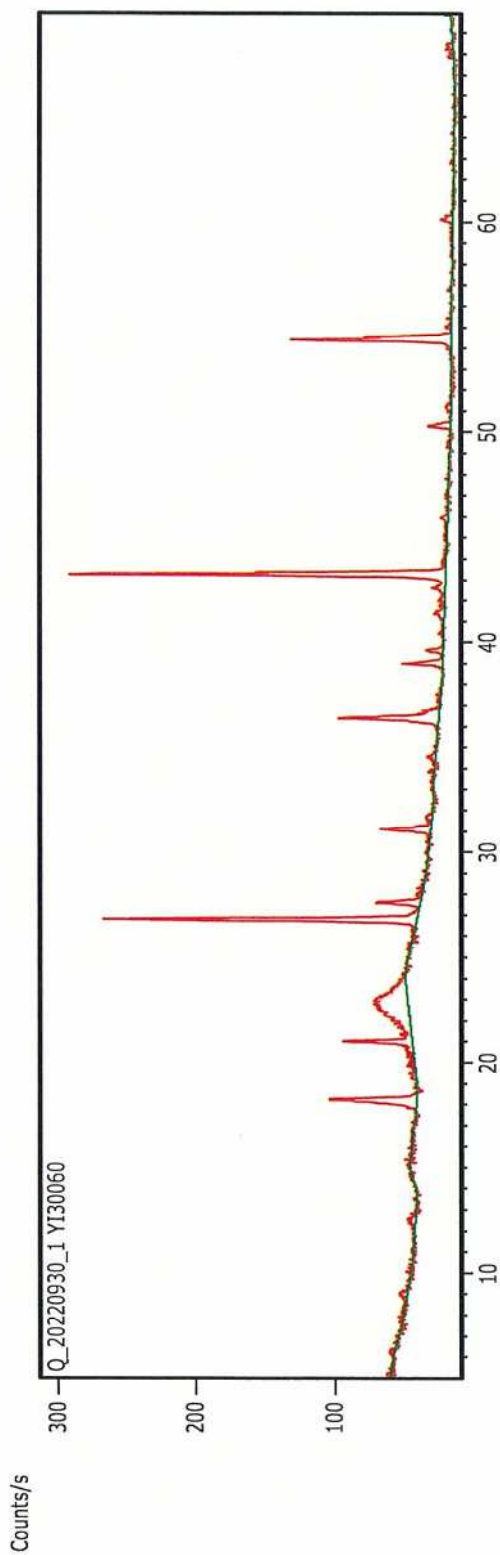

<ピークリスト>

試料名：無石棉 ケイ酸カルシウム板t6

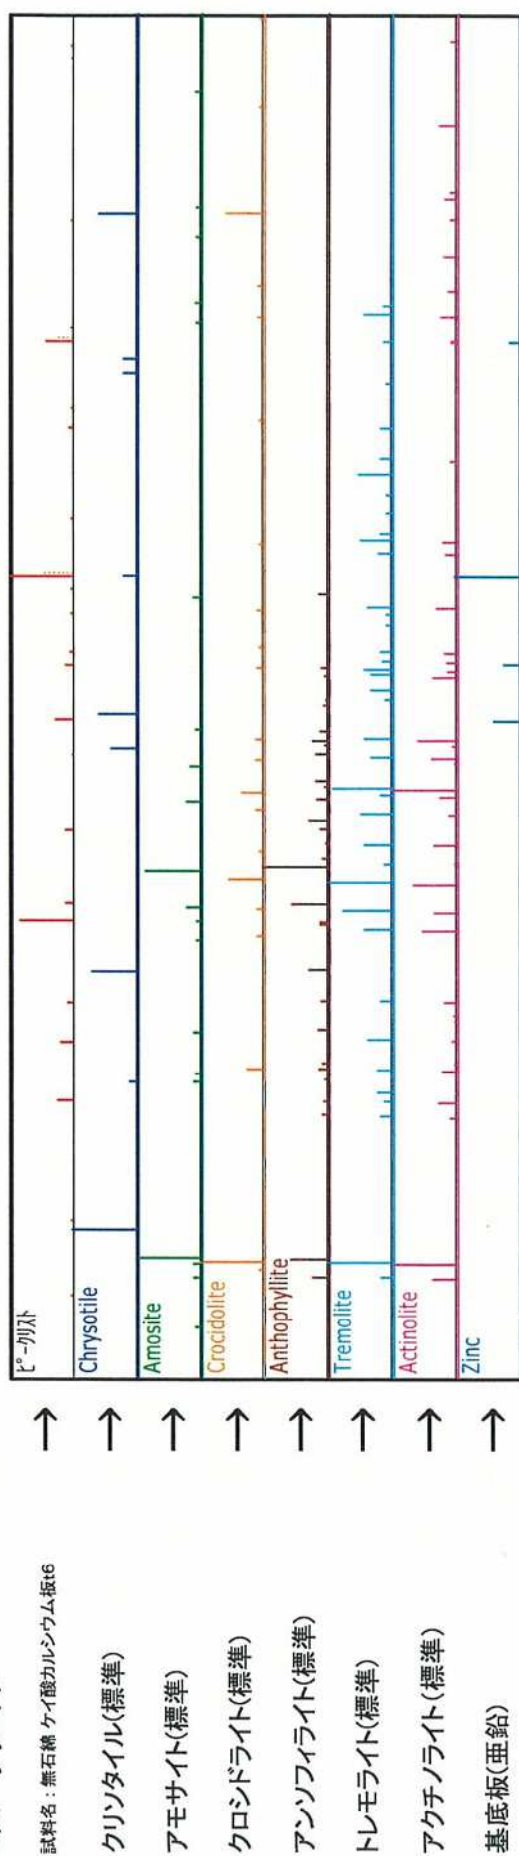

・ ピークリストにより、アスベスト標準のX線回折パターンを比較する。

分析結果報告書

No. YI30061

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県第18号)
栃木県宇都宮市問屋町3-72番地85
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8837
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工 事 名 : 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託
採 取 住 所 : 東京都北区中十条4-16-32
採 取 場 所 : 地下1階 浴室(女) 天井
試 料 名 (種 類) : バスリブ
試 料 採 取 日 : 2022年9月27日
採 取 区 分 : 株式会社 環境公害分析センター

分析実施者

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
バスリブ	アスベスト含有せず

分析方法

方 法 種 類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-2 「試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
---------	---

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
バスリブ	クリソタイル	無	---
	アモサイト	無	---
	クロシドライト	無	---
	アンソフィライト	無	---
	トレモライト/ アクチノライト	無	---

判定基準:0.1%を超えてアスベストを含まないこと

管理番号: 66319

分析内容:試料名(種類): バスリブ


アスベストの種類	ア ス ベ ス ト の 有 無			アスベスト含有率	
	A. 位相差顕微鏡による分散染色法(※1)		B. X線回折分析法による回折線のアスベストピークの有無(※2)		アスベスト含有の有無の判定
クリソタイル	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
アモサイト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
クロシドライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
アンソフィライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
トレモライト/ アクチノライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			

☐ : 選択マーク

※1 別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法参照。

※2 別紙B. X線回折分析法参照。

※3 「4/3000」とは、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストが4繊維状粒子の意味。

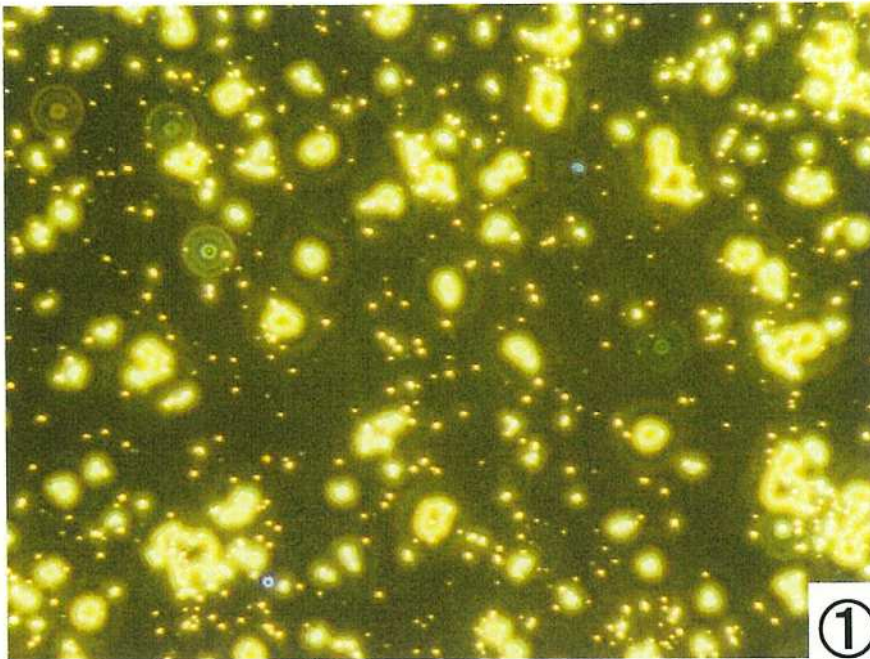


顕微鏡写真①

・屈折率：1.550

(クリソタイル用)

・倍率：×100

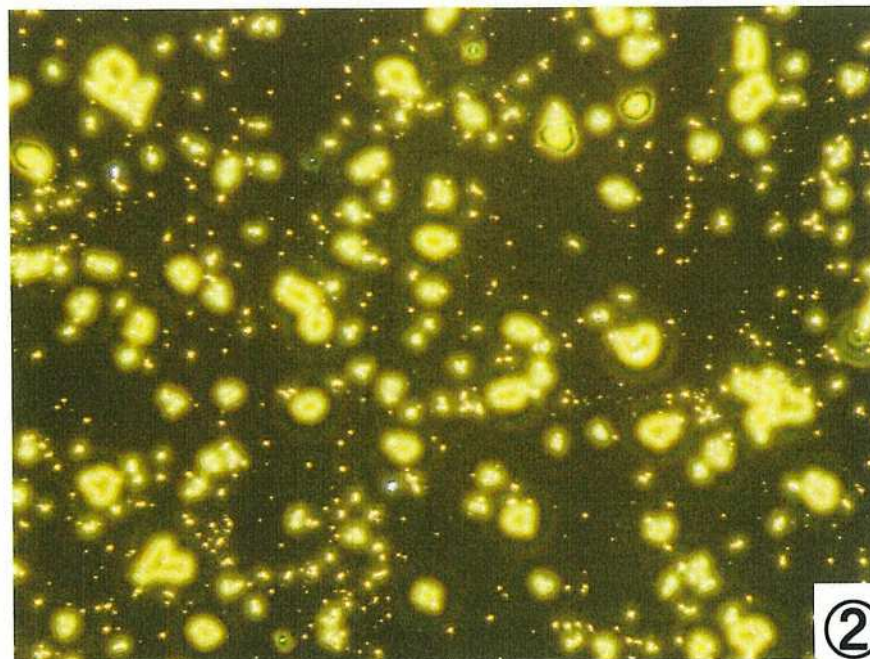


顕微鏡写真②

・屈折率：1.680

(アモサイト用)

・倍率：×100

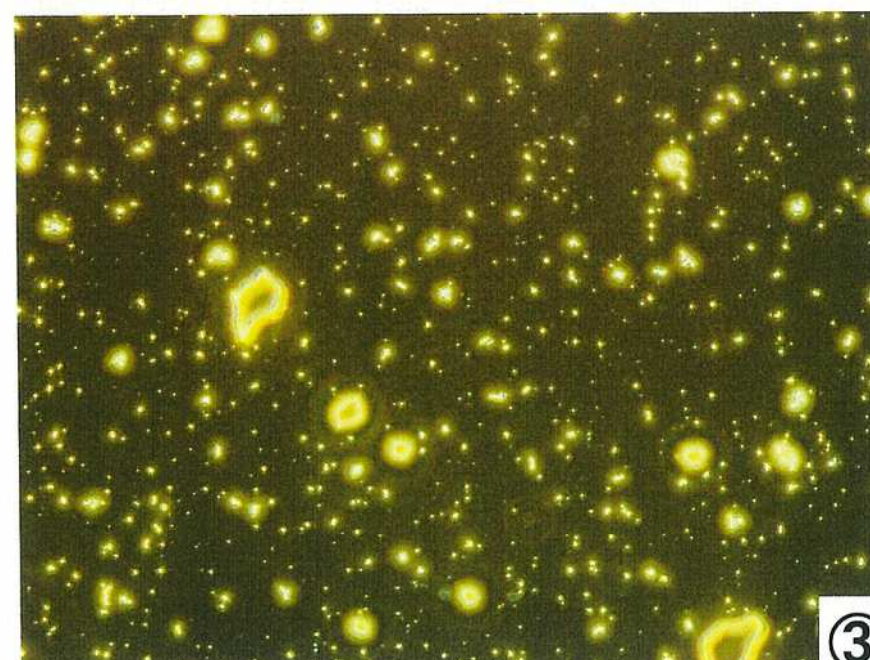


顕微鏡写真③

・屈折率：1.690

(クロシドライト用)

・倍率：×100

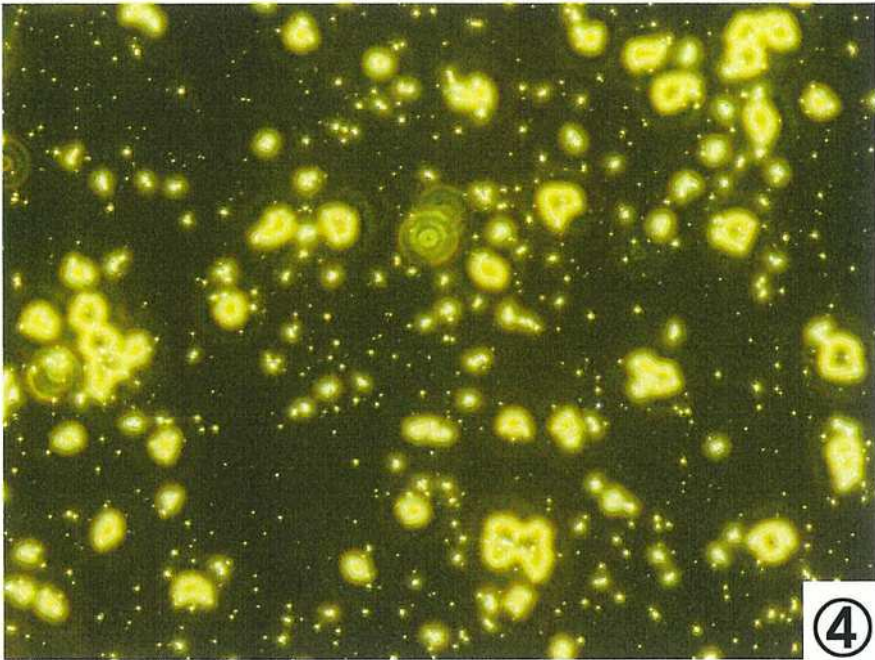


顕微鏡写真④

・屈折率：1.618

(アンソフィライト用)

・倍率：×100

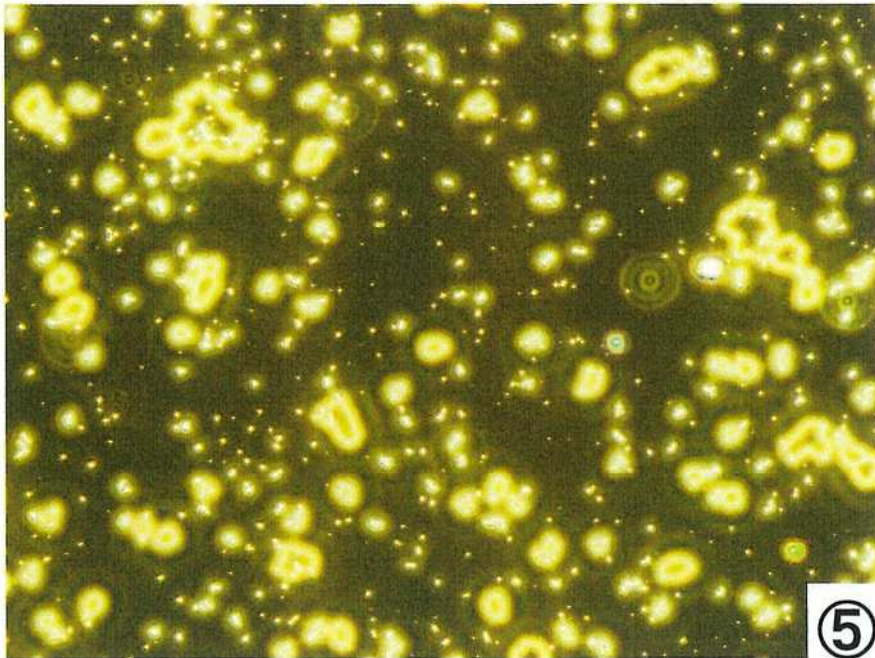

顕微鏡写真⑤

・屈折率：1.620

(トレモライト/アクチノライト用)

・倍率：×100

表 位相差顕微鏡による分散染色法におけるアスベストの分散色

アスベストの種類	屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$	分散色
クリソタイル	1.550	赤紫色～青色
アモサイト	1.680	桃色
クロシドライト	1.690	桃色
アンソフィライト	1.618	赤紫色
トレモライト/アクチノライト	1.620	赤紫色

位相差顕微鏡による分散染色法により、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストは、4繊維状粒子未満であった。

別紙B. X線回折分析法

表(1) 分析データシート(X線回折)

機 器 の 名 称	X'Pert ³ Powder (PANalytical社製)			
分 析 条 件		定性分析	定量分析	
	Target	Cu	Cu	
	Filter	Ni	Ni	
	Voltage	40	40	KV
	Current	40	40	mA
	ステップサイズ*	0.033	0.033	deg(2 θ)
	スキャンステップ時間	20	240	s
	スキャンの種類	連続	連続	
	発散スリットタイプ*	固定	固定	
	発散スリットサイズ*	0.5	0.5	deg
	試料幅	10.00	10.00	mm
分 析 結 果	別紙結果表(2)及び(3)に示すとおり			
備 考				


表(2) X線回折法によるアスベスト定性分析結果

試料名(種類)	分析対象名	判定
バスリブ	クリソタイル	無
	アモサイト	無
	クロシドライト	無
	アンソフィライト	無
	トレモライト/アクチノライト	無
備考		

表(3) X線回折法によるアスベスト定量分析結果

試料名(種類)	分析対象名	含有率
バスリブ	クリソタイル	—
	アモサイト	—
	クロシドライト	—
	アンソフィライト	—
	トレモライト/アクチノライト	—
備考		

アスベストのピークは確認されませんでした。

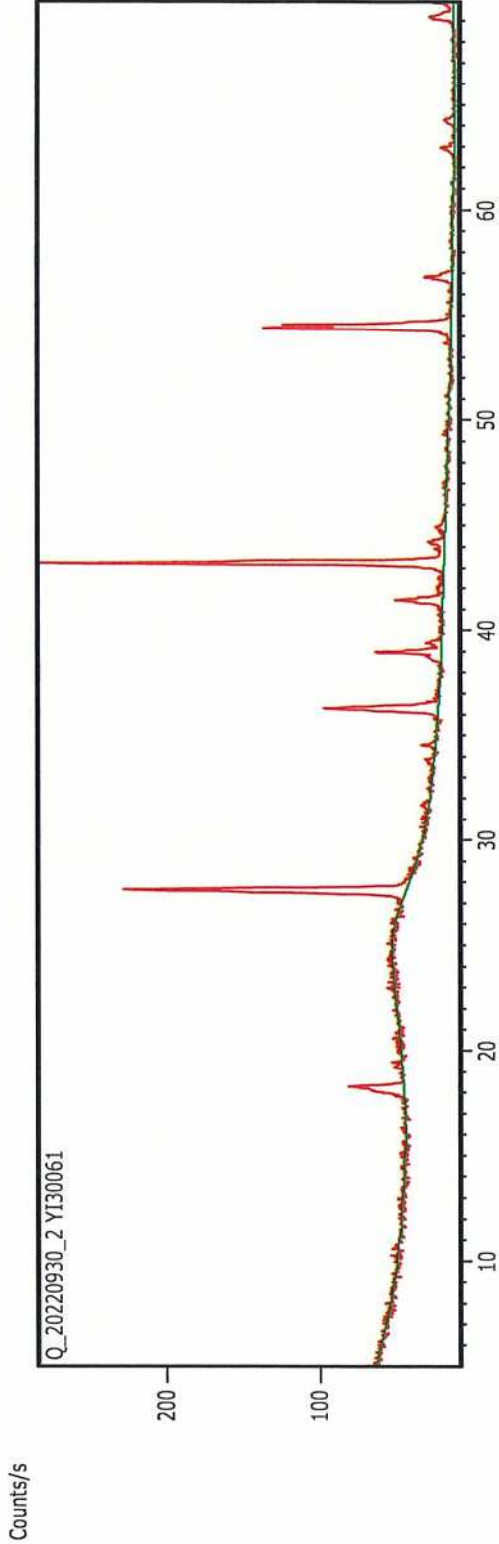

<ピークリスト>

試料名：バスリブ	↑	ピークリスト
クリンタイル(標準)	↑	Chrysotile
アモサイト(標準)	↑	Amosite
クロシドライト(標準)	↑	Crocidolite
アンソファライト(標準)	↑	Anthophyllite
トレモライト(標準)	↑	Tremolite
アクチノライト(標準)	↑	Actinolite
基板板(珪鉛)	↑	Zinc

・ ピークリストにより、アスベスト標準のX線回折パターンを比較する。

分析結果報告書

No. YI30062

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県第18号)
栃木県宇都宮市問屋町3172番地85
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工 事 名	特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託		
採 取 住 所	東京都北区中十条4-16-32		
採 取 場 所	地下1階 会議室 天井		
試 料 名 (種 類)	岩綿吸音板t9		
試 料 採 取 日	2022年9月27日		
採 取 区 分	株式会社 環境公害分析センター	分析実施者	

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
岩綿吸音板t9	アスベスト含有せず

分析方法

方 法 種 類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-2 「試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
---------	---

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
岩綿吸音板t9	クリソタイル	無	---
	アモサイト	無	---
	クロシドライト	無	---
	アンソフィライト	無	---
	トレモライト/ アクチノライト	無	---

判定基準:0.1%を超えてアスベストを含まないこと

管理番号: 66319

分析内容:試料名(種類): 岩綿吸音板t9


アスベストの種類	アスベストの有無			アスベスト含有の有無の判定	アスベスト含有率
	A. 位相差顕微鏡による分散染色法(※1)		B. X線回折分析法による回折線のアスベストピークの有無(※2)		
クリソタイル	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
アモサイト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
クロソドライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
アンソフィライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
トレモライト/ アクチノライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			

○ : 選択マーク

※1 別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法参照。

※2 別紙B. X線回折分析法参照。

※3 「4/3000」とは、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストが4繊維状粒子の意味。

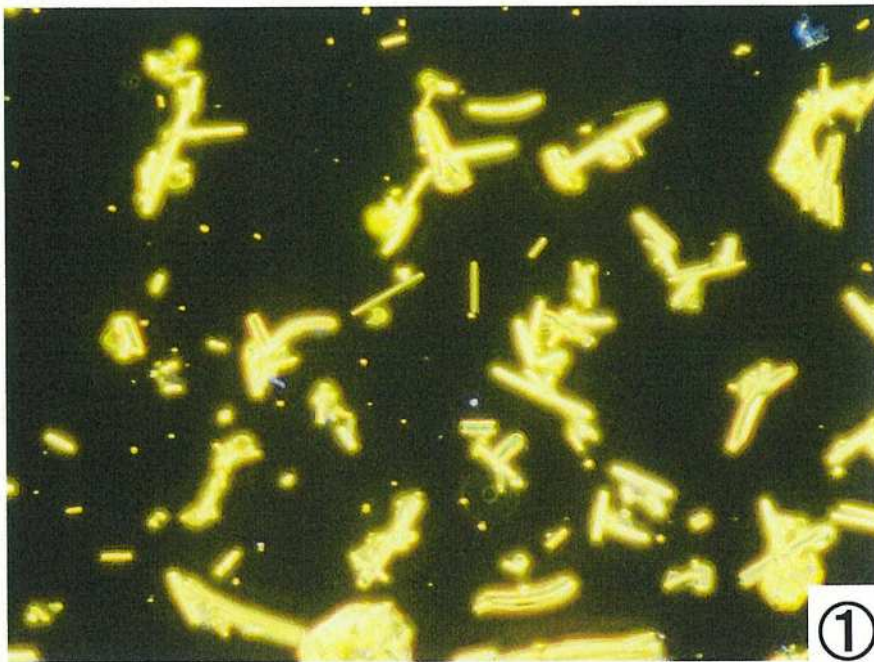


顕微鏡写真①

・屈折率：1.550

(クリソタイル用)

・倍率：×100

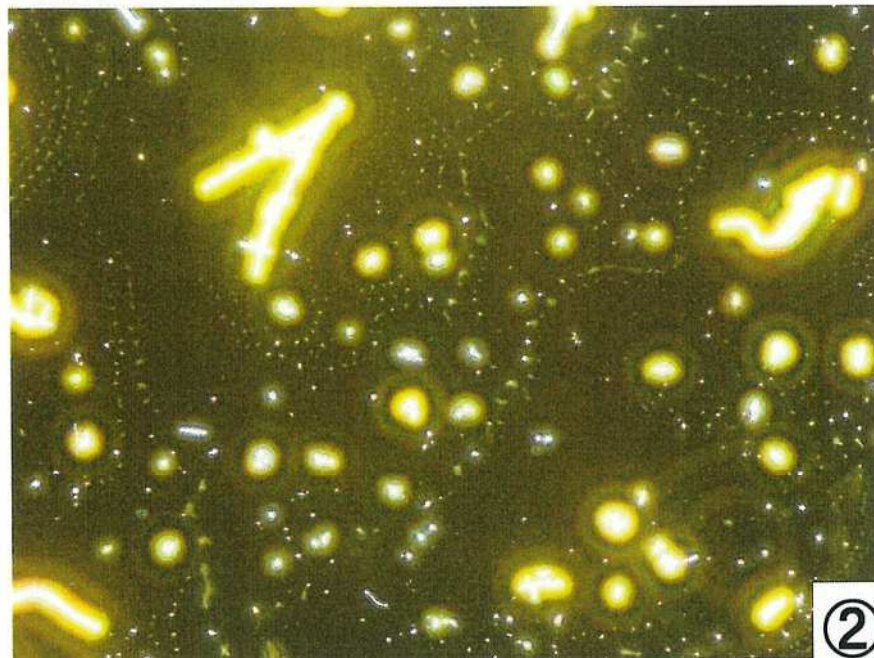


顕微鏡写真②

・屈折率：1.680

(アモサイト用)

・倍率：×100

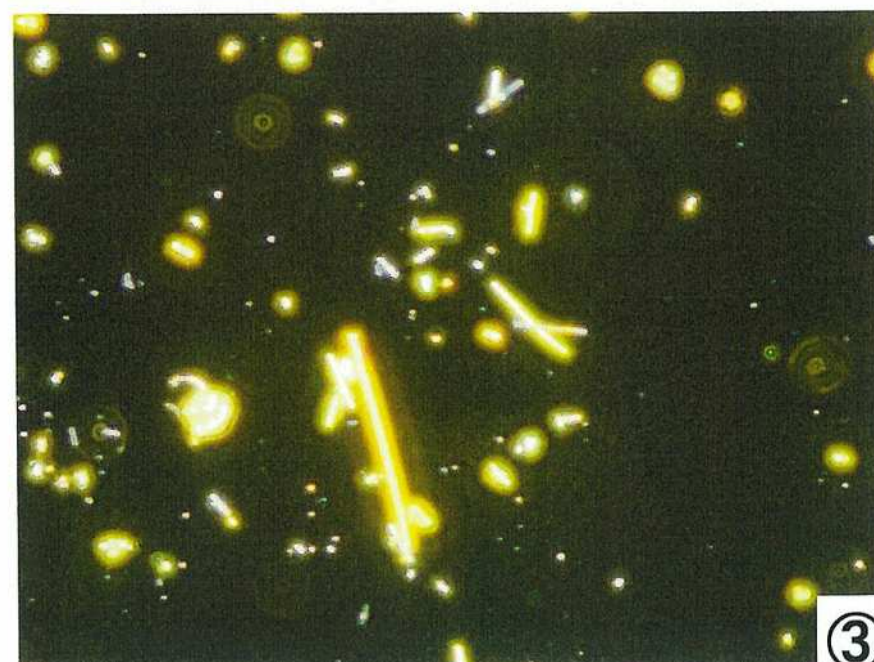


顕微鏡写真③

・屈折率：1.690

(クロシドライト用)

・倍率：×100

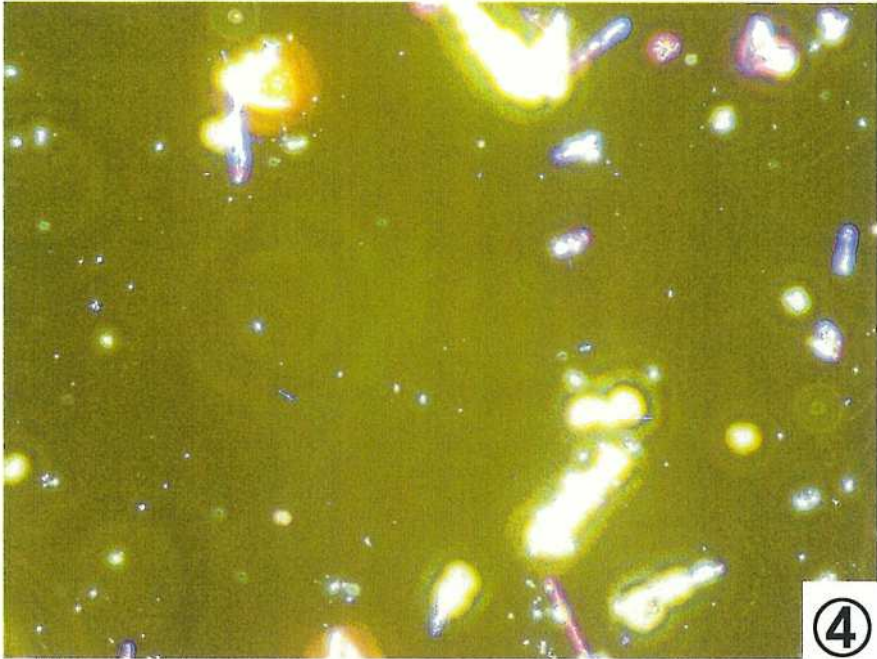


顕微鏡写真④

・屈折率：1.618

(アンソフィライト用)

・倍率：×100

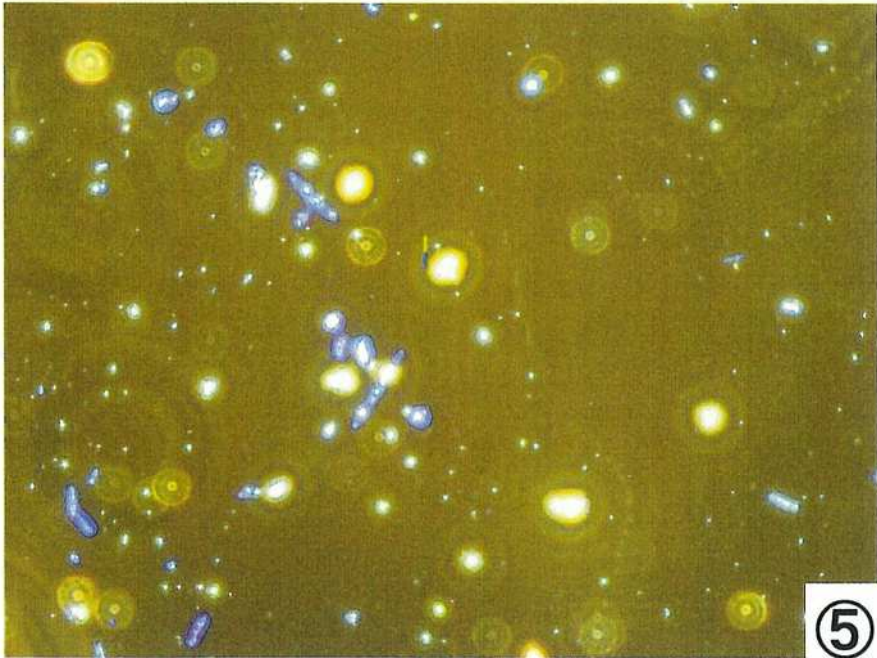

顕微鏡写真⑤

・屈折率：1.620

(トレモライト/アクチノライト用)

・倍率：×100

表 位相差顕微鏡による分散染色法におけるアスベストの分散色

アスベストの種類	屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$	分散色
クリソタイル	1.550	赤紫色～青色
アモサイト	1.680	桃色
クロシドライト	1.690	桃色
アンソフィライト	1.618	赤紫色
トレモライト/アクチノライト	1.620	赤紫色

位相差顕微鏡による分散染色法により、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストは、4繊維状粒子未満であった。

別紙B. X線回折分析法

表(1) 分析データシート(X線回折)

機 器 の 名 称	X' Pert ³ Powder (PANalytical社製)			
分 析 条 件		定性分析	定量分析	
	Target	Cu	Cu	
	Filter	Ni	Ni	
	Voltage	40	40	KV
	Current	40	40	mA
	ステップサイズ*	0.033	0.033	deg(2 θ)
	スキャンステップ時間	20	240	s
	スキャンの種類	連続	連続	
	発散スリットタイプ*	固定	固定	
	発散スリットサイズ*	0.5	0.5	deg
	試料幅	10.00	10.00	mm
分 析 結 果	別紙結果表(2)及び(3)に示すとおり			
備 考				


表(2) X線回折法によるアスベスト定性分析結果

試料名(種類)	分析対象名	判定
岩綿吸音板t9	クリソタイル	無
	アモサイト	無
	クロシドライト	無
	アンソフィライト	無
	トレモライト/アクチノライト	無
備考		

表(3) X線回折法によるアスベスト定量分析結果

試料名(種類)	分析対象名	含有率
岩綿吸音板t9	クリソタイル	—
	アモサイト	—
	クロシドライト	—
	アンソフィライト	—
	トレモライト/アクチノライト	—
備考		

アスベストのピークは確認されませんでした。

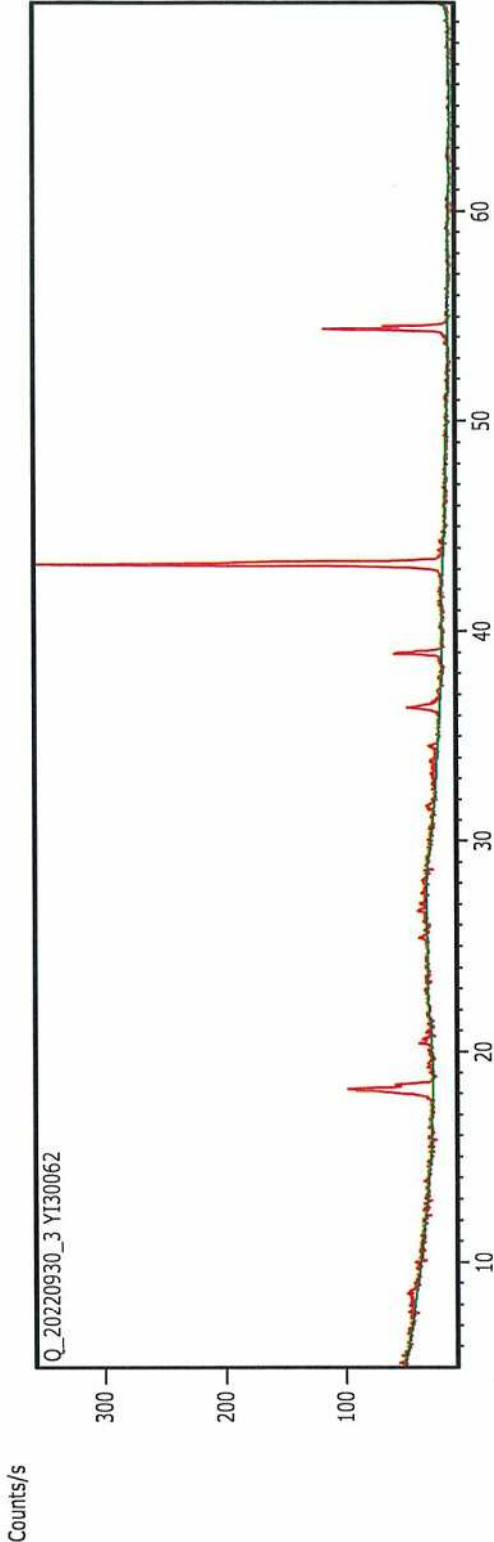

<ピークリスト>

試料名：岩綿吸音板t9	↑	ピーク
クリソタイル(標準)	↑	Chrysotile
アモサイト(標準)	↑	Amosite
クロシドライト(標準)	↑	Crocidolite
アンソファイト(標準)	↑	Anthophyllite
トレモライト(標準)	↑	Tremolite
アクチノライト(標準)	↑	Actinolite
基板(亜鉛)	↑	Zinc

・ ピークリストにより、アスベスト標準のX線回折パターンを比較する。

分析結果報告書

No. YI30063

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県) 第18号
栃木県宇都宮市問屋町3-72番地85
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工 事 名 : 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託
採 取 住 所 : 東京都北区中十条4-16-32
採 取 場 所 : 1階 エントランスホール 壁
試 料 名 (種 類) : 木練付無石綿ケイ酸カルシウム板t4
試 料 採 取 日 : 2022年9月27日
採 取 区 分 : 株式会社 環境公害分析センター | 分析実施者

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
木練付無 石綿ケイ酸カルシウム板t4	アスベスト含有せず

分析方法

方 法 種 類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-2 「試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
---------	---

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
木練付無 石綿ケイ酸カルシウム 板t4	クリソタイル	無	---
	アモサイト	無	---
	クロシドライト	無	---
	アンソフィライト	無	---
	トレモライト/ アクチノライト	無	---

判定基準:0.1%を超えてアスベストを含まないこと

管理番号: 66319

分析内容:試料名(種類): 木練付無 石綿ケイ酸カルシウム板t4


アスベストの種類	ア ス ベ ス ト の 有 無			アスベスト含有の有無の判定	アスベスト含有率
	A. 位相差顕微鏡による分散染色法(※1)		B. X線回折分析法による回折線のアスベストピークの有無(※2)		
クリソタイル	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
アモサイト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
クロソドライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
アンソフィライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
トレモライト/ アクチノライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			

○ : 選択マーク

※1 別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法参照。

※2 別紙B. X線回折分析法参照。

※3 「4/3000」とは、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストが4繊維状粒子の意味。

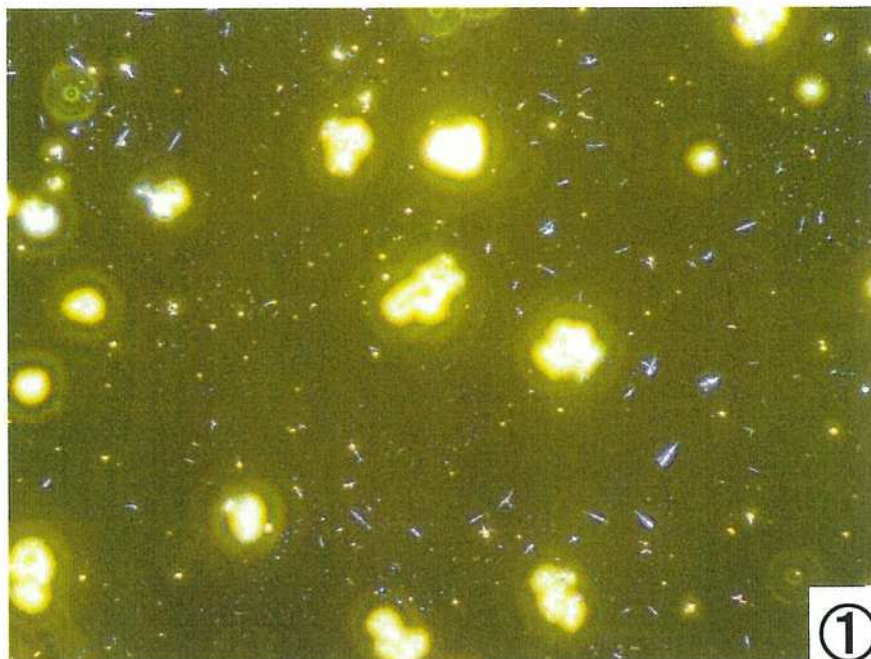


顕微鏡写真①

・屈折率：1.550

(クリソタイル用)

・倍率：×100

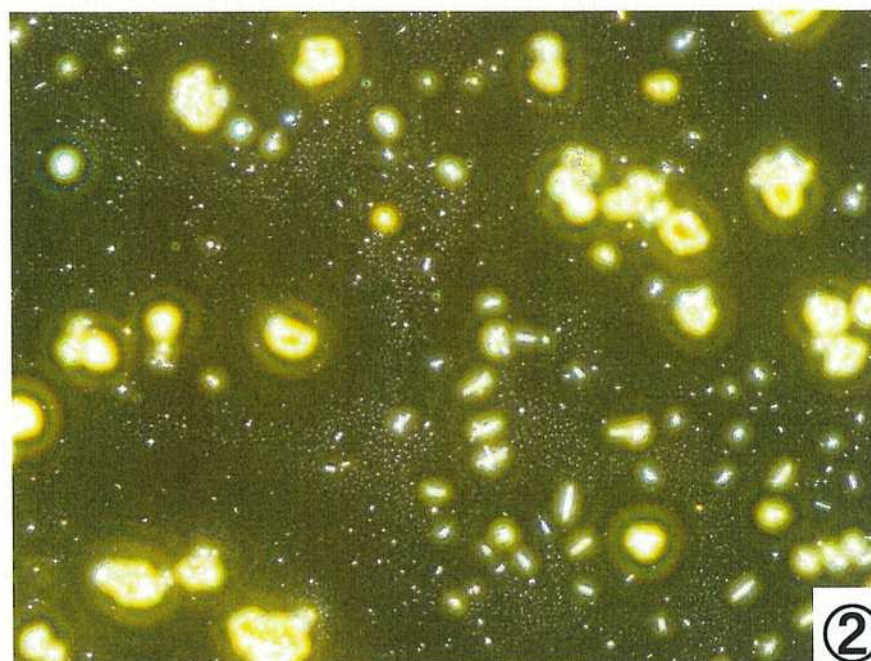

顕微鏡写真②

・屈折率：1.680

(アモサイト用)

・倍率：×100




顕微鏡写真③

・屈折率：1.690

(クロシドライト用)

・倍率：×100

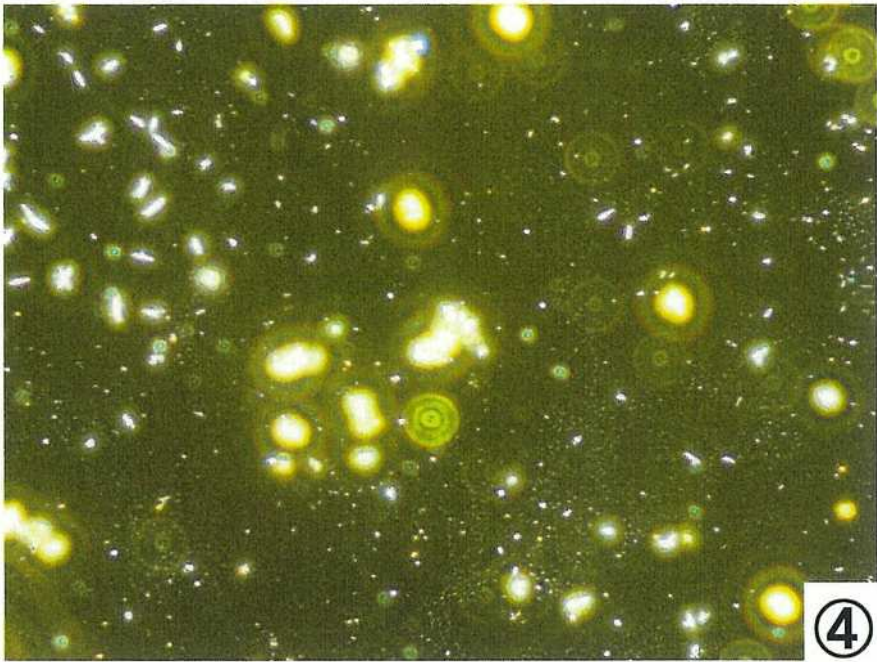


顕微鏡写真④

・屈折率：1.618

(アンソフィライト用)

・倍率：×100

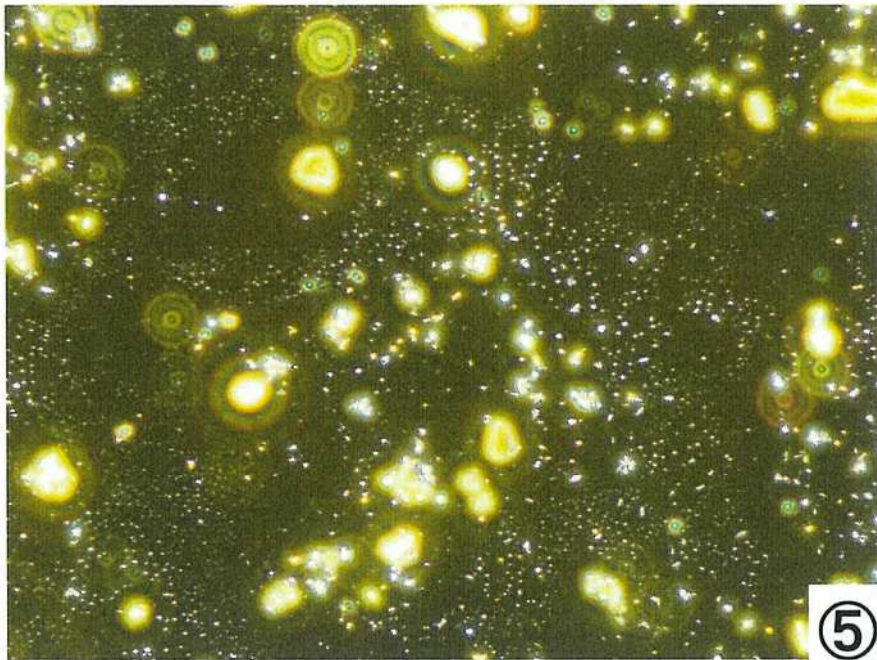

顕微鏡写真⑤

・屈折率：1.620

(トレモライト/アクチノライト用)

・倍率：×100

表 位相差顕微鏡による分散染色法におけるアスベストの分散色

アスベストの種類	屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$	分散色
クリソタイル	1.550	赤紫色～青色
アモサイト	1.680	桃色
クロシドライト	1.690	桃色
アンソフィライト	1.618	赤紫色
トレモライト/アクチノライト	1.620	赤紫色

位相差顕微鏡による分散染色法により、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストは、4繊維状粒子未満であった。

別紙B. X線回折分析法

表(1) 分析データシート(X線回折)

機 器 の 名 称	X' Pert ³ Powder (PANalytical社製)			
分 析 条 件		定性分析	定量分析	
	Target	Cu	Cu	
	Filter	Ni	Ni	
	Voltage	40	40	KV
	Current	40	40	mA
	ステップサイズ*	0.033	0.033	deg(2 θ)
	スキャンステップ時間	20	240	s
	スキャンの種類	連続	連続	
	発散スリットタイプ*	固定	固定	
	発散スリットサイズ*	0.5	0.5	deg
	試料幅	10.00	10.00	mm
分 析 結 果	別紙結果表(2)及び(3)に示すとおり			
備 考				


表(2) X線回折法によるアスベスト定性分析結果

試料名(種類)	分析対象名	判定
木練付無 石綿ケイ酸カルシウム板t4	クリソタイル	無
	アモサイト	無
	クロシドライト	無
	アンソフィライト	無
	トレモライト/アクチノライト	無
備考		

表(3) X線回折法によるアスベスト定量分析結果

試料名(種類)	分析対象名	含有率
木練付無 石綿ケイ酸カルシウム板t4	クリソタイル	—
	アモサイト	—
	クロシドライト	—
	アンソフィライト	—
	トレモライト/アクチノライト	—
備考		

アスベストのピークは確認されませんでした。

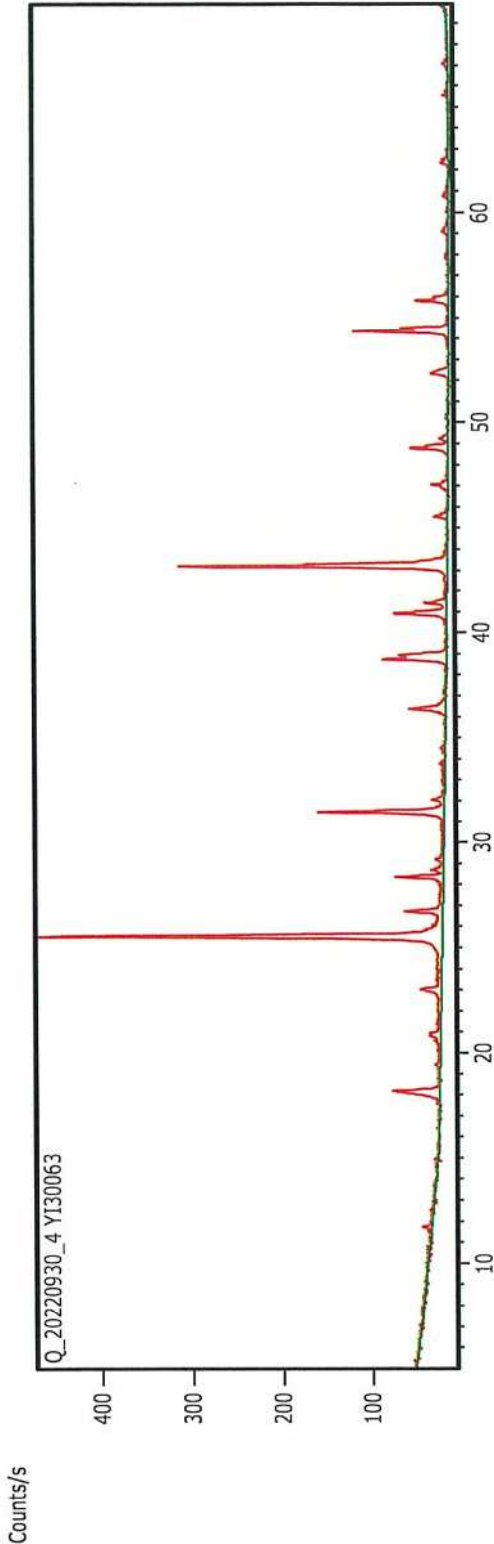

<ピークリスト>

試料名：木練付無 石綿ケイ酸カルシウム板t4	↑	2θ-グリッド
クリソタイル(標準)	↑	Chrysotile
アモサイト(標準)	↑	Amosite
クロシドライト(標準)	↑	Crocidolite
アンソファイト(標準)	↑	Anthophyllite
トレモライト(標準)	↑	Tremolite
アクチノライト(標準)	↑	Actinolite
基板板(亜鉛)	↑	Zinc

・ ピークリストにより、アスベスト標準のX線回折パターンを比較する。

分析結果報告書

No. NS114031-01Z-1-003

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県第9-18号)
栃木県宇都宮市問屋町3172番地85
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8837
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工 事 名 : 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託
採 取 住 所 : 東京都北区中十条4-16-32
採 取 場 所 : 1階 痴呆性デイホーム 床
試 料 名 (種 類) : 長尺リノリウム
試 料 採 取 日 : 2022年9月27日
採 取 区 分 : 株式会社 環境公害分析センター 分析実施者

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
長尺リノリウム	アスベスト含有せず

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
長尺リノリウム	クリソタイル	無	---
	アモサイト	無	---
	クロシドライト	無	---
	アンソフィライト	無	---
	トレモライト	無	---
	アクチノライト	無	---

判定基準:0.1%を超えてアスベストを含まないこと

層別推定含有率

層	外観色	層割合(%)	アスベスト種類	アスベスト推定含有率
1(表層側)	灰	90	---	不検出
2	ベージュ	5	---	不検出
3	ライトグレー	5	---	不検出
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました
※複数の層が見られた場合は、表層側から内側へ1層、2層と表しています

分析方法


方 法 種 類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-1 「市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法」
---------	---

管理番号: 66319

偏光顕微鏡写真

試料名： 長尺リノリウム

伸長の符号



不検出

分析結果報告書

No. NS114031-01Z-1-004

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県第18号)
栃木県宇都宮市問屋町3172番地85
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工事名 : 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託
採取住所 : 東京都北区中十条4-16-32
採取場所 : 階段室 西側 壁
試料名(種類) : 多彩吹き付け
試料採取日 : 2022年9月27日
採取区分 : 株式会社 環境公害分析センター

分析実施者

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
多彩吹き付け	アスベスト含有

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
多彩吹き付け	クリソタイル	有	----
	アモサイト	無	----
	クロシドライト	無	----
	アンソフィライト	無	----
	トレモライト	無	----
	アクチノライト	無	----

判定基準:0.1%を超えてアスベストを含まないこと

層別推定含有率

層	外観色	層割合(%)	アスベスト種類	アスベスト推定含有率
1(表層側)	乳白色	10	---	不検出
2	灰	40	クリソタイル	0.1%-5%
3	ライトグレー	50	---	不検出
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました
※複数の層が見られた場合は、表層側から内側へ1層、2層と表しています

分析方法


方法種類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-1 「市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法」
------	---

管理番号: 66319

偏光顕微鏡写真


試料名： 多彩吹き付け

伸長の符号



正の符号

分散色



屈折率1.550 青(⊥)
クリソタイル検出

分析結果報告書

No. YI30064

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県第18号)
栃木県宇都宮市問屋町3172番地85
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工 事 名 : 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託
採 取 住 所 : 東京都北区中十条4-16-32
採 取 場 所 : 地下1階 機械室 配管
試 料 名 (種 類) : 保温材
試 料 採 取 日 : 2022年9月27日
採 取 区 分 : 株式会社 環境公害分析センター

分析実施者

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
保温材	アスベスト含有せず

分析方法

方 法 種 類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-2 「試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
---------	---

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
保温材	クリソタイル	無	---
	アモサイト	無	---
	クロシドライト	無	---
	アンソフィライト	無	---
	トレモライト/ アクチノライト	無	---

判定基準:0.1%を超えてアスベストを含まないこと

管理番号: 66319

分析内容:試料名(種類): 保温材


アスベストの種類	アスベストの有無			アスベスト含有率
	A. 位相差顕微鏡による分散染色法(※1)	B. X線回折分析法による回折線のアスベストピークの有無(※2)	アスベスト含有の有無の判定	
クリソタイル	1 4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	② 上記未満			
アモサイト	1 4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	② 上記未満			
クロシドライト	1 4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	② 上記未満			
アンソフィライト	1 4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	② 上記未満			
トレモライト/ アクチノライト	1 4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	② 上記未満			

○ : 選択マーク

※1 別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法参照。

※2 別紙B. X線回折分析法参照。

※3 「4/3000」とは、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストが4繊維状粒子の意味。

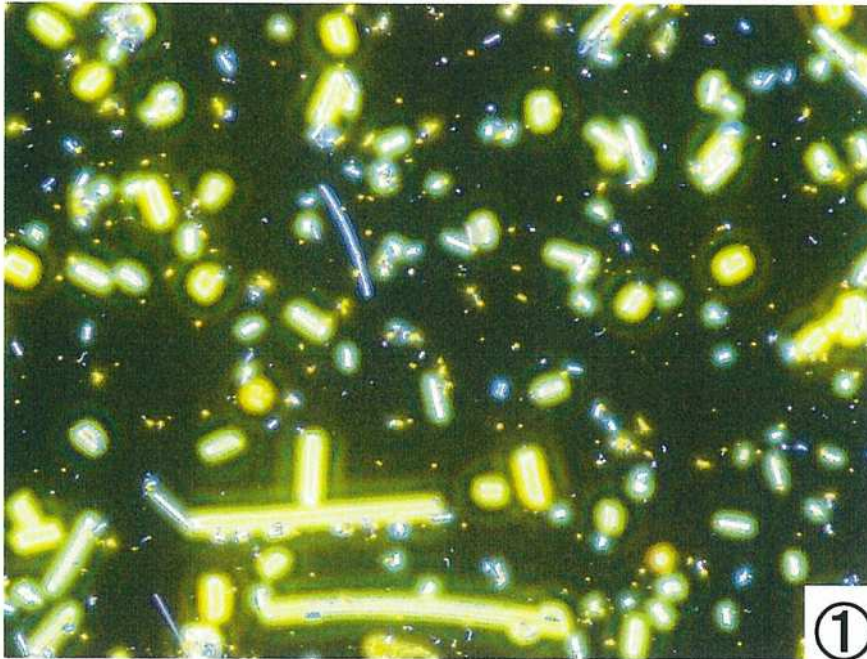


顕微鏡写真①

・屈折率 : 1.550

(クリソタイル用)

・倍率 : $\times 100$

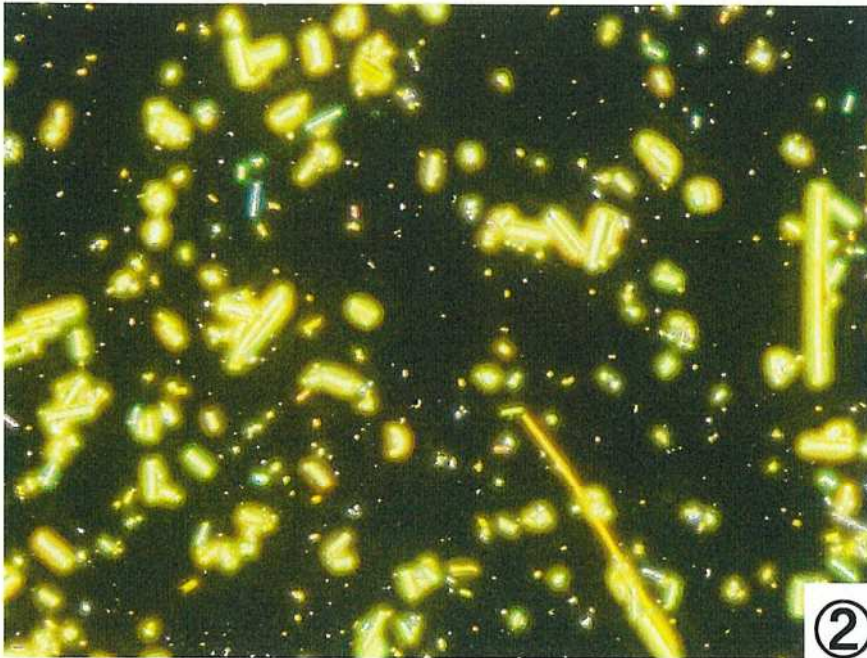


顕微鏡写真②

・屈折率 : 1.680

(アモサイト用)

・倍率 : $\times 100$

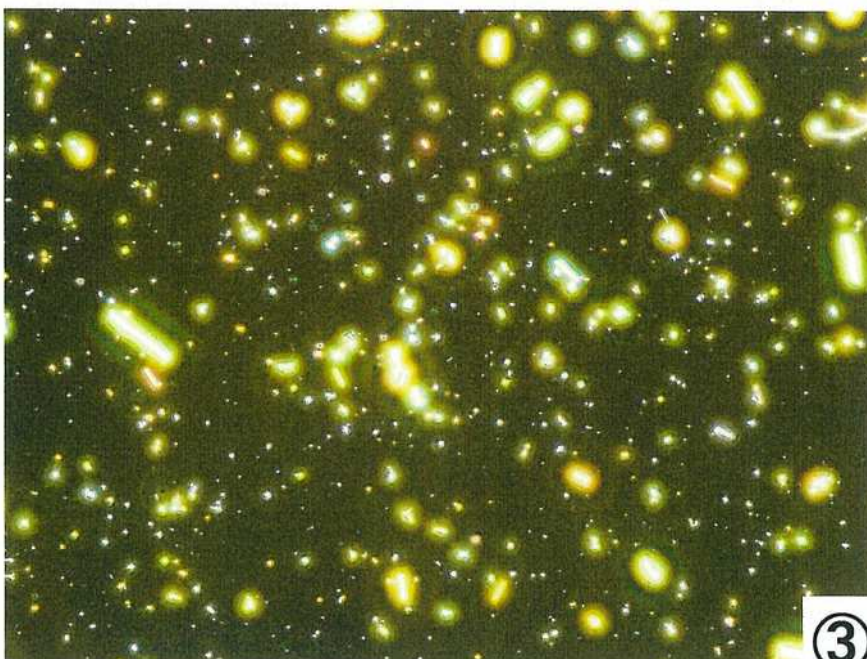

顕微鏡写真③

・屈折率 : 1.690


(クロシドライト用)

・倍率 : $\times 100$

別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法 顕微鏡写真(④, ⑤)

No.YI30064

試料名：保温材

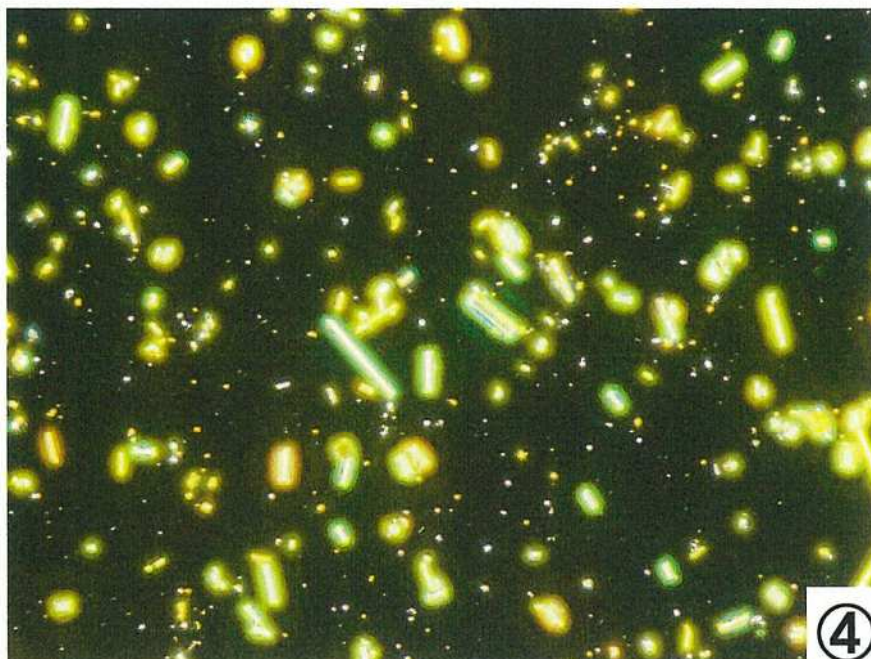


顕微鏡写真④

・屈折率：1.618

(アンソフィライト用)

・倍率：×100

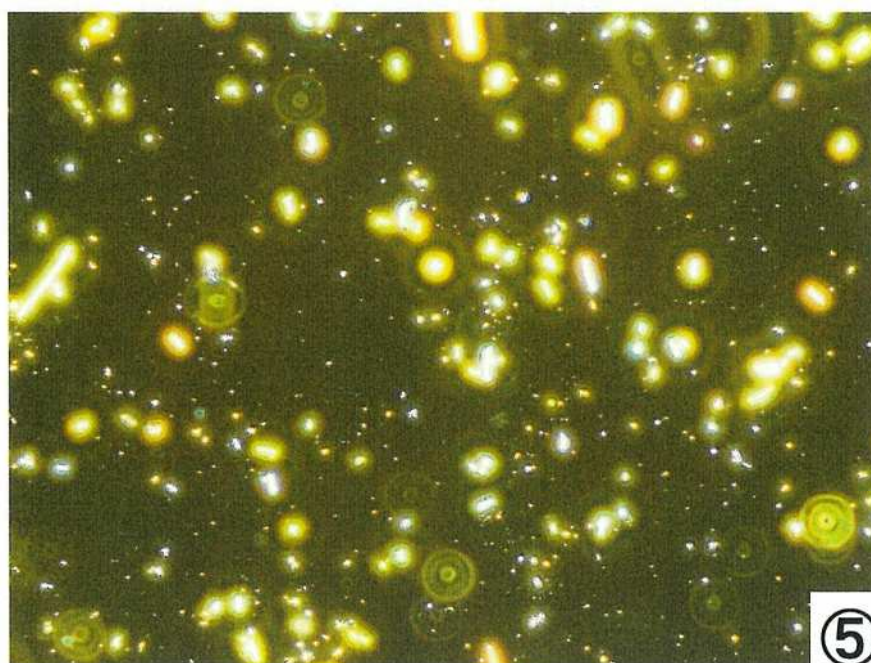

顕微鏡写真⑤

・屈折率：1.620

(トレモライト/アクチノライト用)

・倍率：×100

表 位相差顕微鏡による分散染色法におけるアスベストの分散色

アスベストの種類	屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$	分散色
クリソタイル	1.550	赤紫色～青色
アモサイト	1.680	桃色
クロシドライト	1.690	桃色
アンソフィライト	1.618	赤紫色
トレモライト/アクチノライト	1.620	赤紫色

位相差顕微鏡による分散染色法により、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストは、4繊維状粒子未満であった。

別紙B. X線回折分析法

表(1) 分析データシート(X線回折)

機 器 の 名 称	X' Pert ³ Powder (PANalytical社製)			
分 析 条 件		定性分析	定量分析	
	Target	Cu	Cu	
	Filter	Ni	Ni	
	Voltage	40	40	KV
	Current	40	40	mA
	ステップサイズ*	0.033	0.033	deg(2 θ)
	スキャンステップ時間	20	240	s
	スキャンの種類	連続	連続	
	発散スリットタイプ*	固定	固定	
	発散スリットサイズ*	0.5	0.5	deg
	試料幅	10.00	10.00	mm
分 析 結 果	別紙結果表(2)及び(3)に示すとおり			
備 考				


表(2) X線回折法によるアスベスト定性分析結果

試 料 名 (種 類)	分 析 対 象 名	判 定
保温材	クリソタイル	無
	アモサイト	無
	クロシドライト	無
	アンソフィライト	無
	トレモライト/アクチノライト	無
備 考		

表(3) X線回折法によるアスベスト定量分析結果

試 料 名 (種 類)	分 析 対 象 名	含 有 率
保温材	クリソタイル	—
	アモサイト	—
	クロシドライト	—
	アンソフィライト	—
	トレモライト/アクチノライト	—
備 考		

アスベストのピークは確認されませんでした。

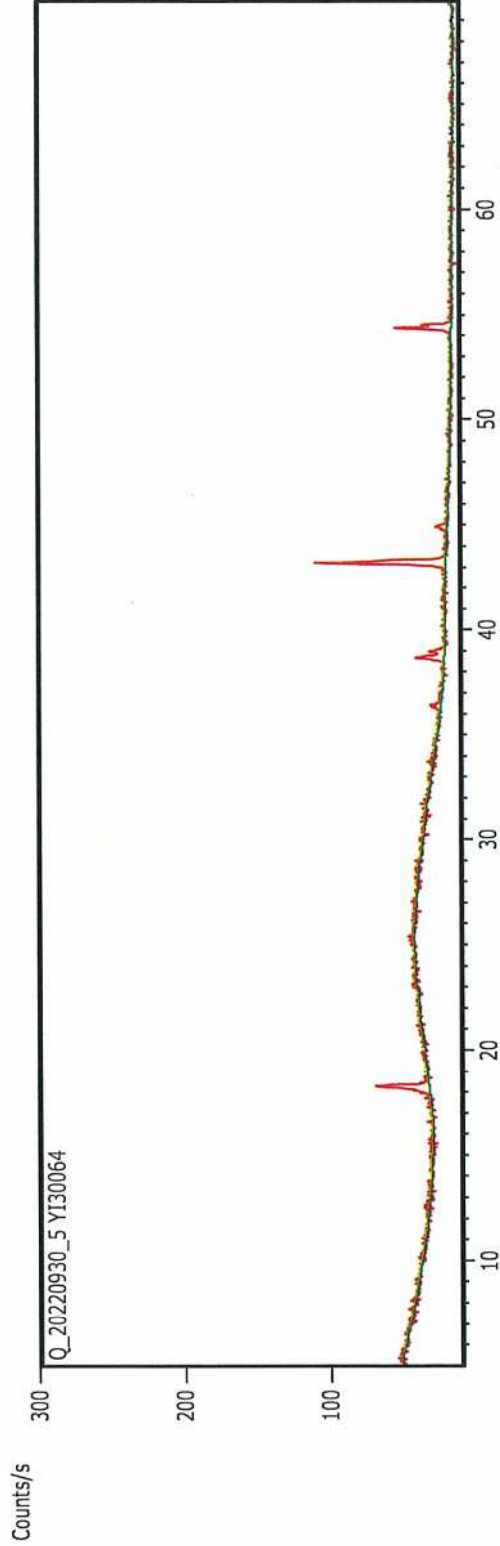

<ピークリスト>

↑	ピークリスト	
↑	試料名：保温材	
↑	クリンタイル(標準)	
↑	アモサイト(標準)	
↑	クロシドライト(標準)	
↑	アンソファイト(標準)	
↑	トレモライト(標準)	
↑	アクチノライト(標準)	
↑	基底板(亜鉛)	

・ ピークリストにより、アスベスト標準のX線回折パターンを比較する。

分析結果報告書

No. YI30065

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県 39-18号)
栃木県宇都宮市問屋町3172番地85
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工 事 名 : 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託
採 取 住 所 : 東京都北区中十条4-16-32
採 取 場 所 : 地下1階 機械室 ダクト
試 料 名 (種 類) : フランジパッキン
試 料 採 取 日 : 2022年9月27日
採 取 区 分 : 株式会社 環境公害分析センター 分析実施者

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
フランジパッキン	アスベスト含有せず

分析方法

方 法 種 類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-2 「試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
---------	---

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
フランジパッキン	クリソタイル	無	----
	アモサイト	無	----
	クロシドライト	無	----
	アンソフィライト	無	----
	トレモライト/ アクチノライト	無	----

判定基準:0.1%を超えてアスベストを含まないこと

管理番号: 66319

分析内容:試料名(種類): フランジパッキン


アスベストの種類	ア ス ベ ス ト の 有 無			アスベスト含有率	
	A. 位相差顕微鏡による分散染色法(※1)		B. X線回折分析法による回折線のアスベストピークの有無(※2)		
クリソタイル	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
アモサイト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
クロシドライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
アンソフィライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
トレモライト/ アクチノライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			

☐ : 選択マーク

※1 別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法参照。

※2 別紙B. X線回折分析法参照。

※3 「4/3000」とは、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストが4繊維状粒子の意味。

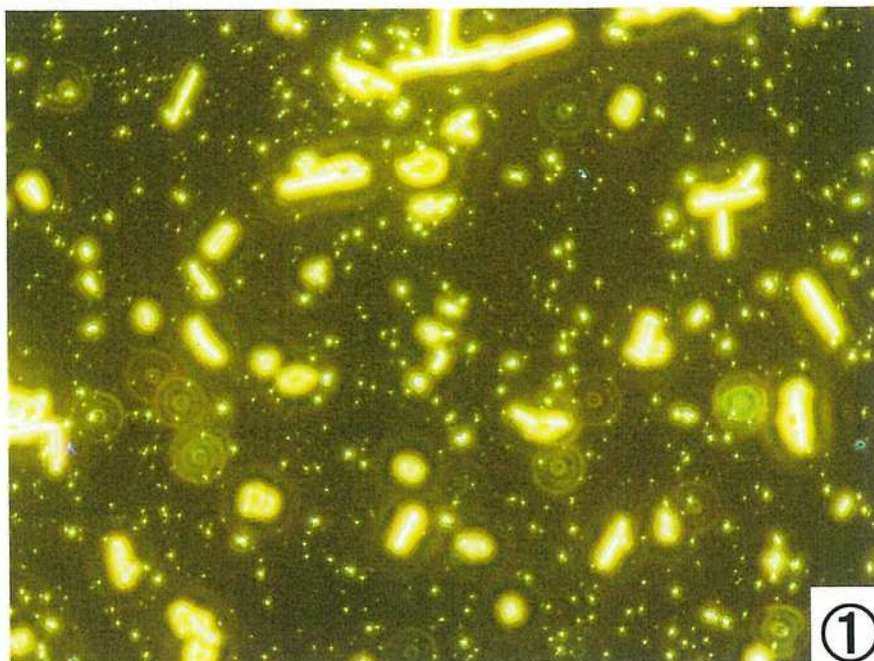


顕微鏡写真①

・屈折率：1.550

(クリソタイル用)

・倍率：×100

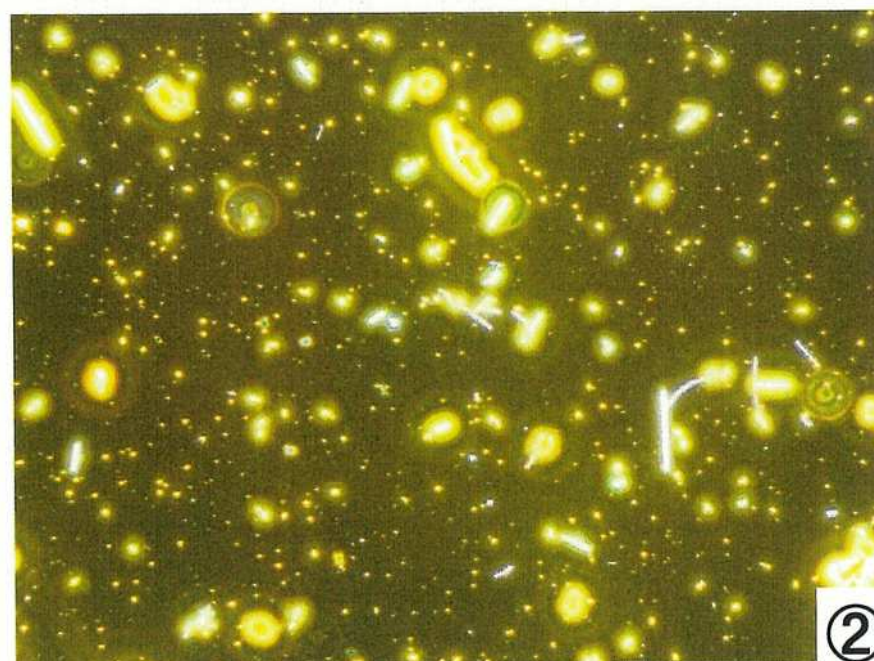


顕微鏡写真②

・屈折率：1.680

(アモサイト用)

・倍率：×100

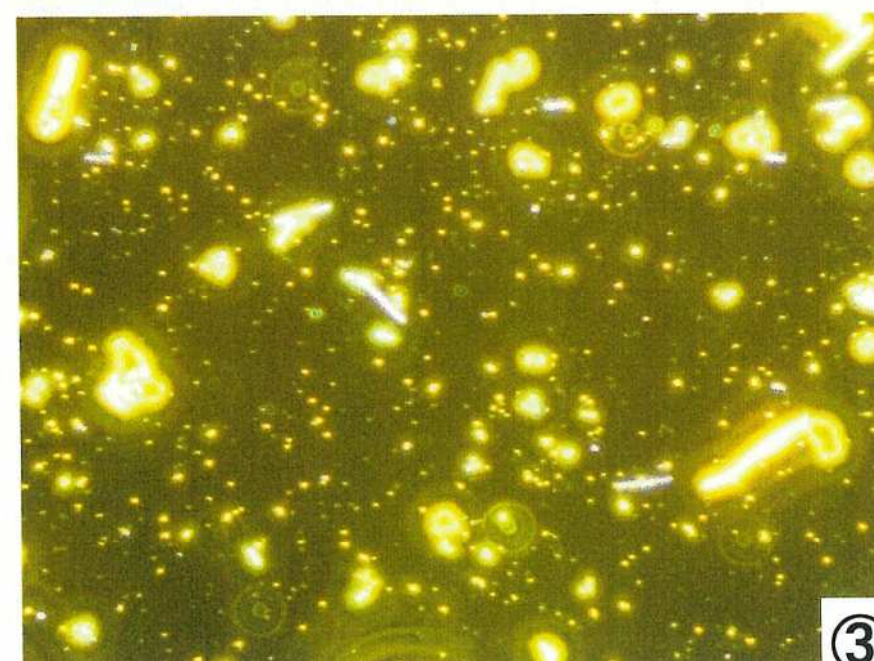


顕微鏡写真③

・屈折率：1.690

(クロシドライト用)

・倍率：×100

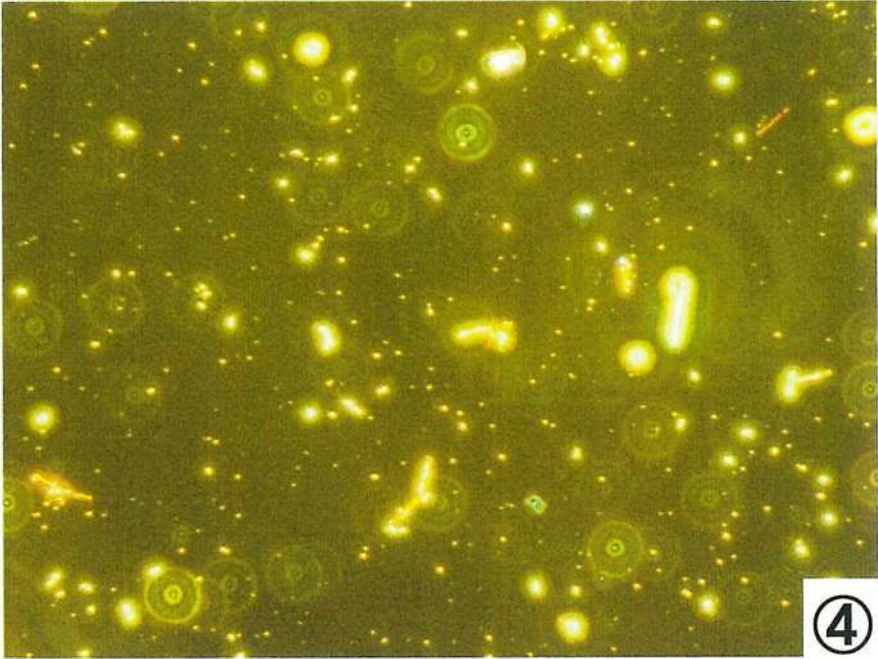


④

顕微鏡写真④

・屈折率：1.618

(アンソフィライト用)

・倍率：×100

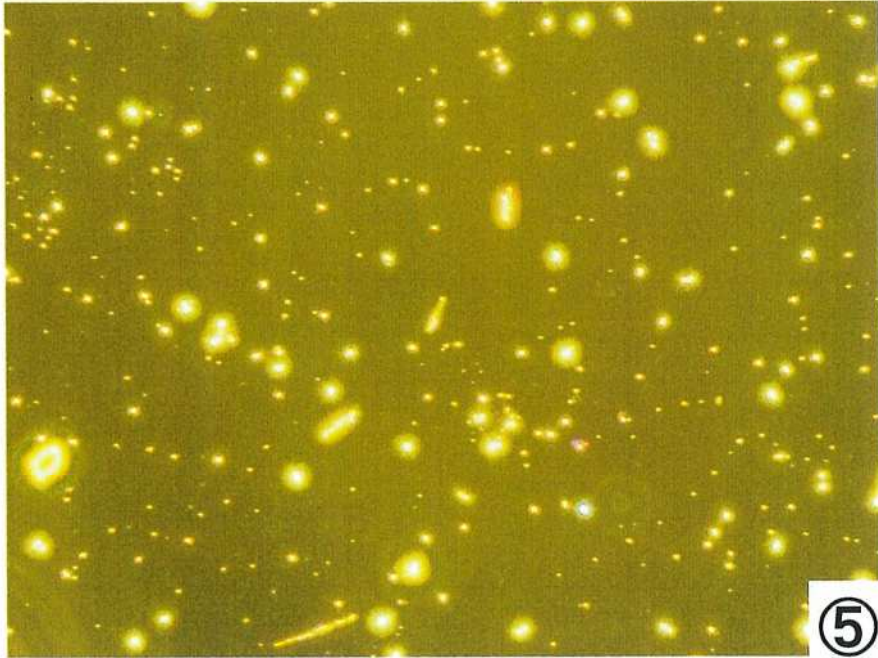

⑤

顕微鏡写真⑤

・屈折率：1.620

(トレモライト/アクチノライト用)

・倍率：×100

表 位相差顕微鏡による分散染色法におけるアスベストの分散色

アスベストの種類	屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$	分散色
クリソタイル	1.550	赤紫色～青色
アモサイト	1.680	桃色
クロシドライト	1.690	桃色
アンソフィライト	1.618	赤紫色
トレモライト/アクチノライト	1.620	赤紫色

位相差顕微鏡による分散染色法により、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストは、4繊維状粒子未満であった。

別紙B. X線回折分析法

表(1) 分析データシート(X線回折)

機 器 の 名 称	X' Pert ³ Powder (PANalytical社製)			
分 析 条 件		定性分析	定量分析	
	Target	Cu	Cu	
	Filter	Ni	Ni	
	Voltage	40	40	KV
	Current	40	40	mA
	ステップサイズ*	0.033	0.033	deg(2 θ)
	スキャンステップ時間	20	240	s
	スキャンの種類	連続	連続	
	発散スリットタイプ*	固定	固定	
	発散スリットサイズ*	0.5	0.5	deg
	試料幅	10.00	10.00	mm
分 析 結 果	別紙結果表(2)及び(3)に示すとおり			
備 考				


表(2) X線回折法によるアスベスト定性分析結果

試 料 名 (種 類)	分 析 対 象 名	判 定
フランジパッキン	クリソタイル	無
	アモサイト	無
	クロシドライト	無
	アンソフィライト	無
	トレモライト/アクチノライト	無
備 考		

表(3) X線回折法によるアスベスト定量分析結果

試 料 名 (種 類)	分 析 対 象 名	含 有 率
フランジパッキン	クリソタイル	—
	アモサイト	—
	クロシドライト	—
	アンソフィライト	—
	トレモライト/アクチノライト	—
備 考		

アスベストのピークは確認されませんでした。

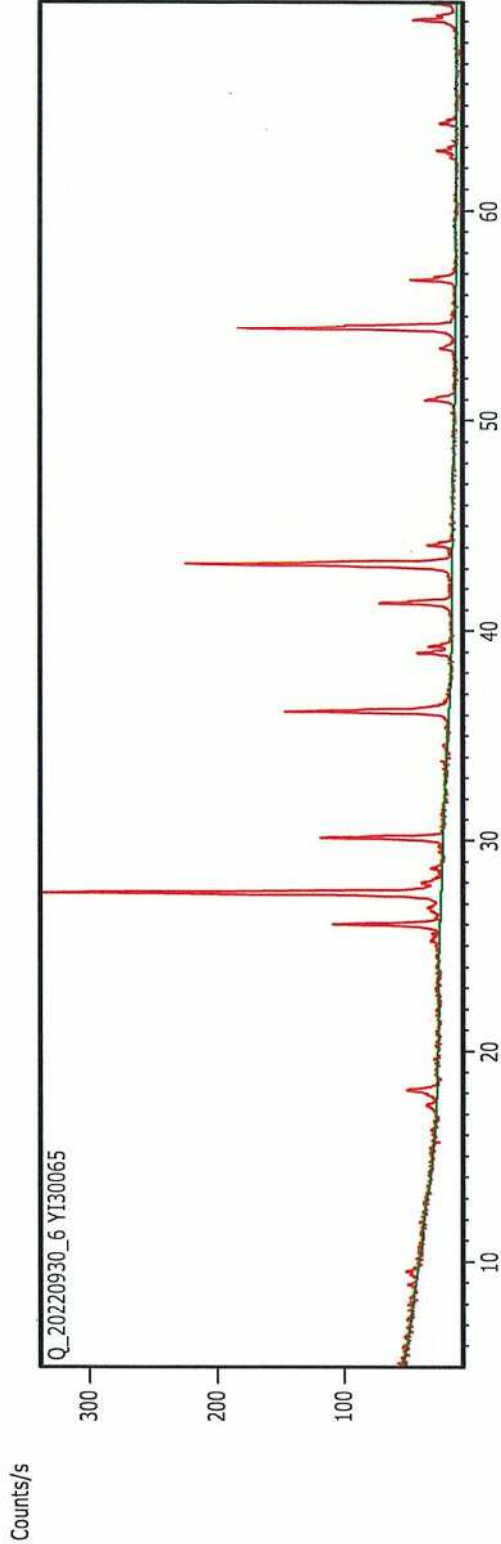

<ピークリスト>

試料名：フランジパッキン	→	ピークリスト
クリンタイル(標準)	→	Chrysotile
アモサイト(標準)	→	Amosite
クロソドライト(標準)	→	Crocidolite
アンソファイト(標準)	→	Anthophyllite
トリモライト(標準)	→	Tremolite
アケチノライト(標準)	→	Actinolite
基板(珪鉛)	→	Zinc

・ ピークリストにより、アスベスト標準のX線回折パターンを比較する。

分析結果報告書

No. YI30066

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県) 18号
栃木県宇都宮市問屋町3172番地85
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工 事 名 : 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託
採 取 住 所 : 東京都北区中十条4-16-32
採 取 場 所 : 地下1階 機械室 配管
試 料 名 (種 類) : 配管パッキン
試 料 採 取 日 : 2022年9月27日
採 取 区 分 : 株式会社 環境公害分析センター | 分析実施者

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
配管パッキン	アスベスト含有せず

分析方法

方 法 種 類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-2 「試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
---------	---

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
配管パッキン	クリンタイル	無	---
	アモサイト	無	---
	クロシドライト	無	---
	アンソフィライト	無	---
	トレモライト/ アクチノライト	無	---

判定基準:0.1%を超えてアスベストを含まないこと

管理番号: 66319

分析内容:試料名(種類): 配管パッキン


アスベストの種類	ア ス ベ ス ト の 有 無			アスベスト含有率	
	A. 位相差顕微鏡による分散染色法(※1)		B. X線回折分析法による回折線のアスベストピークの有無(※2)		
クリソタイル	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
アモサイト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
クロシドライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
アンソフィライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			
トレモライト/ アクチノライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ 無	有 ・ 無	—
	②	上記未満			

☐ : 選択マーク

※1 別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法参照。

※2 別紙B. X線回折分析法参照。

※3 「4/3000」とは、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストが4繊維状粒子の意味。

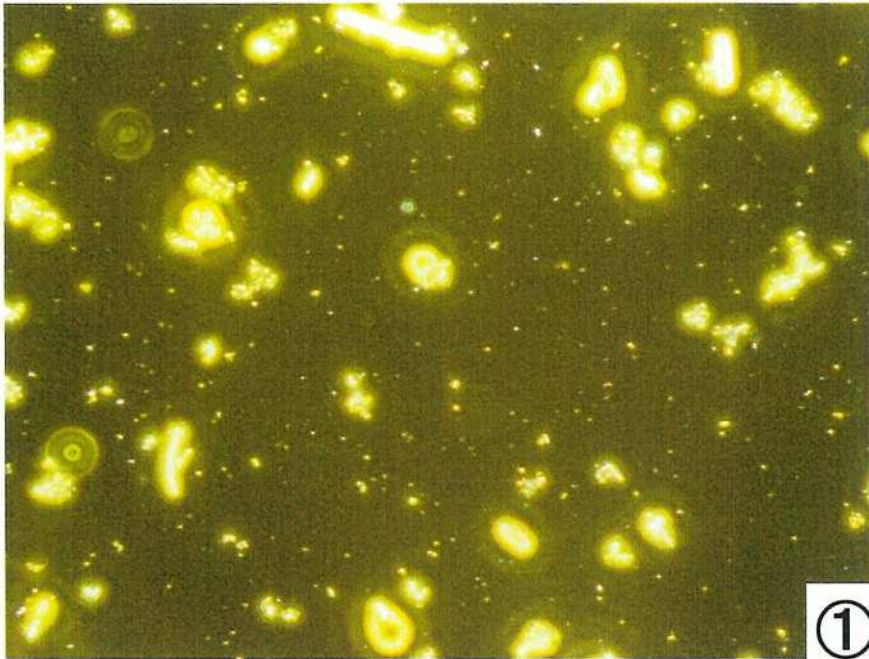


顕微鏡写真①

・屈折率：1.550

(クリソタイル用)

・倍率：×100

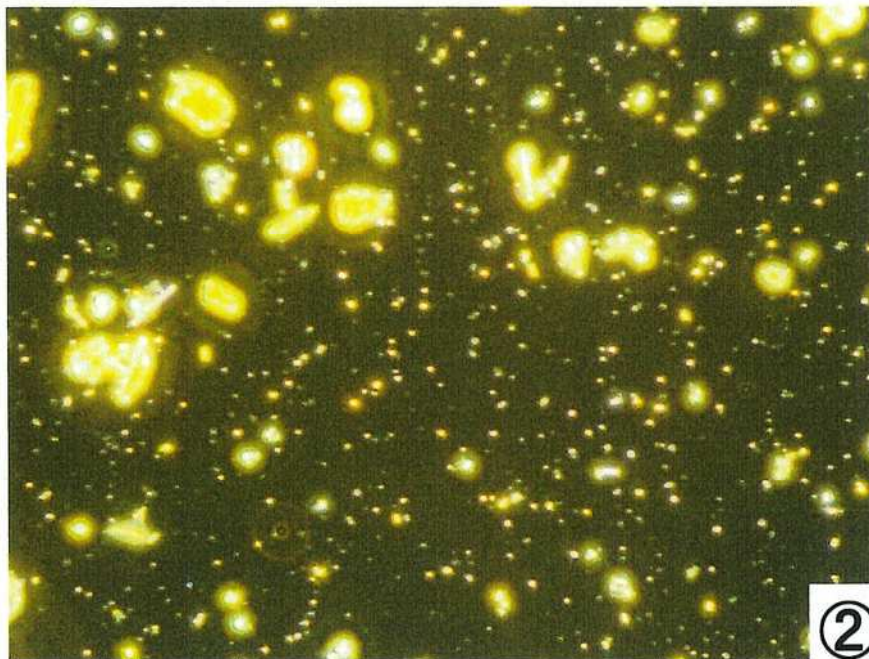


顕微鏡写真②

・屈折率：1.680

(アモサイト用)

・倍率：×100

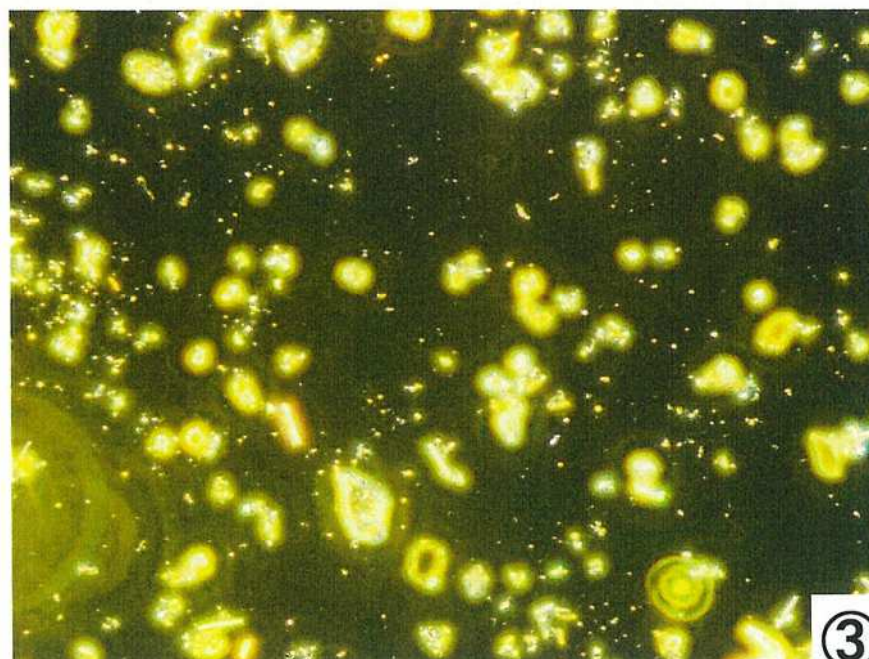

顕微鏡写真③

・屈折率：1.690


(クロシドライト用)

・倍率：×100

別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法 顕微鏡写真(④, ⑤)

No.YI30066

試料名：配管パッキン




顕微鏡写真④

・屈折率：1.618

(アンソフィライト用)

・倍率：×100



顕微鏡写真⑤

・屈折率：1.620

(トレモライト/アクチノライト用)

・倍率：×100

表 位相差顕微鏡による分散染色法におけるアスベストの分散色

アスベストの種類	屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$	分散色
クリソタイル	1.550	赤紫色～青色
アモサイト	1.680	桃色
クロシドライト	1.690	桃色
アンソフィライト	1.618	赤紫色
トレモライト/アクチノライト	1.620	赤紫色

位相差顕微鏡による分散染色法により、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストは、4繊維状粒子未満であった。

別紙B. X線回折分析法

表(1) 分析データシート(X線回折)

機 器 の 名 称	X' Pert ³ Powder (PANalytical社製)			
分 析 条 件		定性分析	定量分析	
	Target	Cu	Cu	
	Filter	Ni	Ni	
	Voltage	40	40	KV
	Current	40	40	mA
	ステップサイズ*	0.033	0.033	deg(2 θ)
	スキャンステップ時間	20	240	s
	スキャンの種類	連続	連続	
	発散スリットタイプ°	固定	固定	
	発散スリットサイズ*	0.5	0.5	deg
	試料幅	10.00	10.00	mm
分 析 結 果	別紙結果表(2)及び(3)に示すとおり			
備 考				


表(2) X線回折法によるアスベスト定性分析結果

試 料 名 (種 類)	分 析 対 象 名	判 定
配管パッキン	クリソタイル	無
	アモサイト	無
	クロシドライト	無
	アンソフィライト	無
	トレモライト/アクチノライト	無
備 考		

表(3) X線回折法によるアスベスト定量分析結果

試 料 名 (種 類)	分 析 対 象 名	含 有 率
配管パッキン	クリソタイル	—
	アモサイト	—
	クロシドライト	—
	アンソフィライト	—
	トレモライト/アクチノライト	—
備 考		

アスベストのピークは確認されませんでした。



<ピークリスト>

→	ピークリスト	→
試料名：配管パッキン	Chrysotile	→
クリンタイル(標準)	Amosite	→
アモサイト(標準)	Crocidolite	→
クロシドライト(標準)	Anthophyllite	→
アンソファイト(標準)	Tremolite	→
トレモライト(標準)	Actinolite	→
アクチノライト(標準)	Zinc	→
基板板(珪鉛)		

・ ピークリストにより、アスベスト標準のX線回折パターンを比較する。

分析結果報告書

No. NS114031-01Z-1-005

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県第19-18号)
栃木県宇都宮市問屋町3-12番地85
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工 事 名	特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託		
採 取 住 所	東京都北区中十条4-16-32		
採 取 場 所	地下1階 洗面所 床		
試 料 名 (種 類)	クッションシート		
試 料 採 取 日	2022年9月27日		
採 取 区 分	株式会社 環境公害分析センター	分析実施者	

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
クッションシート	アスベスト含有せず

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
クッションシート	クリソタイル	無	----
	アモサイト	無	----
	クロシドライト	無	----
	アンソフィライト	無	----
	トレモライト	無	----
	アクチノライト	無	----

判定基準:0.1%を超えてアスベストを含まないこと

層別推定含有率

層	外観色	層割合(%)	アスベスト種類	アスベスト推定含有率
1(表層側)	ベージュ	5	----	不検出
2	乳白色	40	----	不検出
3	乳白色	5	----	不検出
4	茶	50	----	不検出
----	----	----	----	----

※外観色、層割合、アスベスト推定含有率は目視にて判断しました
※複数の層が見られた場合は、表層側から内側へ1層、2層と表しています

分析方法


方 法 種 類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-1 「市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法」
---------	---

管理番号: 66319

偏光顕微鏡写真

試料名： クッションシート

伸長の符号



不検出

分析結果報告書

No. YI30067

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県) 第18号
栃木県宇都宮市問屋町3172番地8号
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8834
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工 事 名 : 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託
採 取 住 所 : 東京都北区中十条4-16-32
採 取 場 所 : 地下1階 浴室(男) 壁
試 料 名 (種 類) : タイル下地材
試 料 採 取 日 : 2022年9月27日
採 取 区 分 : 株式会社 環境公害分析センター

分析実施者

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
タイル下地材	アスベスト含有せず

分析方法

方 法 種 類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-2 「試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
---------	---

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
タイル下地材	クリソタイル	無	---
	アモサイト	無	---
	クロシドライト	無	---
	アンソフィライト	無	---
	トレモライト/ アクチノライト	無	---

判定基準:0.1%を超えてアスベストを含まないこと

管理番号: 66319

分析内容:試料名(種類): タイル下地材

アスベストの種類	ア ス ベ ス ト の 有 無			アスベスト含有の有無の判定	アスベスト含有率
	A. 位相差顕微鏡による分散染色法(※1)		B. X線回折分析法による回折線のアスベストピークの有無(※2)		
クリソタイル	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
アモサイト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
クロソドライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
アンソフィライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
トレモライト/ アクチノライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			

☐ :選択マーク

※1 別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法参照。


※2 別紙B. X線回折分析法参照。

※3 「4/3000」とは、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストが4繊維状粒子の意味。

別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法 顕微鏡写真(①～③)

No.YI30067

試料名：タイル下地材




顕微鏡写真①

・屈折率：1.550

(クニシタイル用)

・倍率：×100




顕微鏡写真②

・屈折率：1.680

(アモサイト用)

・倍率：×100




顕微鏡写真③

・屈折率：1.690

(クロシドライト用)

・倍率：×100




顕微鏡写真④

・屈折率：1.618

(アンソフィライト用)

・倍率：×100



顕微鏡写真⑤

・屈折率：1.620

(トレモライト/アクチノライト用)

・倍率：×100

表 位相差顕微鏡による分散染色法におけるアスベストの分散色

アスベストの種類	屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$	分散色
クリソタイル	1.550	赤紫色～青色
アモサイト	1.680	桃色
クロシドライト	1.690	桃色
アンソフィライト	1.618	赤紫色
トレモライト/アクチノライト	1.620	赤紫色

位相差顕微鏡による分散染色法により、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストは、4繊維状粒子未満であった。

別紙B. X線回折分析法

表(1) 分析データシート(X線回折)

機 器 の 名 称	X' Pert ³ Powder (PANalytical社製)			
分 析 条 件		定性分析	定量分析	
	Target	Cu	Cu	
	Filter	Ni	Ni	
	Voltage	40	40	KV
	Current	40	40	mA
	ステップサイズ*	0.033	0.033	deg(2 θ)
	スキャンステップ時間	20	240	s
	スキャンの種類	連続	連続	
	発散スリットタイプ*	固定	固定	
	発散スリットサイズ*	0.5	0.5	deg
	試料幅	10.00	10.00	mm
分 析 結 果	別紙結果表(2)及び(3)に示すとおり			
備 考				


表(2) X線回折法によるアスベスト定性分析結果

試 料 名 (種 類)	分 析 対 象 名	判 定
タイル下地材	クリソタイル	無
	アモサイト	無
	クロシドライト	無
	アンソフィライト	無
	トレモライト/アクチノライト	無
備 考		

表(3) X線回折法によるアスベスト定量分析結果

試 料 名 (種 類)	分 析 対 象 名	含 有 率
タイル下地材	クリソタイル	—
	アモサイト	—
	クロシドライト	—
	アンソフィライト	—
	トレモライト/アクチノライト	—
備 考		

アスベストのピークは確認されませんでした。



<ピークリスト>

試料名：タイル下地材	↑	ピークリスト
クリンタイル(標準)	↑	Chrysotile
アモサイト(標準)	↑	Amosite
クロシドライト(標準)	↑	Crocidolite
アンソファイト(標準)	↑	Anthophyllite
トレモライト(標準)	↑	Tremolite
アクチノライト(標準)	↑	Actinolite
基板(珪鉛)	↑	Zinc

・ ピークリストにより、アスベスト標準のX線回折パターンを比較する。

分析結果報告書

No. YI30068

2022年10月11日

株式会社 平安設計 様

作業環境測定機関 (栃木県 第18号)
栃木県宇都宮市問屋町3172番地85
株式会社環境公害分析センター
TEL 028-601-8835 FAX 028-601-8836
作業環境測定士



ご依頼のありました試料のアスベスト含有率の分析結果を下記の通りご報告いたします。

工 事 名 : 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託
採 取 住 所 : 東京都北区中十条4-16-32
採 取 場 所 : 地下1階 会議室 天井
試 料 名 (種 類) : 石こうボード
試 料 採 取 日 : 2022年9月27日
採 取 区 分 : 株式会社 環境公害分析センター | 分析実施者

判定結果

試料名(種類)	アスベスト含有判定結果
石こうボード	アスベスト含有せず

分析方法

方 法 種 類	平成26年3月28日制定 JIS A 1481-2 「試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法」
---------	---

アスベスト含有率の分析結果

試料名(種類)	アスベストの有無の確認(定性分析)結果		アスベスト含有率の定量分析結果(%)
石こうボード	クリソタイル	無	---
	アモサイト	無	---
	クロシドライト	無	---
	アンソフィライト	無	---
	トレモライト/ アクチノライト	無	---

判定基準:0.1%を超えてアスベストを含まないこと

管理番号: 66319

分析内容:試料名(種類): 石こうボード

アスベストの種類	ア ス ベ ス ト の 有 無				アスベスト含有率
	A. 位相差顕微鏡による分散染色法(※1)		B. X線回折分析法による回折線のアスベストピークの有無(※2)	アスベスト含有の有無の判定	
クリソタイル	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
アモサイト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
クロシドライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
アンソフィライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			
トレモライト/ アクチノライト	1	4/3000 以上(※3)	有 ・ ☒ 無	有 ・ ☒ 無	—
	☒ 2	上記未満			

☐ : 選択マーク

※1 別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法参照。


※2 別紙B. X線回折分析法参照。

※3 「4/3000」とは、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストが4繊維状粒子の意味。

別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法 顕微鏡写真(①～③)

No.YI30068

試料名：石こうボード

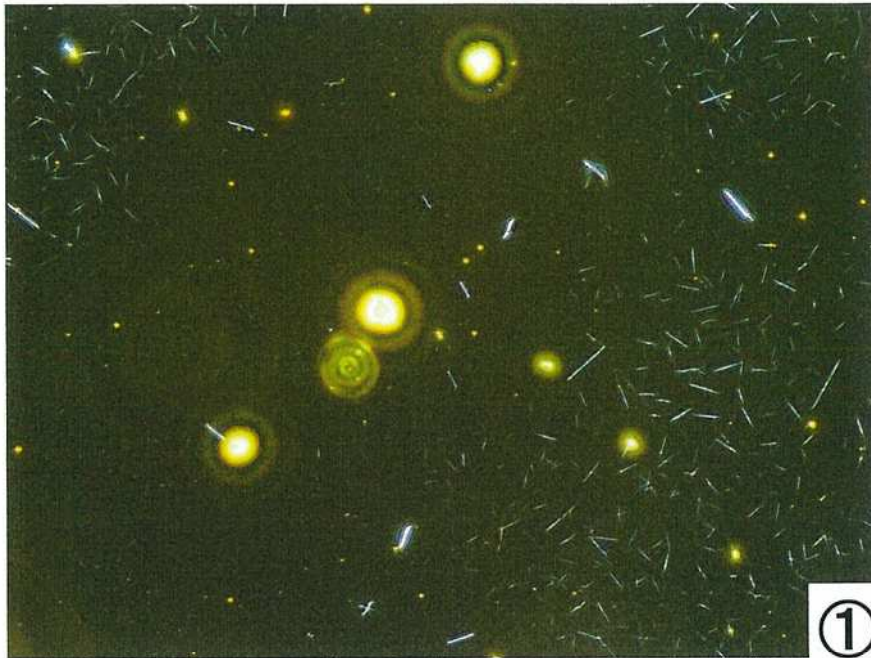


①

顕微鏡写真①

・屈折率：1.550

(クリソタイル用)

・倍率：×100

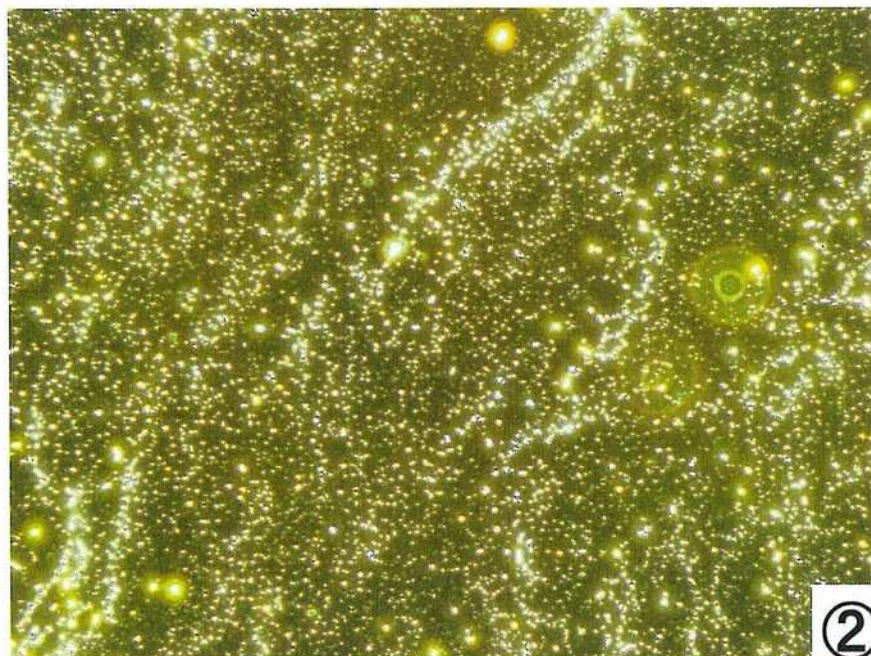


②

顕微鏡写真②

・屈折率：1.680

(アモサイト用)

・倍率：×100

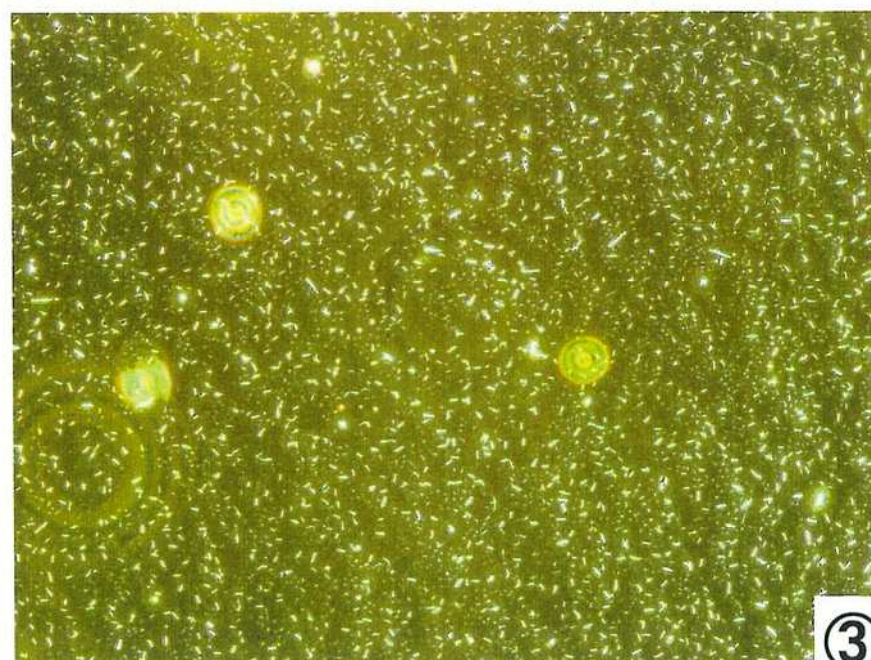

③

顕微鏡写真③

・屈折率：1.690

(クロシドライト用)

・倍率：×100

別紙A. 位相差顕微鏡による分散染色法 顕微鏡写真(④, ⑤)

No.YI30068

試料名：石こうボード




④

顕微鏡写真④

・屈折率：1.618

(アンソフィライト用)

・倍率：×100

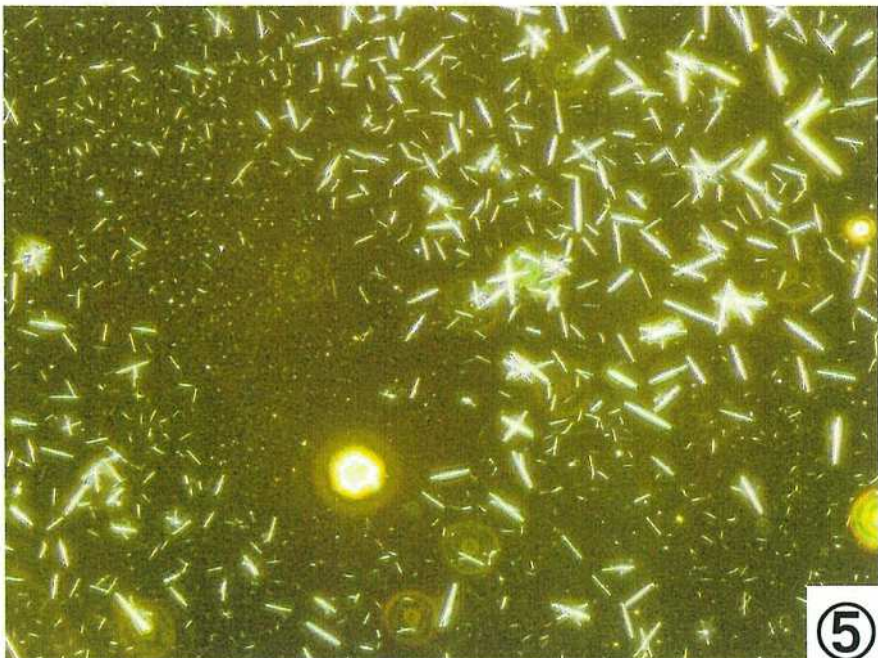

⑤

顕微鏡写真⑤

・屈折率：1.620

(トレモライト/アクチノライト用)

・倍率：×100

表 位相差顕微鏡による分散染色法におけるアスベストの分散色

アスベストの種類	屈折率 $n_D^{25^\circ\text{C}}$	分散色
クリソタイル	1.550	赤紫色～青色
アモサイト	1.680	桃色
クロシドライト	1.690	桃色
アンソフィライト	1.618	赤紫色
トレモライト/アクチノライト	1.620	赤紫色

位相差顕微鏡による分散染色法により、三つの標本で計数した3000粒子中アスベストは、4繊維状粒子未満であった。

別紙B. X線回折分析法

表(1) 分析データシート(X線回折)

機 器 の 名 称	X' Pert ³ Powder (PANalytical社製)			
分 析 条 件		定性分析	定量分析	
	Target	Cu	Cu	
	Filter	Ni	Ni	
	Voltage	40	40	KV
	Current	40	40	mA
	ステップサイズ*	0.033	0.033	deg(2 θ)
	スキャンステップ時間	20	240	s
	スキャンの種類	連続	連続	
	発散スリットタイプ	固定	固定	
	発散スリットサイズ*	0.5	0.5	deg
	試料幅	10.00	10.00	mm
分 析 結 果	別紙結果表(2)及び(3)に示すとおり			
備 考				


表(2) X線回折法によるアスベスト定性分析結果

試料名(種類)	分析対象名	判定
石こうボード	クリソタイル	無
	アモサイト	無
	クロシドライト	無
	アンソフィライト	無
	トレモライト/アクチノライト	無
備考		

表(3) X線回折法によるアスベスト定量分析結果

試料名(種類)	分析対象名	含有率
石こうボード	クリソタイル	—
	アモサイト	—
	クロシドライト	—
	アンソフィライト	—
	トレモライト/アクチノライト	—
備考		


アスベストのピークは確認されませんでした。




<ピークリスト>

試料名：石こうボード	↑	ピークリスト
クリソタイル(標準)	↑	Chrysotile
アモサイト(標準)	↑	Amosite
クロシドライト(標準)	↑	Crocidolite
アンソファライト(標準)	↑	Anthophyllite
トレモライト(標準)	↑	Tremolite
アクチノライト(標準)	↑	Actinolite
基板(珪鉛)	↑	Zinc

・ ピークリストにより、アスベスト標準のX線回折パターンを比較する。

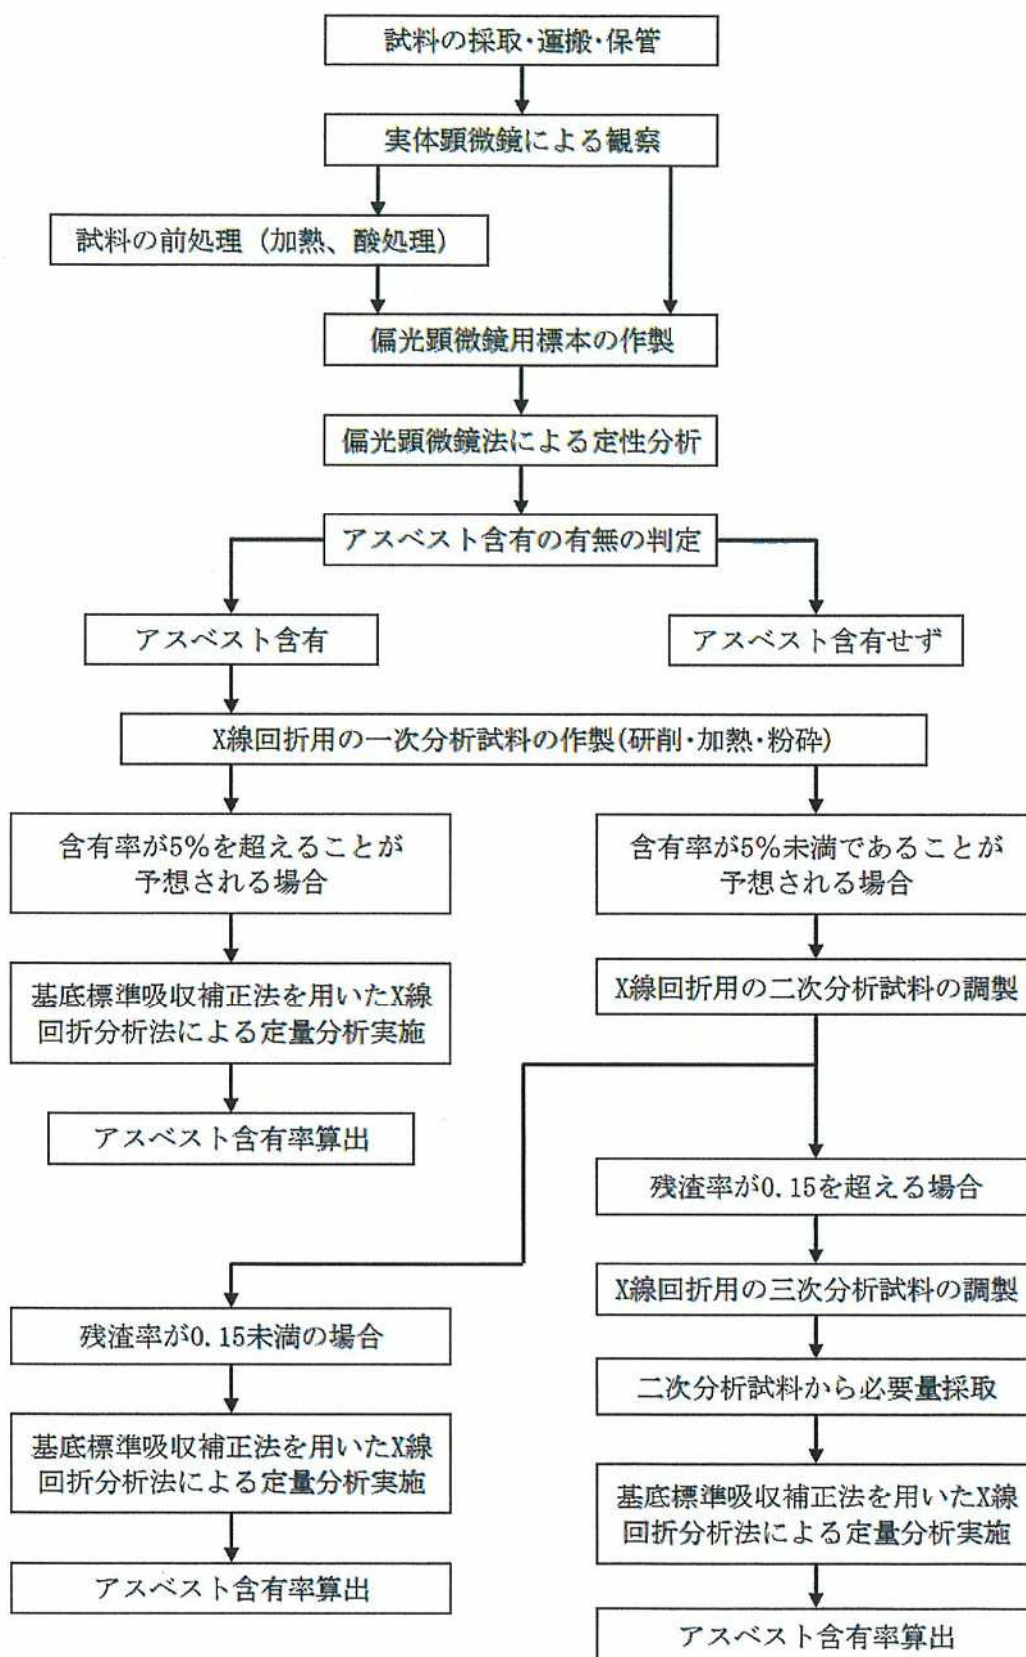

測定フロー図

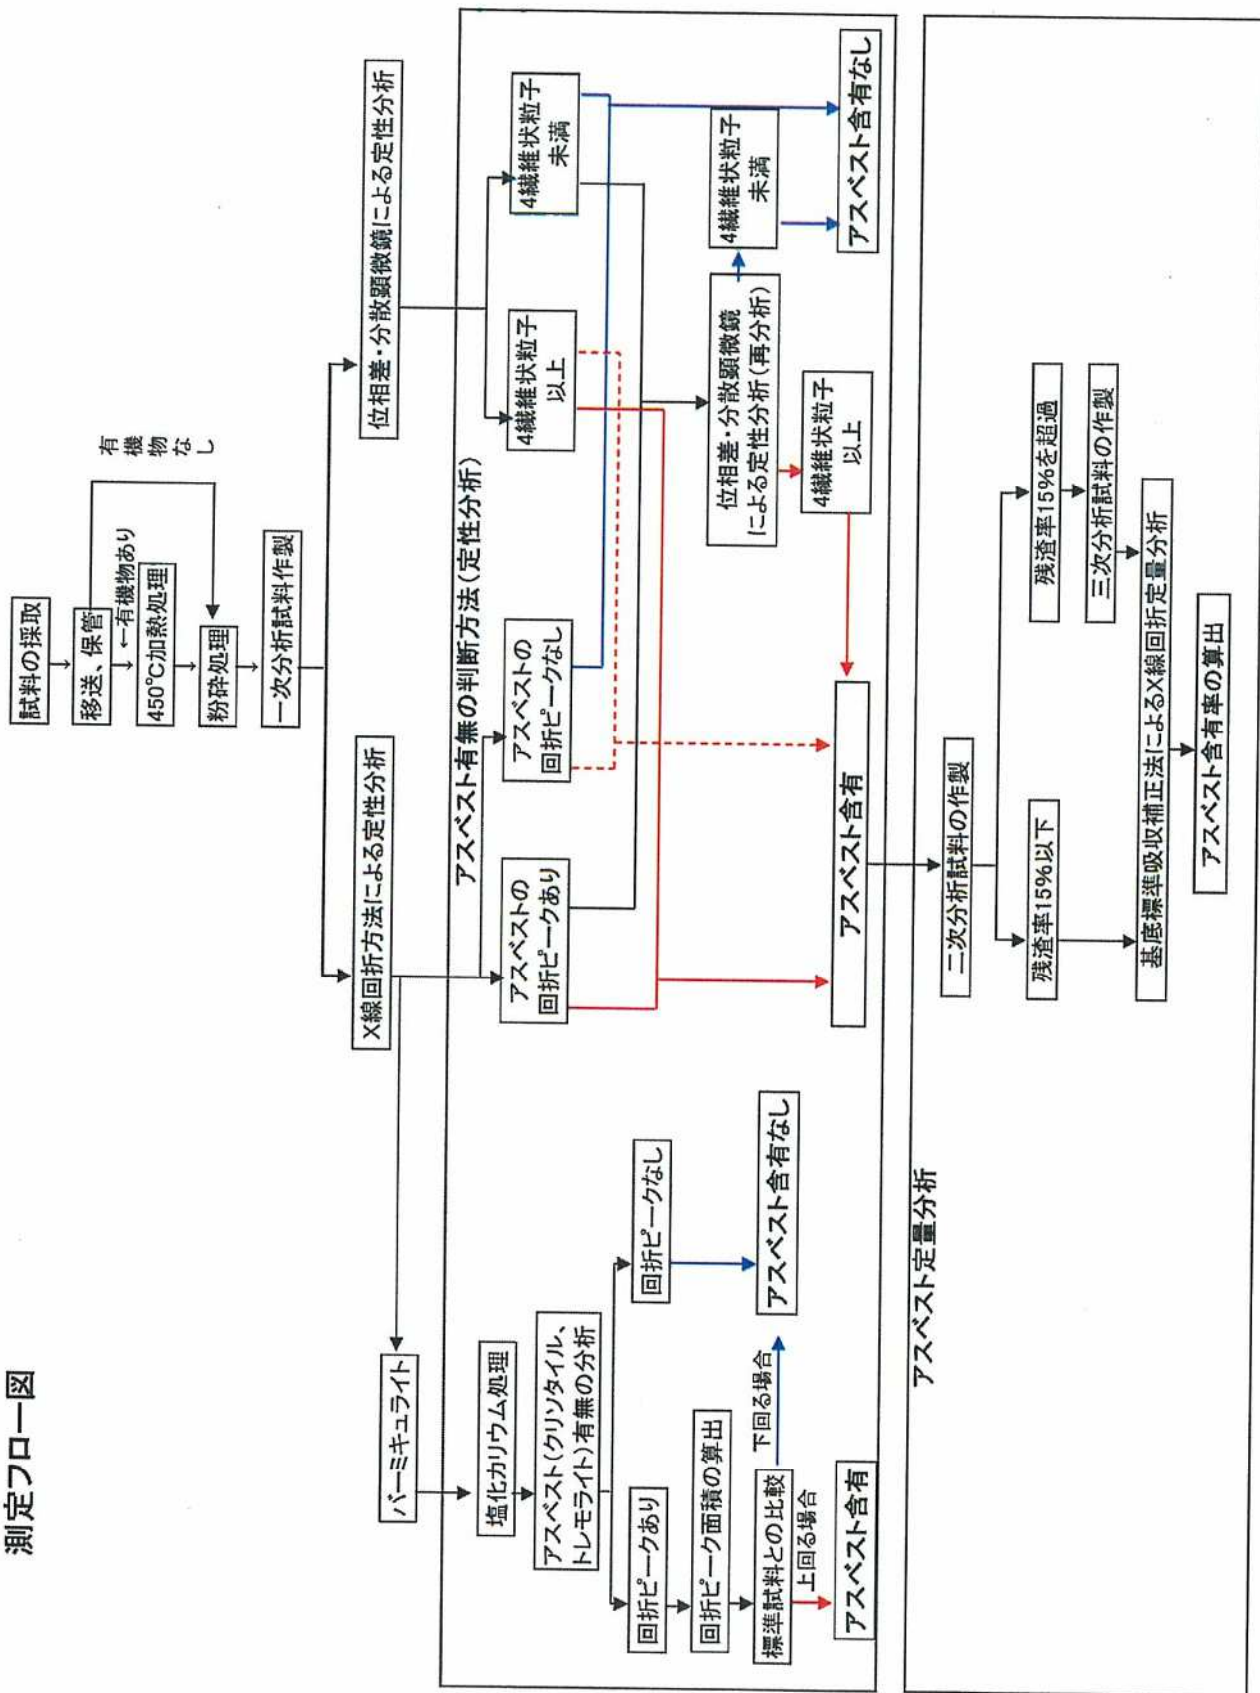

参考資料

作業レベルの判定

作業レベルは、石綿含有建築材料と施工方法、運搬から総合的に判断します。
石綿含有建築材料のみでの判断はできません。

石綿含有保温材などレベル2の石綿含有建築材料においても、切断や穿孔
研磨等の作業を伴う場合は、作業レベル1と判断されることがあります。

作業レベルに関するお問い合わせは、解体工事会社などの専門会社または
労働局や各地方自治体へご相談下さい。

アスベスト含有建材と作業レベル

作業レベル	発じん性	対応石綿含有材
1	著しく高い	【石綿含有吹付け材】 ①吹付け石綿 ②石綿含有吹付けロックウール(乾式) ③湿式石綿吹付け材(石綿含有吹付けロックウール(湿式)) ④石綿含有吹付けパーミキュライト ⑤石綿含有吹付けパーライト
2	高い	【石綿含有耐火被覆材】 ①耐火被覆板 ②けい酸カルシウム板第二種 【石綿含有断熱材】 ①屋根用折板石綿断熱材 ②煙突用石綿断熱材 【石綿含有保温材】 ①石綿保温材 ②けいそう土保温材 ③パーライト保温材 ④石綿含有けい酸カルシウム保温材 ⑤不定形保温材(水練り保温材)
3	比較的低い	【その他石綿含有成形板】 ①石綿スレート ②けい酸カルシウム板第一種 ③住宅屋根用化粧スレート ④押出成形セメント板 ⑤窯業系サイディング ⑥パルプセメント板 ⑦スラグ石こう板 ⑧フロー材 ⑨ロックウール吸音天井板 ⑩石こう板(ボード) ⑪石綿円筒 ⑫ビニル床タイル ⑬その他石綿含有成形板 【石綿含有仕上塗材】 ①石綿含有仕上材(パーライト、パーミキュライトを除く)

石綿事前調査結果報告システム 分析調査実施者情報

株式会社環境公害分析センター

栃木県宇都宮市間屋町3172-85

本資料は、元方(元請)事業者にて行う石綿事前調査結果の電子報告に関する情報提供の為の参考資料です。

各記載事項は、本調査における分析結果のみ適用されます。

本調査：特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修実施設計業務委託

●「請負事業者情報」欄への入力情報

※弊社が「請負事業者」に該当する場合のみ記載ください。									
事業者の名称	株式会社環境公害分析センター								
労働保険番号	09	-	3	-	06	-	937100	-	100
請負事業者の住所									
郵便番号	321	-	0911						
都道府県・市区町村名等	栃木県宇都宮市								
住所(続き)	間屋町3172-85								
電話番号	0286018835								
事前調査を実施した者									
氏名	※1								
講習実施機関の名称	※1								
分析調査を実施した者									
氏名	[REDACTED]								
講習実施機関の名称	公益社団法人 日本作業環境測定協会 石綿分析技術評価事業 評価区分1:JIS A 1481-1による方法 合格 認定番号 [REDACTED]								
作業に係る石綿作業主任者									
氏名	※2								

【入力に関する注意事項】

・実際の入力作業は、元方(元請)事業者が行う必要があります。(代理入力は認められておりません。)


・「請負事業者情報」欄への入力方法等は、届出ごとに元方(元請)事業者の責任において確認し判断ください。

※1 弊社にて事前調査を実施した場合の「事前調査を実施した者」に関する情報は、調査報告書をご確認ください。


持込分析の場合は、「事前調査を実施した者」の記載は該当しません。

※2 「作業に係る石綿作業主任者の氏名」の記載は該当しません。

試料採取場所

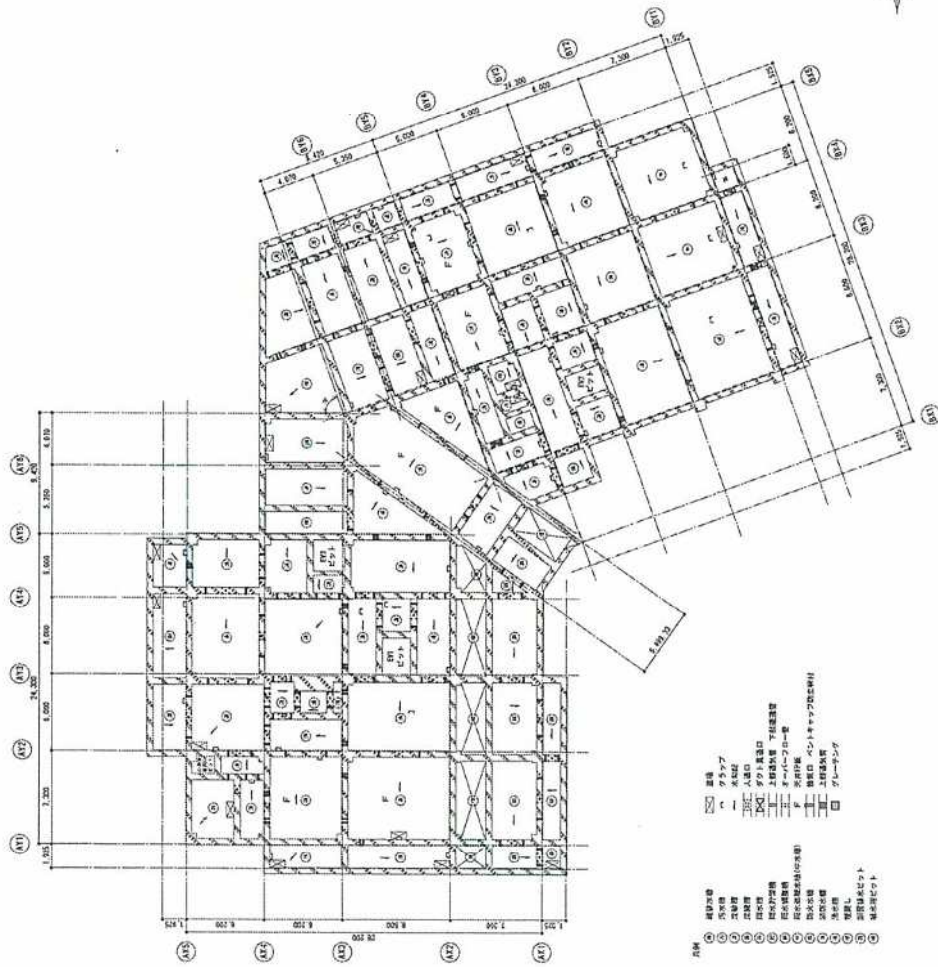

【ビット平面図 1/200】

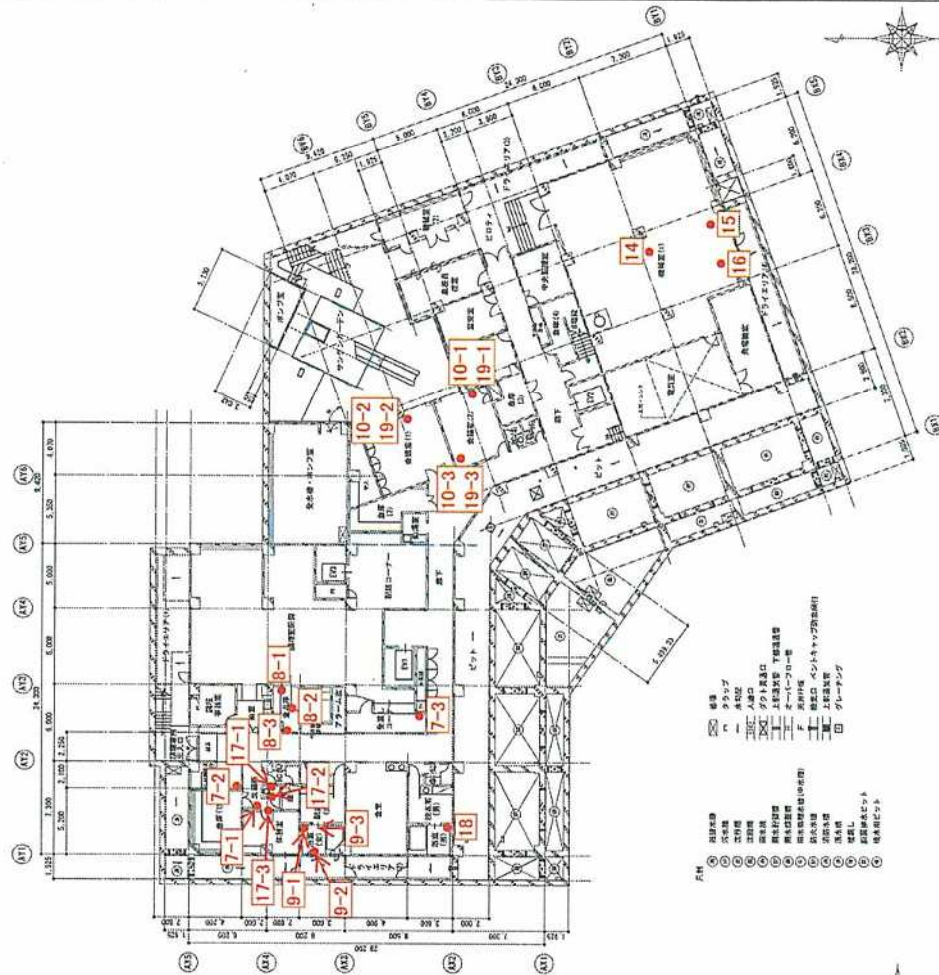

【地下1階平面図 1/200】

[illegible]


試料採取場所




【1階平面図 1/200】

種別	805	特別調査人共一ノ里ノ里 調査地区大規模調査工事 あじろ調査地区大規模調査工事	調査年度	2004年度	調査年度	2004年度	調査年度	2004年度
調査年度	2004年度	調査年度	2004年度	調査年度	2004年度	調査年度	2004年度	調査年度

試料採取場所

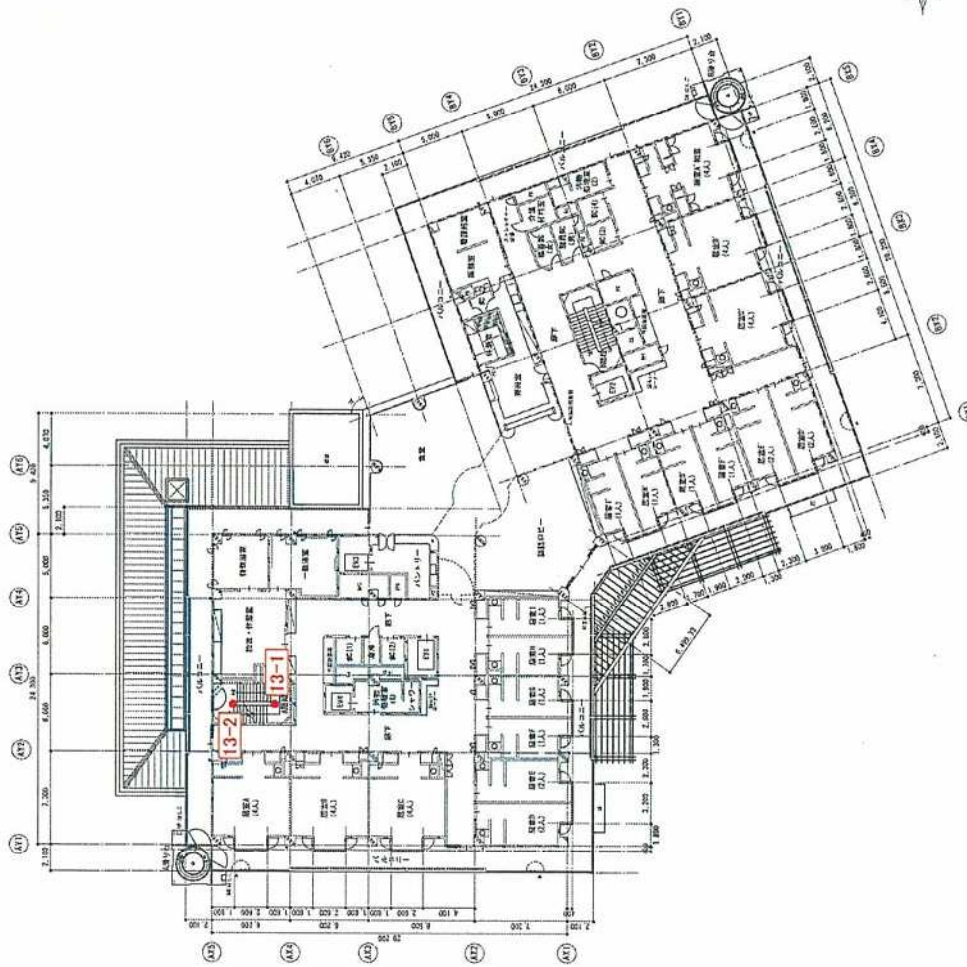


【2階平面図 1/200】

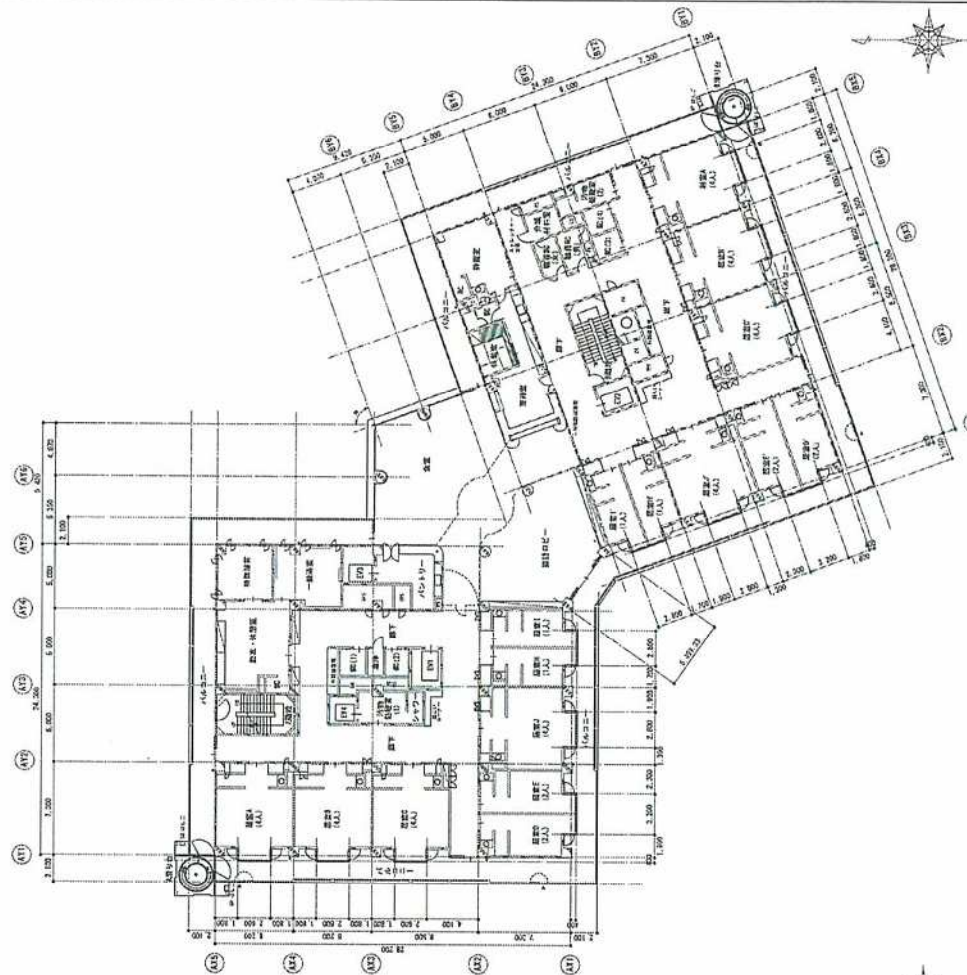


【3階平面図 1/200】

[illegible]

試料採取場所

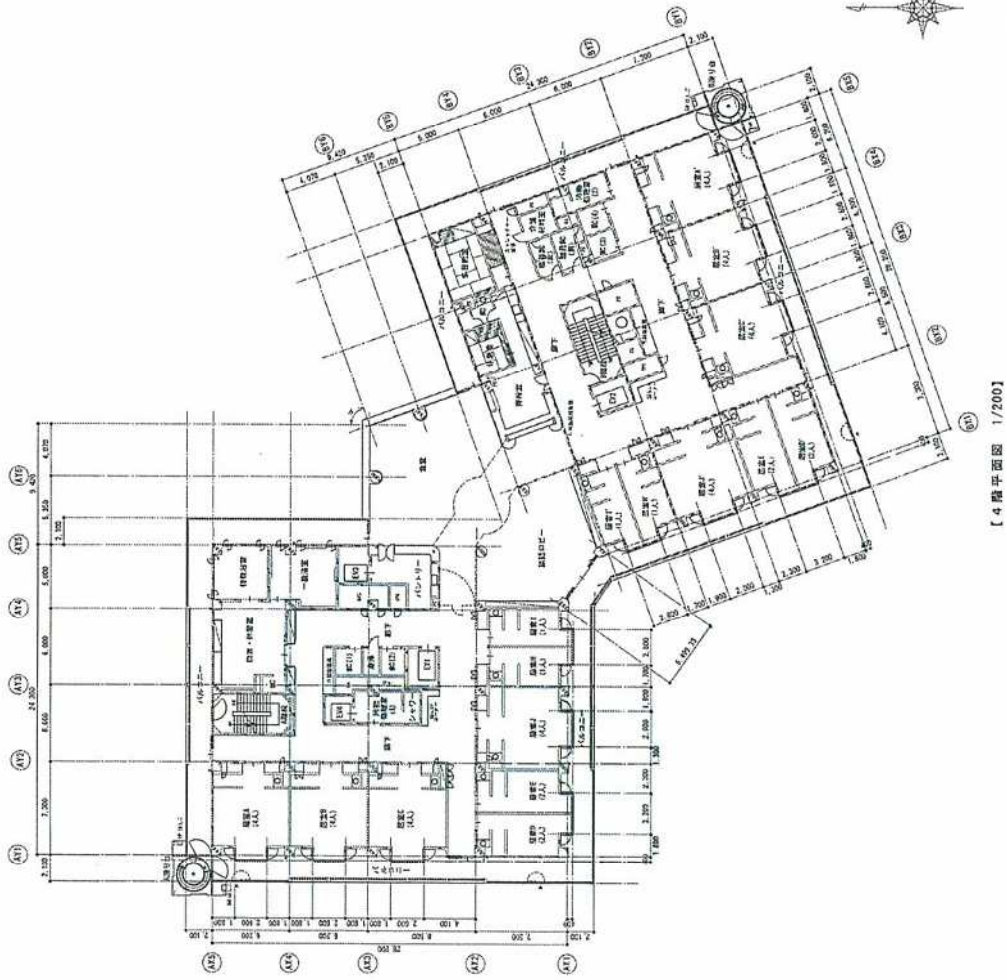


【4階平面図 1/200】

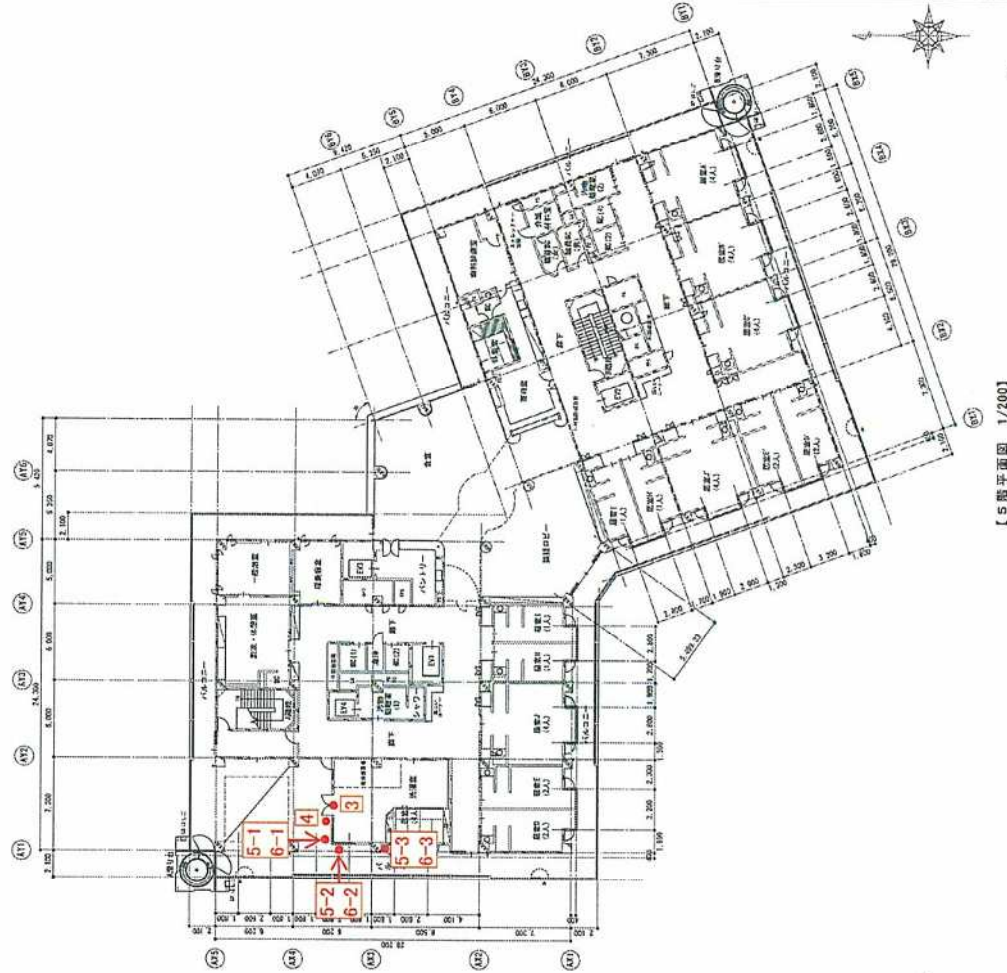


【5階平面図 1/200】

[illegible]

試料採取場所

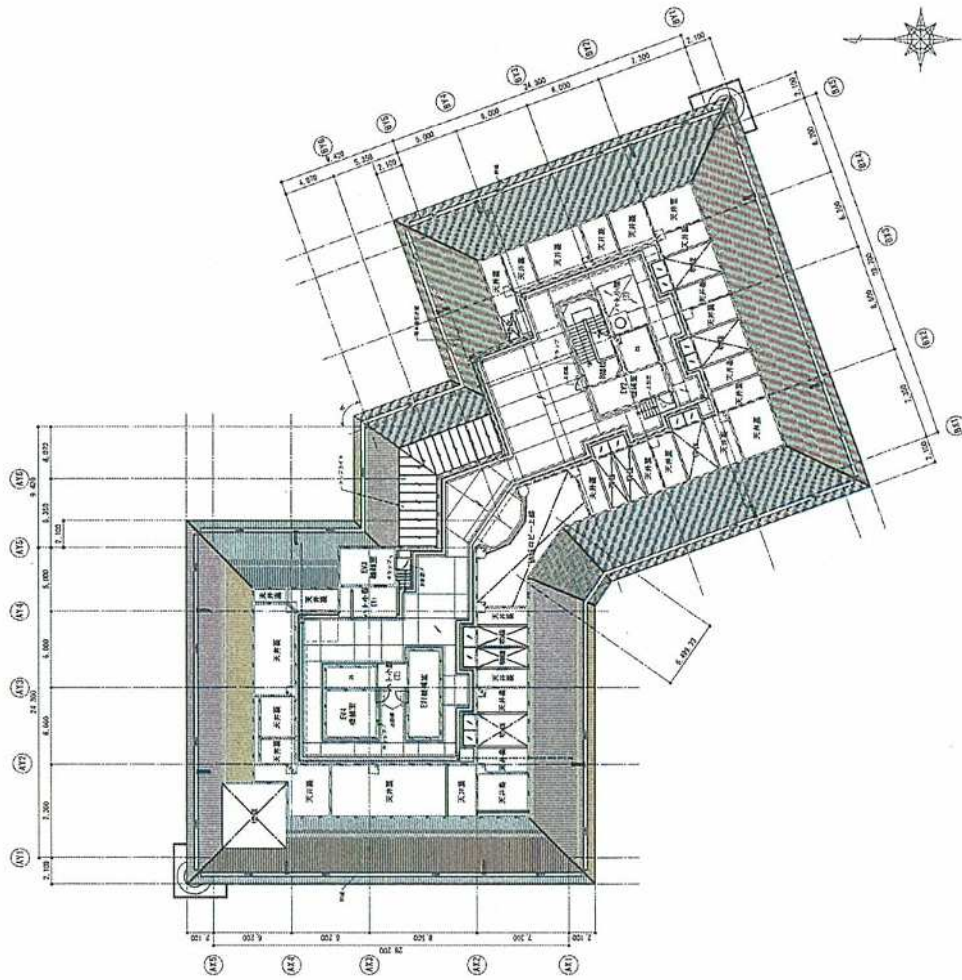


【屋上平面図 1/200】

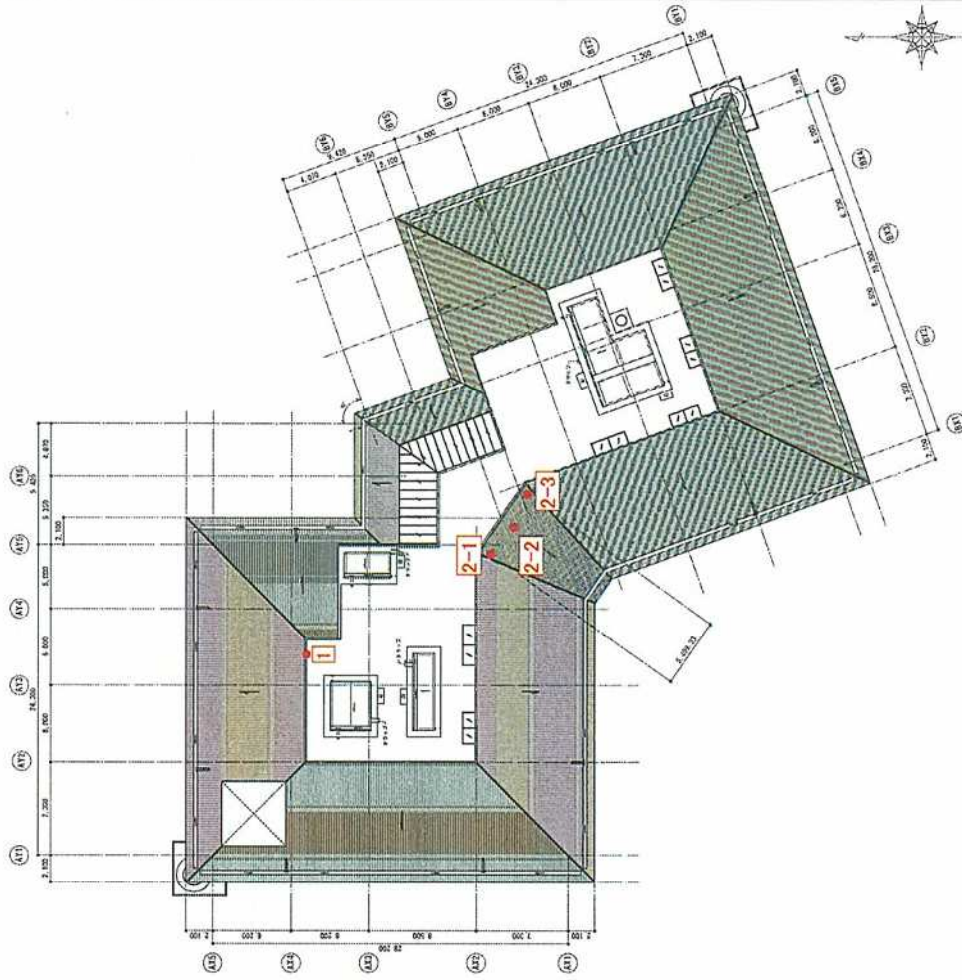

【原报伏因 1/2007】

品名	数量	単位	価格	金額	計
105	100	個	100	10000	10000
株式会社 平安設計 〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 電話 03-1234-5678					



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 1

勾配屋根

種類 アスファルトシングル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況

採取場所 1

勾配屋根

種類 アスファルトシングル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況


採取状況

採取場所 1

勾配屋根

種類 アスファルトシングル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況


採取後

採取場所 1

勾配屋根

種類 アスファルトシングル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 1

勾配屋根

種類 アスファルトシングル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 1

勾配屋根

種類 アスファルトシングル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

全採取試料

採取場所 1

勾配屋根

種類 アスファルトシングル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 2-1

外壁

種類 吹付タイル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況

採取場所 2-1

外壁

種類 吹付タイル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取状況

採取場所 2-1

外壁

種類 吹付タイル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 2-1

外壁

種類 吹付タイル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 2-1

外壁

種類 吹付タイル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 2-1

外壁

種類 吹付タイル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 2-2

外壁

種類 吹付タイル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況


採取後

採取場所 2-2

外壁

種類 吹付タイル

採取日 2022年9月27日

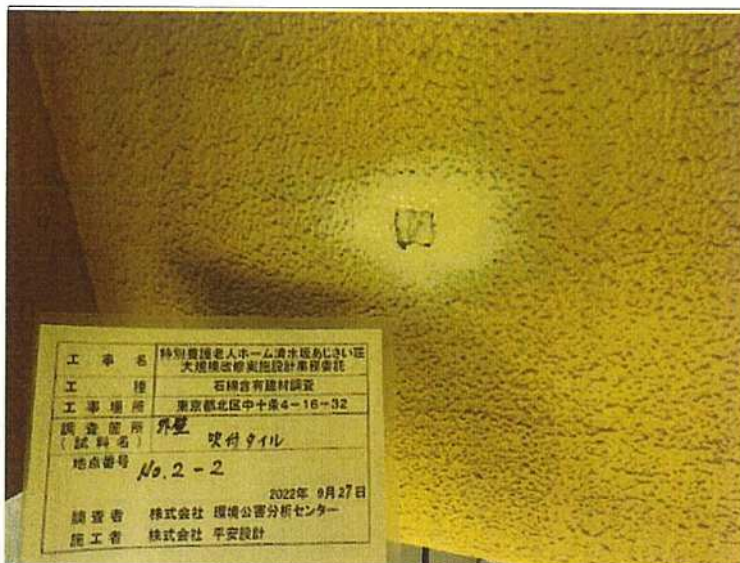

アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 2-2

外壁

種類 吹付タイル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 2-2

外壁

種類 吹付タイル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 2-3

外壁

種類 吹付タイル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 2-3

外壁

種類 吹付タイル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 2-3

外壁

種類 吹付タイル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 2-3

外壁

種類 吹付タイル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

全採取試料

採取場所 2

外壁

種類 吹付タイル

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 3

外壁目地

種類 ポリサルファイド

コーキング

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況


採取場所 3

外壁目地

種類 ポリサルファイド

コーキング

採取日 2022年9月27日

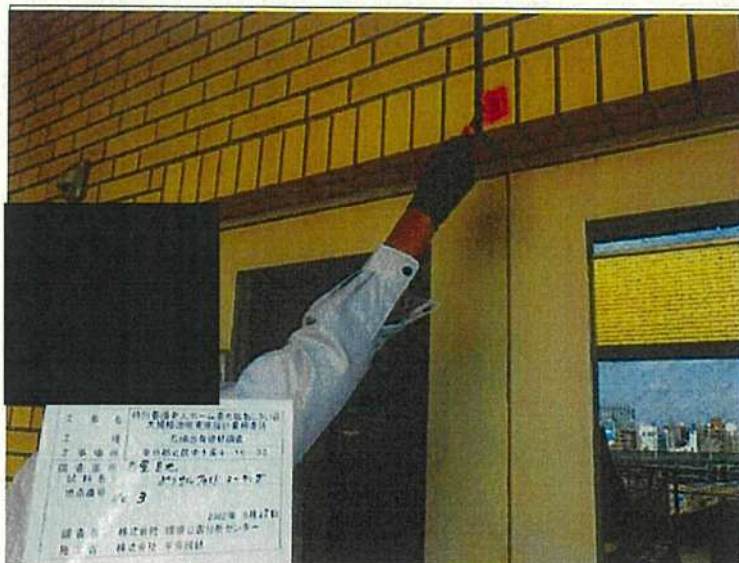

アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取状況

採取場所 3

外壁目地

種類 ポリサルファイド

コーキング

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 3

外壁目地

種類 ポリサルファイド

コーキング

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 3

外壁目地

種類 ポリサルファイド

コーキング

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料


採取場所 3

外壁目地

種類 ポリサルファイド

コーキング

採取日 2022年9月27日

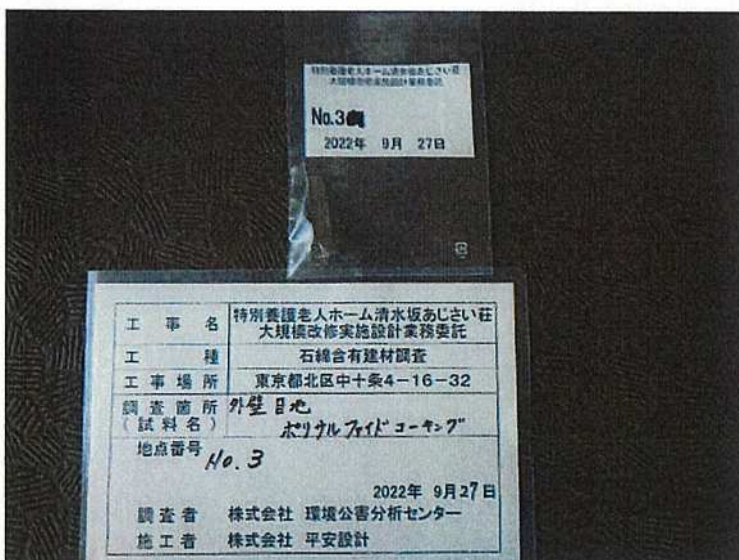

アスベスト含有調査

サンプリング状況

全採取試料

採取場所 3

外壁目地

種類 ポリサルファイド

コーキング

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 4

バルコニー

床(5階)

種類 アスファルト防水

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況

採取場所 4

バルコニー

床(5階)

種類 アスファルト防水

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取状況


採取場所 4

バルコニー

床(5階)

種類 アスファルト防水

採取日 2022年9月27日

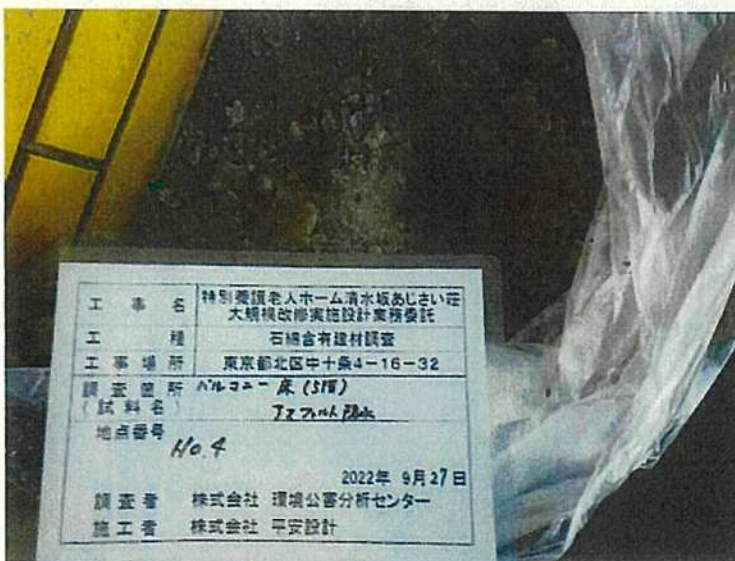

アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 4

バルコニー

床(5階)

種類 アスファルト防水

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 4

バルコニー

床(5階)

種類 アスファルト防水

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 4

バルコニー

床(5階)

種類 アスファルト防水

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

全採取試料

採取場所 4

バルコニー

床(5階)

種類 アスファルト防水

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前


採取場所 5-1

バルコニー

軒天井

種類 耐水岩綿吸音板t12

採取日 2022年9月27日

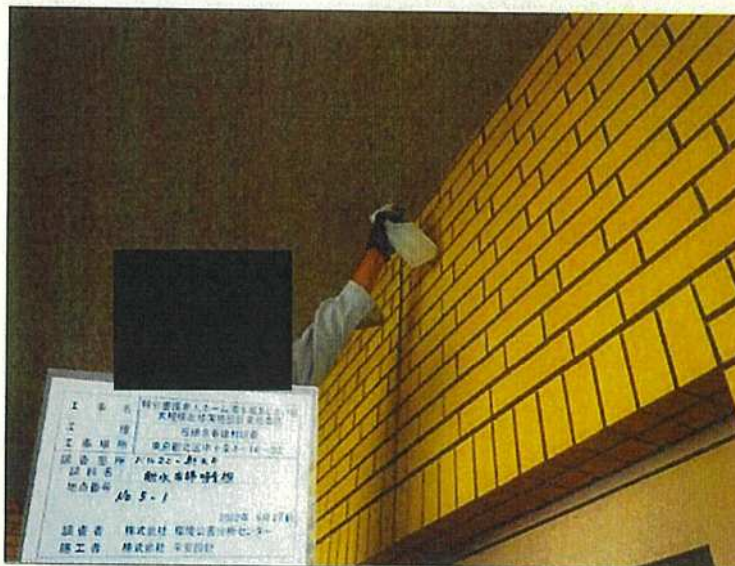

アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況


採取場所 5-1

バルコニー

軒天井

種類 耐水岩綿吸音板t12

採取日 2022年9月27日

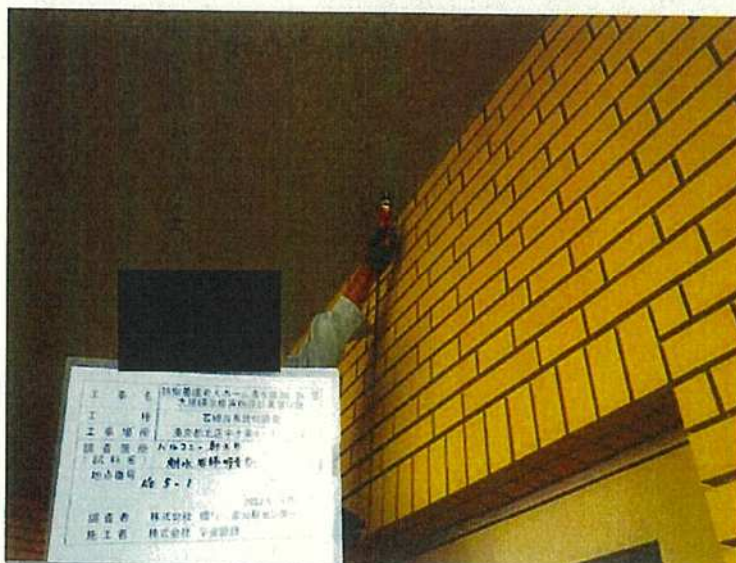

アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取状況


採取場所 5-1

バルコニー

軒天井

種類 耐水岩綿吸音板t12

採取日 2022年9月27日

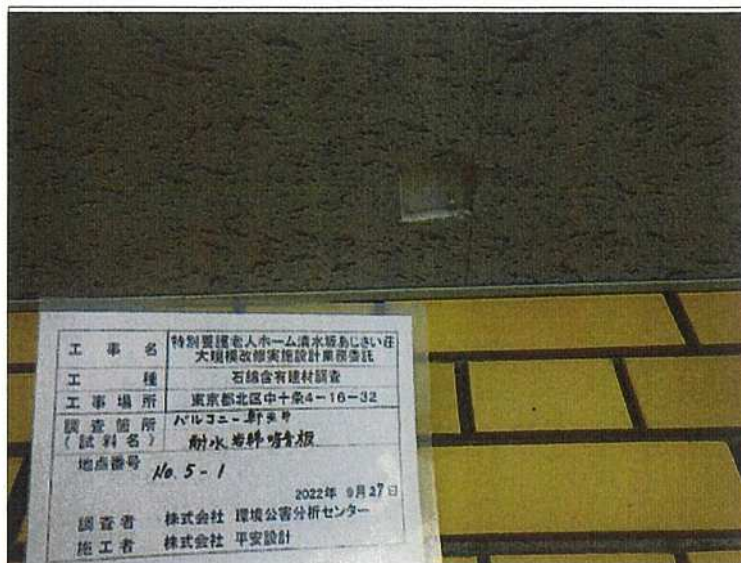

アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 5-1

バルコニー

軒天井

種類 耐水岩綿吸音板t12

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料


採取場所 5-1

バルコニー

軒天井

種類 耐水岩綿吸音板t12

採取日 2022年9月27日

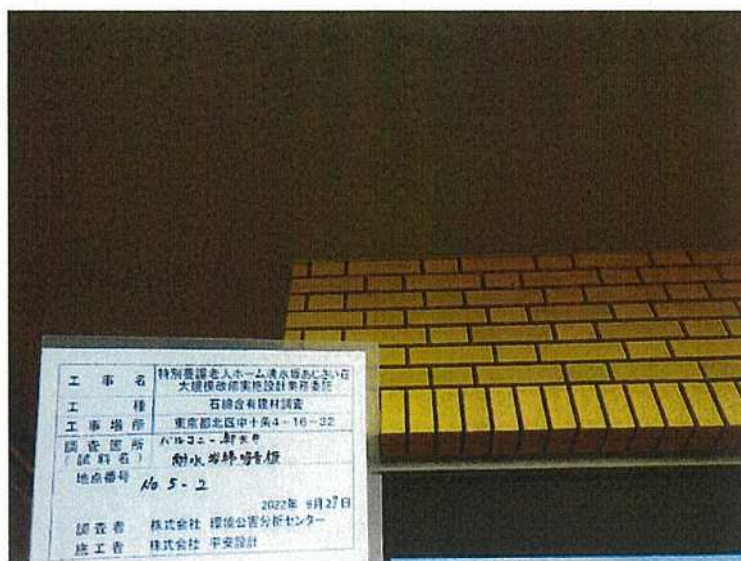

アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 5-2

バルコニー

軒天井

種類 耐水岩綿吸音板t12

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 5-2

バルコニー

軒天井

種類 耐水岩綿吸音板t12

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 5-2

バルコニー

軒天井

種類 耐水岩綿吸音板t12

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 5-3

バルコニー

軒天井

種類 耐水岩綿吸音板t12

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 5-3

バルコニー

軒天井

種類 耐水岩綿吸音板t12

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 5-3

バルコニー

軒天井

種類 耐水岩綿吸音板t12

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

全採取試料

採取場所 5

バルコニー

軒天井

種類 耐水岩綿吸音板t12

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前


採取場所 6-1

バルコニー

軒天井

種類 ケイ酸カルシウム板

採取日 2022年9月27日

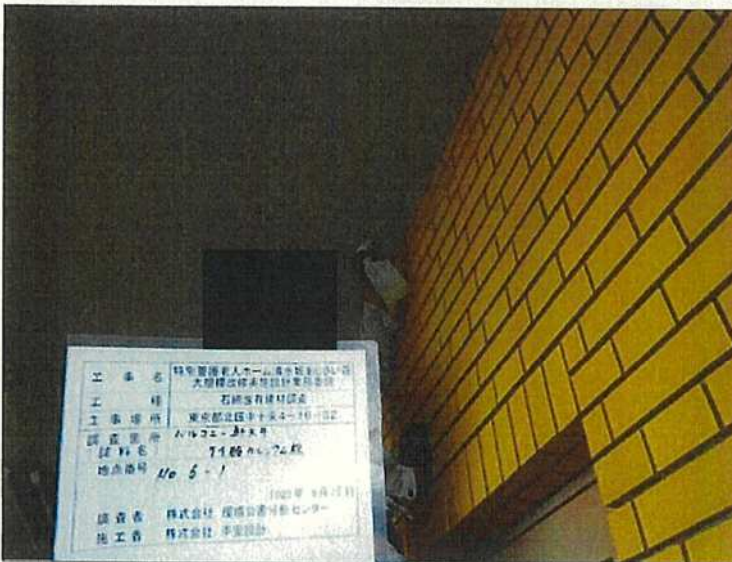

アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況


採取場所 6-1

バルコニー

軒天井

種類 ケイ酸カルシウム板

採取日 2022年9月27日

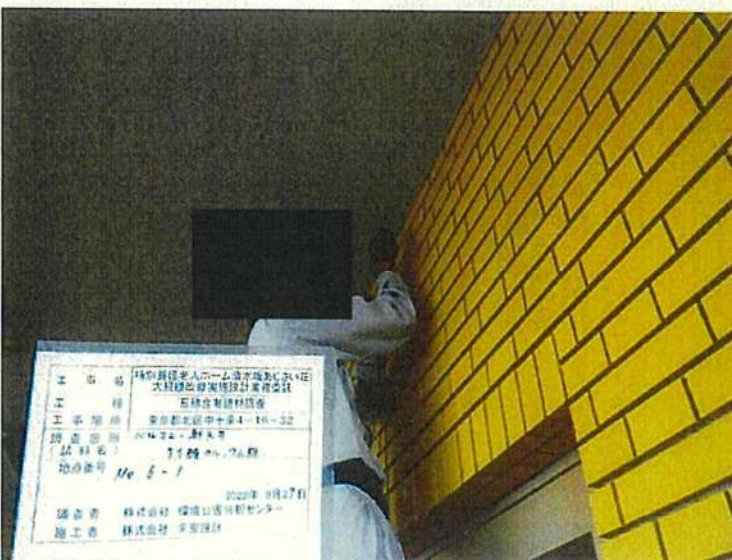

アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取状況

採取場所 6-1

バルコニー

軒天井

種類 ケイ酸カルシウム板

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 6-1

バルコニー

軒天井

種類 ケイ酸カルシウム板

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 6-1

バルコニー

軒天井

種類 ケイ酸カルシウム板

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 6-1

バルコニー

軒天井

種類 ケイ酸カルシウム板

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 6-2

バルコニー

軒天井

種類 ケイ酸カルシウム板

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 6-2

バルコニー

軒天井

種類 ケイ酸カルシウム板

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 6-2

バルコニー

軒天井

種類 ケイ酸カルシウム板

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 6-2

バルコニー

軒天井

種類 ケイ酸カルシウム板

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 6-3

バルコニー

軒天井

種類 ケイ酸カルシウム板

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 6-3

バルコニー

軒天井

種類 ケイ酸カルシウム板

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 6-3

バルコニー

軒天井

種類 ケイ酸カルシウム板

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 6-3

バルコニー

軒天井

種類 ケイ酸カルシウム板

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

全採取試料

採取場所 6

バルコニー

軒天井

種類 ケイ酸カルシウム板

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前


採取場所 7-1

地下1階

廊下 床

種類 ビニル床シート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況

採取場所 7-1

地下1階

廊下 床

種類 ビニル床シート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取状況

採取場所 7-1

地下1階

廊下 床

種類 ビニル床シート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 7-1

地下1階

廊下 床

種類 ビニル床シート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後


採取場所 7-1

地下1階

廊下 床

種類 ビニル床シート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料


採取場所 7-1

地下1階

廊下 床

種類 ビニル床シート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 7-2

地下1階

廊下 床

種類 ビニル床シート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 7-2

地下1階

廊下 床

種類 ビニル床シート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後


採取場所 7-2

地下1階

廊下 床

種類 ビニル床シート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 7-2

地下1階

廊下 床

種類 ビニル床シート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 7-3

地下1階

廊下 床

種類 ビニル床シート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 7-3

地下1階

廊下 床

種類 ビニル床シート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後


採取場所 7-3

地下1階

廊下 床

種類 ビニル床シート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 7-3

地下1階

廊下 床

種類 ビニル床シート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

全採取試料

採取場所 7

地下1階

廊下 床

種類 ビニル床シート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 8-1


地下1階

食品庫 天井

種類 無石棉

ケイ酸カルシウム板t6

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況

採取場所 8-1


地下1階

食品庫 天井

種類 無石棉

ケイ酸カルシウム板t6

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取状況

採取場所 8-1


地下1階

食品庫 天井

種類 無石棉

ケイ酸カルシウム板t6

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 8-1


地下1階

食品庫 天井

種類 無石棉

ケイ酸カルシウム板t6

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 8-1

地下1階

食品庫 天井

種類 無石棉

ケイ酸カルシウム板t6

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 8-1

地下1階

食品庫 天井

種類 無石棉

ケイ酸カルシウム板t6

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 8-2


地下1階

食品庫 天井

種類 無石棉

ケイ酸カルシウム板t6

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 8-2


地下1階

食品庫 天井

種類 無石棉

ケイ酸カルシウム板t6

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 8-2

地下1階

食品庫 天井

種類 無石棉

ケイ酸カルシウム板t6

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 8-2


地下1階

食品庫 天井

種類 無石棉

ケイ酸カルシウム板t6

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 8-3


地下1階

食品庫 天井

種類 無石棉

ケイ酸カルシウム板t6

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 8-3


地下1階

食品庫 天井

種類 無石棉

ケイ酸カルシウム板t6

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 8-3

地下1階

食品庫 天井

種類 無石棉

ケイ酸カルシウム板t6

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 8-3

地下1階

食品庫 天井

種類 無石棉

ケイ酸カルシウム板t6

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

全採取試料

採取場所 8

地下1階

食品庫 天井

種類 無石棉

ケイ酸カルシウム板t6

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 9-1

地下1階

浴室(女) 天井

種類 バスリブ

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況

採取場所 9-1

地下1階

浴室(女) 天井

種類 バスリブ

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取状況


採取場所 9-1

地下1階

浴室(女) 天井

種類 バスリブ

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 9-1

地下1階

浴室(女) 天井

種類 バスリブ

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 9-1

地下1階

浴室(女) 天井

種類 バスリブ

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 9-1

地下1階

浴室(女) 天井

種類 バスリブ

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 9-2

地下1階

浴室(女) 天井

種類 バスリブ

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 9-2

地下1階

浴室(女) 天井

種類 バスリブ

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 9-2

地下1階

浴室(女) 天井

種類 バスリブ

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 9-2

地下1階

浴室(女) 天井

種類 バスリブ

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前


採取場所 9-3

地下1階

浴室(女) 天井

種類 バスリブ

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 9-3

地下1階

浴室(女) 天井

種類 バスリブ

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後


採取場所 9-3

地下1階

浴室(女) 天井

種類 バスリブ

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 9-3

地下1階

浴室(女) 天井

種類 バスリブ

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

全採取試料


採取場所 9

地下1階

浴室(女) 天井

種類 バスリブ

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 10-1

地下1階

会議室 天井

種類 岩綿吸音板t9

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況

採取場所 10-1

地下1階

会議室 天井

種類 岩綿吸音板t9

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取状況


採取場所 10-1

地下1階

会議室 天井

種類 岩綿吸音板t9

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 10-1

地下1階

会議室 天井

種類 岩綿吸音板t9

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料


採取場所 10-1

地下1階

会議室 天井

種類 岩綿吸音板t9

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 10-2

地下1階

会議室 天井

種類 岩綿吸音板t9

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後


採取場所 10-2

地下1階

会議室 天井

種類 岩綿吸音板t9

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料


採取場所 10-2

地下1階

会議室 天井

種類 岩綿吸音板t9

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 10-3

地下1階

会議室 天井

種類 岩綿吸音板t9

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後


採取場所 10-3

地下1階

会議室 天井

種類 岩綿吸音板t9

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 10-3

地下1階

会議室 天井

種類 岩綿吸音板t9

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

全採取試料


採取場所 10

地下1階

会議室 天井

種類 岩綿吸音板t9

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 11-1


1階

エントランスホール 壁

種類 木練付無

石綿ケイ酸カルシウム板t4

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況

採取場所 11-1


1階

エントランスホール 壁

種類 木練付無

石綿ケイ酸カルシウム板t4

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取状況

採取場所 11-1

1階

エントランスホール 壁

種類 木練付無

石綿ケイ酸カルシウム板t4

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 11-1


1階

エントランスホール 壁

種類 木練付無

石綿ケイ酸カルシウム板t4

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 11-1

1階

エントランスホール 壁

種類 木練付無

石綿ケイ酸カルシウム板t4

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 11-1

1階

エントランスホール 壁

種類 木練付無

石綿ケイ酸カルシウム板t4

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 11-2


1階

エントランスホール 壁

種類 木練付無

石綿ケイ酸カルシウム板t4

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 11-2


1階

エントランスホール 壁

種類 木練付無

石綿ケイ酸カルシウム板t4

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 11-2


1階

エントランスホール 壁

種類 木練付無

石綿ケイ酸カルシウム板t4

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 11-2


1階

エントランスホール 壁

種類 木練付無

石綿ケイ酸カルシウム板t4

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 11-3


1階

エントランスホール 壁

種類 木練付無

石綿ケイ酸カルシウム板t4

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 11-3


1階

エントランスホール 壁

種類 木練付無

石綿ケイ酸カルシウム板t4

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 11-3

1階

エントランスホール 壁

種類 木練付無

石綿ケイ酸カルシウム板t4

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 11-3

1階

エントランスホール 壁

種類 木練付無

石綿ケイ酸カルシウム板t4

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

全採取試料

採取場所 11


1階

エントランスホール 壁

種類 木練付無

石綿ケイ酸カルシウム板t4

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 12-1

1階

痴呆性デイホーム 床

種類 長尺リノリウム

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況

採取場所 12-1

1階

痴呆性デイホーム 床

種類 長尺リノリウム

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取状況


採取場所 12-1

1階

痴呆性デイホーム 床

種類 長尺リノリウム

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 12-1

1階

痴呆性デイホーム 床

種類 長尺リノリウム

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 12-1

1階

痴呆性デイホーム 床

種類 長尺リノリウム

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 12-1

1階

痴呆性デイホーム 床

種類 長尺リノリウム

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 12-2

1階

痴呆性デイホーム 床

種類 長尺リノリウム

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 12-2

1階

痴呆性デイホーム 床

種類 長尺リノリウム

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 12-2

1階

痴呆性デイホーム 床

種類 長尺リノリウム

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料


採取場所 12-2

1階

痴呆性デイホーム 床

種類 長尺リノリウム

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前


採取場所 12-3

1階

痴呆性デイホーム 床

種類 長尺リノリウム

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後


採取場所 12-3

1階

痴呆性デイホーム 床

種類 長尺リノリウム

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 12-3

1階

痴呆性デイホーム 床

種類 長尺リノリウム

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 12-3

1階

痴呆性デイホーム 床

種類 長尺リノリウム

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

全採取試料


採取場所 12

1階

痴呆性デイホーム 床

種類 長尺リノリウム

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況


採取前

採取場所 13-1

階段室(西側) 壁

種類 多彩吹き付け

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況

採取場所 13-1

階段室(西側) 壁

種類 多彩吹き付け

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況


採取状況

採取場所 13-1

階段室(西側) 壁

種類 多彩吹き付け

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況


採取後

採取場所 13-1

階段室(西側) 壁

種類 多彩吹き付け

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 13-1

階段室(西側) 壁

種類 多彩吹き付け

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況


採取試料

採取場所 13-1

階段室(西側) 壁

種類 多彩吹き付け

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 13-2

階段室(西側) 壁

種類 多彩吹き付け

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況


採取後

採取場所 13-2

階段室(西側) 壁

種類 多彩吹き付け

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 13-2

階段室(西側) 壁

種類 多彩吹き付け

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況


採取試料

採取場所 13-2

階段室(西側) 壁

種類 多彩吹き付け

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況


採取前

採取場所 13-3

階段室(西側) 壁

種類 多彩吹き付け

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況


採取後

採取場所 13-3

階段室(西側) 壁

種類 多彩吹き付け

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況


補修後

採取場所 13-3

階段室(西側) 壁

種類 多彩吹き付け

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 13-3

階段室(西側) 壁

種類 多彩吹き付け

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況


全採取試料

採取場所 13

階段室(西側) 壁

種類 多彩吹き付け

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 14

地下1階

機械室 配管

種類 保温材

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況

採取場所 14

地下1階

機械室 配管

種類 保温材

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取状況


採取場所 14

地下1階

機械室 配管

種類 保温材

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 14

地下1階

機械室 配管

種類 保温材

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 14

地下1階

機械室 配管

種類 保温材

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 14

地下1階

機械室 配管

種類 保温材

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

全採取試料

採取場所 14

地下1階

機械室 配管

種類 保温材

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 15

地下1階

機械室 ダクト

種類 フランジパッキン

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況

採取場所 15

地下1階

機械室 ダクト

種類 フランジパッキン

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取状況

採取場所 15

地下1階

機械室 ダクト

種類 フランジパッキン

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後


採取場所 15

地下1階

機械室 ダクト

種類 フランジパッキン

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 15

地下1階

機械室 ダクト

種類 フランジパッキン

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 15

地下1階

機械室 ダクト

種類 フランジパッキン

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

全採取試料

採取場所 15

地下1階

機械室 ダクト

種類 フランジパッキン

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 16

地下1階

機械室 配管

種類 配管パッキン

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況

採取場所 16

地下1階

機械室 配管

種類 配管パッキン

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取状況

採取場所 16

地下1階

機械室 配管

種類 配管パッキン

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 16

地下1階

機械室 配管

種類 配管パッキン

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 16

地下1階

機械室 配管

種類 配管パッキン

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 16

地下1階

機械室 配管

種類 配管パッキン

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

全採取試料


採取場所 16

地下1階

機械室 配管

種類 配管パッキン

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 17-1

地下1階

洗面所 床

種類 クッションシート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況

採取場所 17-1

地下1階

洗面所 床

種類 クッションシート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取状況

採取場所 17-1

地下1階

洗面所 床

種類 クッションシート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 17-1

地下1階

洗面所 床

種類 クッションシート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 17-1

地下1階

洗面所 床

種類 クッションシート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 17-1

地下1階

洗面所 床

種類 クッションシート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 17-2

地下1階

洗面所 床

種類 クッションシート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 17-2

地下1階

洗面所 床

種類 クッションシート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 17-2

地下1階

洗面所 床

種類 クッションシート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 17-2

地下1階

洗面所 床

種類 クッションシート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 17-3

地下1階

洗面所 床

種類 クッションシート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 17-3

地下1階

洗面所 床

種類 クッションシート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 17-3

地下1階

洗面所 床

種類 クッションシート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 17-3

地下1階

洗面所 床

種類 クッションシート

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

全採取試料


採取場所 17

地下1階

洗面所 床

種類 クッションシート

採取日 2022年9月27日

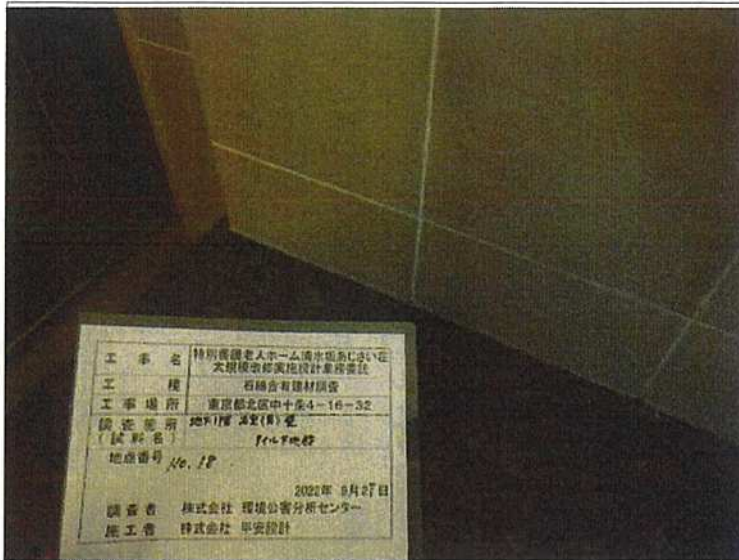

アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 18

地下1階

浴室(男) 壁

種類 タイル下地材

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況

採取場所 18

地下1階

浴室(男) 壁

種類 タイル下地材

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取状況


採取場所 18

地下1階

浴室(男) 壁

種類 タイル下地材

採取日 2022年9月27日

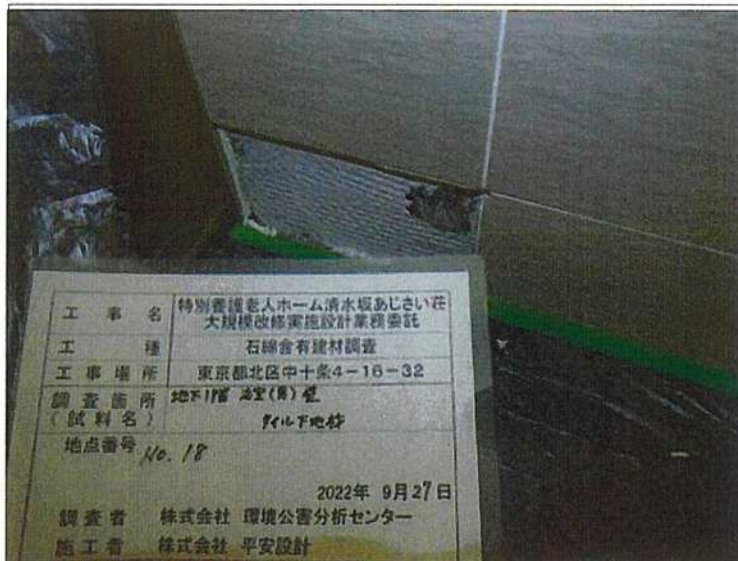

アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 18

地下1階

浴室(男) 壁

種類 タイル下地材

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 18

地下1階

浴室(男) 壁

種類 タイル下地材

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 18

地下1階

浴室(男) 壁

種類 タイル下地材

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

全採取試料

採取場所 18

地下1階

浴室(男) 壁

種類 タイル下地材

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 19-1

地下1階

会議室 天井

種類 石膏ボード

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

湿潤状況


採取場所 19-1

地下1階

会議室 天井

種類 石膏ボード

採取日 2022年9月27日

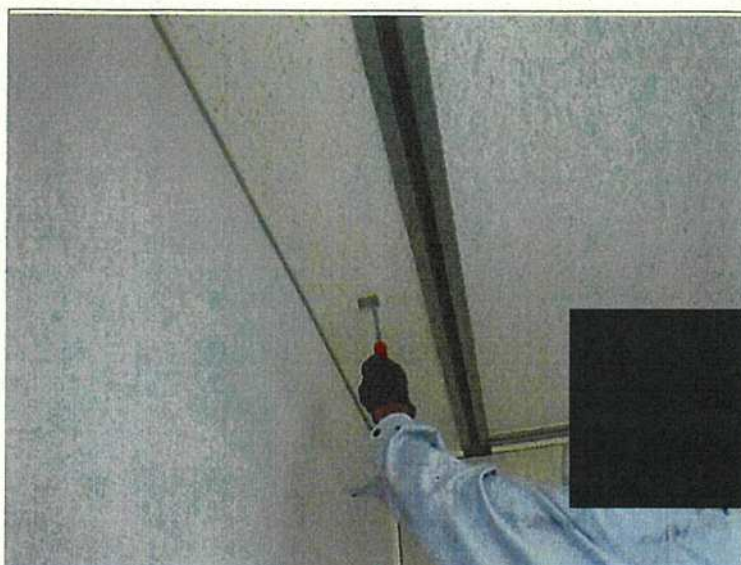

アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取状況


採取場所 19-1

地下1階

会議室 天井

種類 石こうボード

採取日 2022年9月27日

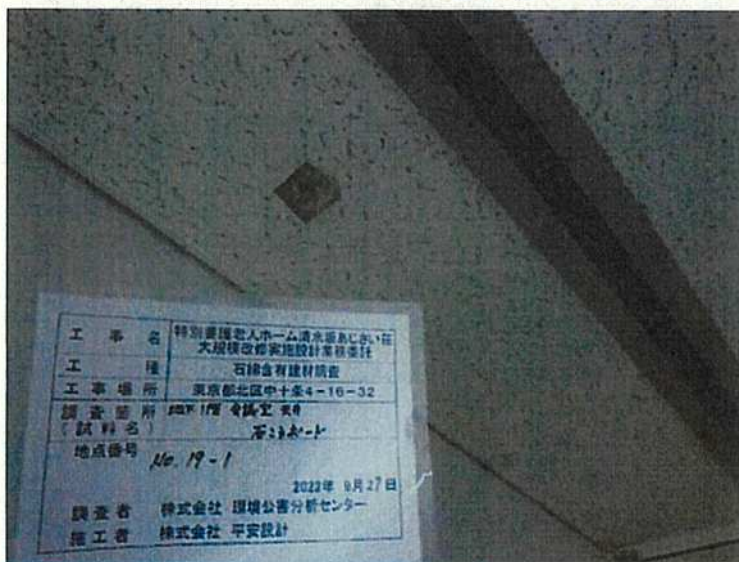

アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後


採取場所 19-1

地下1階

会議室 天井

種類 石こうボード

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 19-1

地下1階

会議室 天井

種類 石こうボード

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料


採取場所 19-1

地下1階

会議室 天井

種類 石こうボード

採取日 2022年9月27日

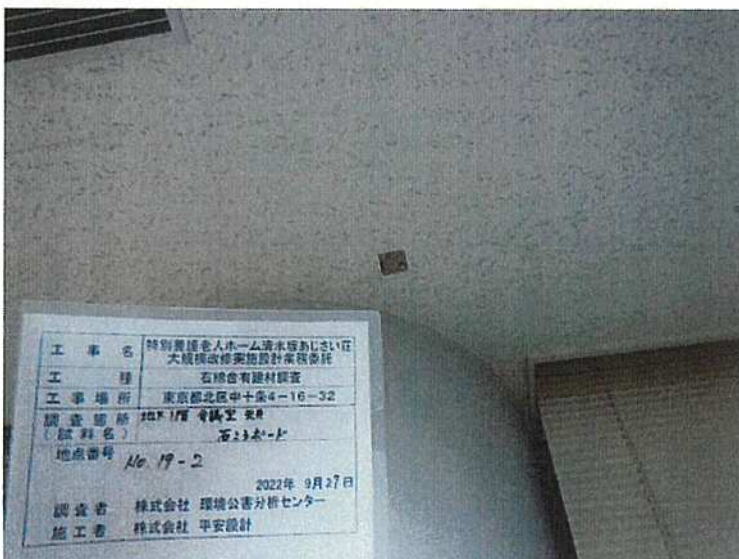

アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前

採取場所 19-2

地下1階

会議室 天井

種類 石こうボード

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後


採取場所 19-2

地下1階

会議室 天井

種類 石こうボード

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 19-2

地下1階

会議室 天井

種類 石こうボード

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 19-2

地下1階

会議室 天井

種類 石こうボード

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取前


採取場所 19-3

地下1階

会議室 天井

種類 石こうボード

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取後

採取場所 19-3

地下1階

会議室 天井

種類 石こうボード

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

補修後

採取場所 19-3

地下1階

会議室 天井

種類 石こうボード

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

採取試料

採取場所 19-3

地下1階

会議室 天井

種類 石こうボード

採取日 2022年9月27日



アスベスト含有調査

サンプリング状況

全採取試料

採取場所 19

地下1階

会議室 天井

種類 石こうボード

採取日 2022年9月27日
